



Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

Prvo izvješće o realizaciji programa u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

srpanj 2022.

Sadržaj

Sadržaj	1
1 UVOD	3
1.1 Pravna osnova	3
1.2 Pregled obveza izvješćivanja	4
1.3 Pregled objavljenih Izvješća o provedbi Programa 2021.	4
2 IZVJEŠĆE O PROVEDBI.....	4
2.1 Pregled realizacije projekata u provedbi.....	7
2.1.1 Pregled projekata vodoopskrbe	7
2.1.2 Pregled projekata odvodnje	31
2.1.3 Projekti potpore razvoju vodnocomunalnih usluga	83
2.2 Pregled stanja indikatora provedbe Programa 2021. (pokazatelji ishoda)	83
2.2.1 Ciljevi vezani uz reformu vodnocomunalnog sektora	84
2.2.2 Ciljevi postizanja standarda obavljanja usluge javne vodoopskrbe, odnosno opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju	84
2.2.3 Ciljevi postizanja standarda javne odvodnje	89
3 ZAKLJUČCI I PREPORUKE.....	95
4 PRILOZI.....	97
4.1 Popis Projekata prema Planu 2021.	98
4.1.1 Javna vodoopskrba	98
4.1.2 Javna odvodnja	106
4.1.3 Ostali projekti i projekti koji se provode na nacionalnoj razini	111
4.2 Indikator: Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji po Projektima	112
4.3 Indikator: Smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode prema Projektima	117
4.4 Indikator: Smanjenje gubitaka iz sustava javne vodoopskrbe prema Projektima	122
4.5 Indikator: Priključenost opterećenja na sustav javne odvodnje prema javnim isporučiteljima	127
4.6 Indikator: Usklađenost s obzirom na potrebnu razinu pročišćavanja prema javnim isporučiteljima	132

1 UVOD

1.1 Pravna osnova

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (dalje u tekstu: Program 2021.) je akt strateškog planiranja povezan s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Njegovo donošenje propisano je člankom 43. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19 i 84/21), a odlukom Vlade Republike Hrvatske od listopada 2020. godine stavljen je na popis akata strateškog planiranja.

Program 2021. izradile su Hrvatske vode, a donijela ga je Vlada Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/21) nakon provedene strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17), uključujući i postupak glavne ocjene prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Ovim se dokumentom utvrđuje okvirni program ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na koja se Republika Hrvatska obvezala Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 2/12). Također se operacionalizira sustav za provedbu na način koji će doprinijeti učinkovitijem korištenju financijskih, kadrovskih i tehničkih resursa kojima raspolaže vodno gospodarstvo u području korištenja i zaštite voda, kao i sektor vodnih usluga. Programom 2021. se utvrđuju pojedinačni projekti (način i razdoblje provedbe, sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori sredstava, red prvenstva u provedbi), te definira okvir za praćenje njegove provedbe.

Zakonom o vodama određeno je da višegodišnji programi gradnje moraju biti sukladni drugim planskim dokumentima upravljanja vodama (Strategija upravljanja vodama, Plan upravljanja vodnim područjima). Time se osigurava usklađenost Programa 2021. sa strateškim opredjeljenjima i politikom upravljanja vodama, te preuzetim standardima Europske unije na području politike voda, osobito onima iz Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama) (SL L 327, 22.12.2000.), koja je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2014/101/EU od 30. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Tekst značajan za EGP) (SL L 311, 31. 10. 2014.) (dalje u tekstu: Okvirna direktiva o vodama), te iz vodnokomunalnih direktiva i to:

- Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991.), dopunjena Direktivom Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. s obzirom na određene zahtjeve utvrđene u Dodatku I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 67, 7. 3. 1998.) (dalje u tekstu: Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda),
- Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998.) koja je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2015/1787 od 6. listopada 2015. izmjeni priloga II. i III. Direktivi Vijeća 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 260, 7.10.2015.), odnosno njenom preinakom Direktiva (EU) 2020/2184 od 16. prosinca 2020. (dalje u tekstu: Direktiva o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju).

Značajan utjecaj na provedbu vodnokomunalnih direktiva ima Okvirna direktiva o vodama koja zahtijeva vođenje politike cijena vode prema načelu povrata troškova od vodnih usluga, što je osnova za provođenje politike odgovorne i učinkovite upotrebe vode prema načelu racionalnog korištenja uključujući i osiguranje sredstava za razvoj, redovito održavanje i obnavljanje vodnokomunalne infrastrukture. Načelo povrata troškova od vodnih usluga transponirano je u Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19).

Izvrješćivanje o provedbi Programa 2021. se obavlja u polugodišnjim ciklusima čime se ujedno i odgovara sljedećem zahtjevu Europske komisije iz svibnja 2022. godine:

„Semiannual reports on implementation of the multiannual construction programme, focusing on investments under R1-I1 and R1-I2, as of Q1 2022 onwards. Reports will include a schedule of environmental impact assessments for individual investments, including screening in line with the Habitats Directive and analysis regarding the Natura 2000 sites.“

1.2 Pregled obveza izvrješćivanja

Obveze izvrješćivanja, pripadajući izvještajni obrasci i propisani indikatori proizlaze iz više različitih dokumenata kako slijedi.

Obveza		Učestalost - rokovi
Izvrješća prema zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda	Europska komisija - Sustav WISE	2 godine
Izvrješća prema zahtjevima Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju	Europska komisija - Sustav WISE	3. godine
Izvrješće o Planu upravljanja vodnim područjima	Europska komisija - Sustav WISE	6 godina
Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking - Water (GLAAS)	UN - SDG 6 o vodi, sanitaciji i higijeni (WASH)	2 godine
Protokol o vodi i zdravlju	UN	3 godine
Izvrješćivanje o provedbi Programa 2021. (Izvrješće)		polugodišnje
Izvrješćivanje o provedbi Nacionalnog programa oporavka i otpornosti		polugodišnje
Izvrješćivanje prema obvezama Nacionalne razvojne strategije		godišnje
Izvrješćivanje za potrebe Državnog zavoda za statistiku	Državni zavod za statistiku	godišnje


1.3 Pregled objavljenih Izvrješća o provedbi Programa 2021.

Naziv	Izvrješćajno razdoblje	Datum objave
Prvo Izvrješće o provedbi Programa 2021. (dalje u tekstu 1. Izvrješće)	1. siječanj 2022. - 30. lipanj 2022. godine	srpanj 2022. godine

2 IZVJEŠĆE O PROVEDBI

Pregled statusa, odnosno realizacije projekata, bilo da je riječ o javnoj vodoopskrbi, javnoj odvodnji (aglomeracije) ili ostalim, odnosno posebnim projektima koji se provode na nacionalnoj razini, određenih Programom 2021., se registrira na način da se prati realizacija pojedinačnih komponenti projekata. Naime ovisno o složenosti pojedinog projekta, te o financijskom paketu kome komponenta projekta pripada, broj komponenti, odnosno broj pripadajućih potkomponenti projekta značajno varira. U određenim slučajevima (Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026.) uobičajeno je riječ o komponenti (bez potkomponenti), dok se u okviru Operativnih programa „Zaštita okoliša“ i „Konkurentnost i kohezija“ komponenta projekta prati kroz realizaciju niza potkomponenti, kroz veći

broj tzv. sekundarnih ugovora (uz samo ulaganje u razvoj infrastrukture, nabavu opreme, primjerice realizira se i obavljanje usluge vidljivosti projekta i slično). Izvješća o realizaciji Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine pratiti će status realizacije komponenti projekta i pripadajućih potkomponenti na način na koji se to prati u okviru financijskog paketa kroz koji se financira određena komponenta projekta.

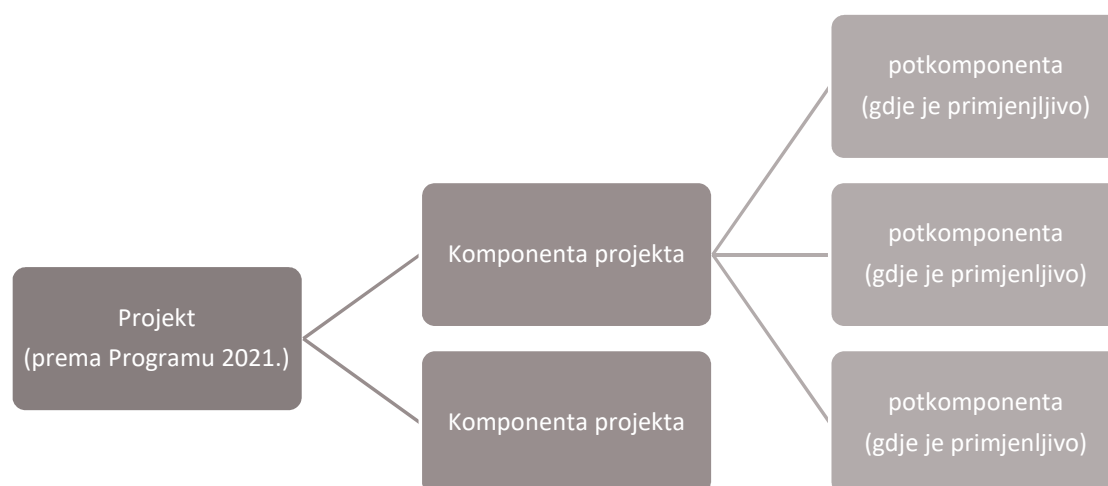

Slika 1 Shematski prikaz praćenja stanja realizacije projekata Programa 2021.

Popis projekata prema Programu 2021. je naveden u poglavlju 4.1. Pri tome treba naglasiti da Program 2021. sadrži projekte na različitom stupnju razrade¹, od projektnog prijedloga (tek treba razviti idejni koncept) preko projektnog prijedloga s pripremljenom tehničkom dokumentacijom i dozvolama, pa do projekata koji se već financiraju. U takvim slučajevima može se očekivati da će se detaljnijom razradom tehničke dokumentacije mijenjati obuhvat, pa čak i broj projekata. Takve promjene, razrađene u prihvaćenim tehničkim dokumentima posebno će biti naglašene, kako bi se osigurao konzistentnost i kontinuitet u praćenju indikatora uspješnosti Programa 2021.

Financijski paket	Skraćenica	Razdoblje financijskog paketa
Razvojni programi javnih isporučitelja	RPJI	-
Redoviti program Hrvaskih voda	RPHV	-
Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007. - 2013.	OPZO 2007-2013	2007. - 2016.
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020.	OPKK 2014-2020	2014. - 2023.
Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026.	NPOO	2021. - 2026.
Fond solidarnosti Europske unije	FSEU	do svibnja 2023.
Višegodišnji financijski okvir 2021. - 2027.	VFO 2021-2027	2022. - 2029.
Švicarska darovnica	SD	do kraja 2023
Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. dodatno proširen na 2021. i 2022. godinu	RR	do kraja 2025.
Predpristupni fondovi	ISPA	završeno

¹ Razine zrelosti projektnog prijedloga prema Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske Narodne novine br. 106/17

Pregled projekata, komponenti i potkomponenti se prati prema sljedećim fazama:

Faza provedbe projekta, Komponente projekta ili potkomponente projekta	Opis
U pripremi	U postupku pripreme tehničke dokumentacije i/ili u postupku ishođenja dozvola
Početak provedbe	Potpisom sporazuma ili drugog dokumenta projektu je utvrđen mehanizam financiranja (dodijeljen je jednom od naprijed identificiranih programa (mehanizama financiranja))
U nabavi	U nabavi
U izvođenju	U izvođenju
Završetak izgradnje	Obavljen tehnički pregled, u probnom radu
Završeno	U potpunosti završen projekt / komponenta / potkomponenta - ishođena uporabna dozvola

2.1 Pregled realizacije projekata u provedbi

2.1.1 Pregled projekata vodoopskrbe

Preled realizacije projekata vodoopskrbe obuhvaća informacije o realizaciji projekata / komponenti / potkomponenti u okviru sljedećih financijskih paketa

Financijski paket	Skraćenica	Razdoblje Financijskog paketa	Napomena
Razvojni programi javnih isporučitelja	RPJI	-	podaci nisu dostupni, nema obveze izvješćivanja (očekuje se u okviru 2. izvješća - godišnje izvješće)
Redoviti program Hrvatskih voda	RPHV	-	prikupljeni podaci o projektima čija je provedba započela u 2022. godini
Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007. - 2013.	OPZO 2007-2013	2007. - 2016.	korišteni podaci
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020.	OPKK 2014-2020	2014. - 2023.	korišteni podaci
Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026.	NPOO	2021. - 2026.	korišteni podaci
Fond solidarnosti Europske unije	FSEU	do svibnja 2023.	korišteni podaci
Višegodišnji financijski okvir 2021. - 2027.	VFO 2021-2027	2022. - 2029.	nema podataka (projekti u pripremi se mogu smatrati potencijalnim kandidatima za financiranje)
Švicarska darovnica	SD	do kraja 2023	korišteni podaci
Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. dodatno proširen na 2021. i 2022. godinu	RR	do kraja 2025.	korišteni podaci, nema obveze izvješćivanja

Trenutačno je na području Republike Hrvatske u različitim fazama realizacije 226 aktivnosti (potkomponenti) 96 projekata iz Programa 2021. Kako podaci o financijskoj realizaciji projekata u prvih 6 mjeseci 2022. godine još uvijek nisu dostupni, u tablici su naznačeni samo podaci o ukupnim vrijednostima projekata, odnosno njihovih komponenti / potkomponenti. Očekuje se da će sveobuhvatne podatke o stanju realizacije projekta prema financijskim pokazateljima biti moguće dati u 2. izvješću (godišnje izvješće na kraju 2022. godine). Pri tome, treba napomenuti da se u određenom dijelu projekata odvodnje kroz Operativne programe „Zaštita okoliša“ i „Konkurentnost i kohezija“ realiziraju i podkomponente vodoopskrbe (vrijednost projekta/komponente/podkomponente nije upisana i vodi se kroz projekte aglomeracija).

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Gornja Dubrava - Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Kamešćica	722.081	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodospremnika Sveta Barbara	3.513.838	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sesvete - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odvojuku ulice Vinka Kinderer i ulici Put Loza u Sesvetama	397.847	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za VS Šimunčevac i izgradnja vodospremnika Šimunčevac	4.615.240	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb- rekonstrukcija zasunske komore br. 4296 na Slavenskoj aveniji kod precrpne stanice Pile	2.121.940	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Brezovica - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Horvati	860.671	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Gornja Dubrava - izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 4	1.698.694	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Gornja Dubrava - izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 5	1.730.207	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Novi Zagreb - zapad - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Keseri kod k.br. 4a-30b, 4d-4r/2, 4s/1-4z/1 i 4s/2-4z/3	926.908	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Peščenica - Žitnjak - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulicama Kozari bok I., II., III. odvojak	1.358.622	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Podsljeme - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu odvojka Ulice Štefanovec i dijelu Ulice Vincekov breg	429.074	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sesvete - izgradnja HS Adamovec	1.186.587	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Hrastova	162.098	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u širokoj ulici	165.854	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja (produženja) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Podsused-Vrapče	2.880.168	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja (produženja) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Novi Zagreb Zapad	2.830.834	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Čučerskoj cesti od ulice Oporovečki Omajek do Jalševečke ceste	2.866.558	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Gornji Dragonožec	2.167.797	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Donji Trpuci	1.219.062	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Kanalskoj ulici	1.125.621	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Albrechtovoj ulici (od Hondlove do III. Maksimirkog naselja)	646.453	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Burićevom odvojkju	1.149.033	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Rackoj ulici od k.br. 32 do Vojkovičke ulice i kod k.br. 75 - 95	600.637	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Samobor - izgradnja vodoopskrbnog sustava Noršić selo - Jarušje	7.611.553	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 6	1.814.148	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sveta Nedelja – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Stublov zdenac u naselju Mala Gorica	930.759	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Fra. Filipa Grabovca	810.294	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Banovičkoj ulici	675.305	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Samobor - izgradnja sanitarnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Stojdraga do k.č.br. 226/1 k.o. Poklek	1.179.568	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Korenovoj ulici	506.725	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Šestinjak za k.č.br. 1545 k.o. Mikulići	493.447	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Polanjščak do k.br. 17	385.462	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Samobor - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici	417.202	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Istočnoj ulici	408.683	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Dražice	280.823	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	ZAGREB - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Novačkoj ulici do k.č. 2034/1 k.o. Dubrava	294.117	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sveta Nedelja - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Topolje	244.108	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Veliki Potok za k.br. 32	207.292	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Samobor - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda DN50 mm u ulici E. Kumičića	250.274	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Starjak	219.005	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sveta Nedelja - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Dugi put u naselju Bestovje	220.203	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Općina Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odvojcima ulice Japejci	159.410	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Markulinska draga II. odvojak do kbr 2	122.361	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	U okviru projekta RVS Zagreb - istok		17.05.2018.	N/P	ima	ima	ima	u izvođenju
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodosprema Rudine II s pripadajućim cjevovodom	6.400.735	03.02.2022.	09.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodoopskrbni cjevovod do ŽCGO, dionica Taraši -Barani	5.890.708	03.02.2022.	09.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodoopskrbna mreža u zagorskom dijelu općine Seget	15.366.867	03.02.2022.	09.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodoopskrbni cjevovodi i kanalizacijski kolektori u Dugopolju (dio koji se odnosi na vodoopskrbu procijenjen na 50%)	3.047.006	03.02.2022.	09.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodoopskrbni i kanalizacijski sustav naselja Ropotina i Put stare Salone u Solinu (dio koji se odnosi na vodoopskrbu procijenjen na 50%)	4.407.181	03.02.2022.	09.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Dio kanalizacijskog sustava na području Čiova (dio koji se odnosi na vodoopskrbu procijenjen na 50%)	3.663.836	03.02.2022.	09.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	RPHV	Izgradnja sekundarne mreže naselja Prgomet na području općine Prgomet	4.380.268	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Kaštela - Trogir		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Split - Solin		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija postrojenja za dezinfekciju vode u pogonu za proizvodnju vode	5.643.075	23.03.2022.	03.02.2022.	17.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u produžetku Kanižličeve ulice - voda	932.767	23.03.2022.	03.02.2022.	17.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže u Tvrdi	7.251.108	23.03.2022.	03.02.2022.	17.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija NUS-a pogona za proizvodnju vode	506.310	23.03.2022.	03.02.2022.	17.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	OPKK 2014-2020	RVS Osijek 2. faza projekta	76.647.987	25.07.2017.	N/P	ima	u tijeku	u tijeku	u provedbi
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	OPZO 2007-2013	RVS Osijek 1. faza projekta	12.351.012	6.10.2015	N/P	ima	N/P	N/P	završeno
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Osijek faza 2		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
9		1	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	1	RPHV	opskrba vodom visoke zone naselja Krapinske Toplice - cjevovodi i hidrostanica	2.093.824	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
9		1	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	1	RPHV	izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općine Gornja Stubica - naselja Brezje i Volavec	2.797.294	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
9		1	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	1	RPHV	uređenje izvorišta Oštri Hum u Mariji Bistrici	1.229.000	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
13		5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	RVS Zagrebačke županije Zagreb - istok (mreža Dugo Selo, mreža Ivanić grad, mreža sveti Ivan Zelina, mreža Vrbovec, vodocrpilište Kosnica, nadzor, upravljanje projektom, vidljivost	707.108.262	17.05.2018.	N/P	ima	ima	ima	u izvođenju
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Kruševo	8.509.289	23.12.2021.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Nin - Privlaka - Vrsi		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Zadar		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	u pripremi	Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar	1.752.349.350	sekundarni uovori za pripremu dokumentacije	u pripremi	u pripremi	u pripremi	u pripremi	u pripremi
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Izgradnja cjevovoda Dionica 1 Trnjani - Šušnjevci	1.543.610	23.12.2021.	04.11.2021.	20.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
21		49	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	1	NPOO	REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA GRADA VINKOVACA	24.395.085	23.03.2022.	N/P	24.08.2016.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
19		37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	1	NPOO	Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Godinjak - Tisovac i opskrbnih cjevovoda naselja Tisovac	2.271.364	03.02.2022.	02.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
19		37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Nova Gradiška faza 2		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
2		143	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	1	RPHV	izgradnja vodoopskrbne mreže dijela naselja Krč - zaselak Ključice	2.270.609	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
2		143	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	1	RPHV	izgradnja transportnog vodoopskrbnog cjevovoda Novakovec - Poljanec	8.031.481	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
2		143	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	1	RPHV	završetak vodoopskrbnog cjevovoda u gospodarskoj zoni Novi Marof	344.780	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
2		143	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	1	RPHV	izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Donjoj Poljani	992.380	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
4		39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU ĐARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	1	-								-
6		12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Đakovo		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
6		12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Semeljci		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
6		80	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	1	NPOO	Izgradnja spojnog vodovoda Donja Motičina – Gornja Motičina	3.183.365	03.02.2022.	06.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
6		80	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Našice		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
14		11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	1	-								-
14		22	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	1	-								-
31		141	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	1	-								-
37		122	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	1	RPHV	Dovršetak izgradnje mreže Grabovac - Centar	528.187	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
37		122	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	1	RPHV	Dovršetak izgradnje mreže Grabovac-Goričaj	565.845	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
37		122	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Imotski		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
40		118	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Dubrovnik		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
4		45	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	1	-								-

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Baranjsko Petrovo Selo	3.647.709	03.02.2022.	16.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		89	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomercije Valpovo - Belišće		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
		3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	1	NPOO	Opskrba vodom posdučja Lukovčak – visoka zona zaselka Grki	538.944	23.03.2022.	05.11.2021.	03.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	1	RPHV	izgradnja vodoopskrbnog sustava dijela naselja Šabac u Krapini	3.698.763	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
		25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	1	FSEU	Sanacije šteta neposredno poslije potresa u postrojenju za kondicioniranje vode Novo Selište, vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje područja pod ingerencijom Sisačkog vodovoda (Sisak I)	14.943.259	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
		25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	1	FSEU	Sanacije šteta i vraćanje u tehnički ispravno stanje postrojenja za kondicioniranje vode Novo Selište i vodoopskrbnog sustava pod ingerencijom Sisačkog vodovoda nakon potresa (Sisak II)	56.122.842	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
		28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKIJIA d.o.o. Požega	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomercije Požega		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
		88	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	1	NPOO	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Borovu naselju u Vukovaru	2.340.303	23.03.2022.	06.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		88	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomercije Vukovar faza 2		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
		59	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomercije Krk		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
		91	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	1	RPHV	Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže - prespajanje korisnika na novoizgrađenu vodovodnu mrežu	6.654.515	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
		94	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković	1	NPOO	Izgradnja vodospreme Vid s dovodnim i odvodnim cjevovodom	4.873.803	16.12.2021.	12.10.2021.	23.02.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		94	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomercije Metković		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
		6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSRBA d.o.o. Velika Gorica	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Dubranec	3.707.458	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
12		6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomercije Velika Gorica		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
13		149	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	1	-								-
21		38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomercije Županja faza 2		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbe za naselja Vukšić i Prović	21.967.017	23.12.2021.	19.10.2021.	06.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda za Islam Grčki-glavna trasa	10.391.219	23.12.2021.	19.10.2021.	06.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
36		126	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Pučišća prema rotoru	935.002	03.02.2022.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
36		126	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbe u uvali Makarac	2.769.867	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
39		100	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato	1	-								-
4		40	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	1	NPOO	Gradilište - Vodovod Gornja Šušnjara i Donja Šušnjara	4.861.903	23.03.2022.	N/P	06.09.2018.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
8		82	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	1	-								-
14		9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Furjan-Bogovolja-Kruškovača-Komesarac, 1.faza: Furjan-Bogovolja	5.865.719	03.02.2022.	25.08.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
14		9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Božić Brdo – Dobrenica	2.730.336	03.02.2022.	25.08.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
22		90	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	1	-								-
34		108	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Kamensko, zaseoci Krolo, Tabak, Matiči i Žaperi	3.819.062	23.12.2021.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
34		108	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1	RPHV	Izvođenje radova na vodoopskrbnim objektima (ugradnja vodomjera Tomislavgrad)	4.618.350	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
34		108	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Sinj		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
34		108	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Trilj - Otok - Dicmo		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
37		102	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Kotišina	10.060.501	16.12.2021.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
38		92	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Ploče		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
14		24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj	1	-								-
25		56	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o. Čabar	1	RPHV	izgradnja zaštitne ograde oko VS Sokoli u Čabru	58.670	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
30		125	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	1	-								-
2		74	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	2	RPHV	izgradnja dobavnog cjevovoda od izvorišta Žgano vino – VS Pahinsko – do Malezove ulice u Ivancu, 2 faza	1.228.185	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
2		74	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	2	RPHV	izgradnja vodovoda od centra naselja Brezova Gora do županijske ceste ŽC 2258	561.791	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Križevci		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
4		34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Bjelovar		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
11		46	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o.	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Jastrebarsko		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
14		29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	2	NPOO	Izgradnja sanitarne kanalizacije, rekonstrukcija mješovite kanalizacije i vodoopskrbe – državna cesta D6, dionica Stative-Borlin (dio koji se odnosi na vodoopskrbu procijenjeno na 50%)	9.361.798	03.02.2022.	08.11.2021.	11.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
14		29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Karlovac		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
14		44	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	2	NPOO	Izgradnja vodovoda Ključar	2.061.892	23.03.2022.	02.11.2021.	18.03.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
14		44	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIČ d.o.o. Vojnić	2	FSEU	Sanacija puknuća na vodoopskrbnim sustavima općine Vojnić	159.720	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
20		131	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	2	-								-
23		57	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	2	NPOO	VO VS Sv. Petar-Sv. Petar u šumi Sv.Petar u šumi	3.038.084	23.12.2021.	13.10.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
23		57	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	2	NPOO	VO Rimanići - Tominčići - Medigi - Čopi - Maršani -3.dionica	2.788.047	23.12.2021.	13.10.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
23		57	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Mošćeničkoj Dragi – dionica rotor D 66 – Sv. Ivan	2.184.245	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
25		61	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	NPOO	Vodoopskrba naselja Melnice - Ilb dio građevine	15.301.724	23.12.2021.	08.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
25		61	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Rijeka		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	-								-
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	RPHV	nastavak rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda u sklopu izgradnje kanalizacijske mreže kolektora u Mrkoplju	6.380.000	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	RPHV	završetak sanacije cjevovoda Planina Skradska	1.042.587	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Delnice faza 1	43.348.300	27.03.2018.	12.01.2017.	29.05.2017.	ima	ima	završeno
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Delnice faza 2	2.210.314	27.03.2018.	12.01.2017.	29.05.2017.	ima	ima	završeno
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Delnice faza 3	14.979.753	27.03.2018.	12.01.2017.	29.05.2017.	ima	ima	završeno
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Delnice faza 4B - gravitacijski energetski kanal	6.498.000	27.03.2018.	12.01.2017.	29.05.2017.	ima	ima	u izvođenju

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Faza 4 C- sanacija objekata vodoopskrbe - dio koji se odnosi na Delnice	3.296.528	27.03.2018.	12.01.2017.	29.05.2017.	ima	ima	u izvođenju
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Fužine - faza 2	2.793.726	27.03.2018.	16.1.2017.	22.08.2017.	ima	ima	završeno
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Fužine - grupa 1 - Fužine i Vrata	11.293.504	27.03.2018.	16.1.2017.	22.08.2017.	ima	ima	u izvođenju
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Fužine - grupa 2 - Lič	13.023.768	27.03.2018.	16.1.2017.	22.08.2017.	ima	ima	u izvođenju
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Faza 4 C- sanacija objekata vodoopskrbe - dio koji se odnosi na Fužine	2.636.619	27.03.2018.	16.1.2017.	22.08.2017.	ima	ima	u izvođenju
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Brod Moravice faza 2	11.330.593	27.03.2018.	13.01.2017.	21.09.2017.	ima	ima	završeno
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Faza 4 C- sanacija objekata vodoopskrbe - dio koji se odnosi na Brod Moravice	1.950.011	27.03.2018.	13.01.2017.	21.09.2017.	ima	ima	u izvođenju
28		54	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALJE d.o.o. Novalja	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Novalja		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
28		112	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	2	NPOO	Izgradnja procrpne stanice Gorica (Vrčići)	1.467.811	03.02.2022.	20.10.2021.	12.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
29		60	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbe naselja Široka Kula	7.175.556	23.03.2022.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
29		60	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	2	RPHV	izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Zavođe	938.729	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
30		105	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali	2	-								-
30		142	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Petrinja		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
32		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	NPOO	Rekonstrukcija djela tlačnog cjevovoda CS Miljacka – VS Radučka glava	2.477.079	23.03.2022.	25.10.2021.	21.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
32		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Vodice faza 2		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
32		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Šibenik		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
32		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Betina - Murter		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
38		114	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2	NPOO	Izgradnja cjevovoda Borovci	22.891.018	23.03.2022.	11.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
39		130	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	2	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže Podgorje	12.877.340	23.03.2022.	27.09.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
39		130	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	2	NPOO	Radovi na rekonstrukciji i uvezivanju crpne stanice Dingač u postojeći sustav daljinskog nadzora i upravljanja	8.741.696	23.03.2022.	27.09.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
1		72	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	2	NPOO	Rekonstrukcija vodovodne mreže od PS "Urban" do VT "Urban"	1.318.205	23.03.2022.	08.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
1		72	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	2	NPOO	Rekonstrukcija dijela vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Donja Dubrava	2.849.739	23.03.2022.	08.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
1		72	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	2	NPOO	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ulici Matije Gupca u Murskom Središću(dionice VMS 11, VMS 11.1, VMS 11.2)	1.540.450	23.03.2022.	08.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
3		75	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Koprivnica		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
4		73	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Rakitnica i Donje Zdjelice	1.707.282	23.03.2022.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
4		73	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Đurđevac		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
15		42	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	NPOO	Rekonstrukcija dobavnog cjevovoda od izvorišta Pečki do VS Popova šuma	18.912.906	23.12.2021.	27.10.2021.	19.01.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
15		42	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Brest Pokupski i Mala Gorica	9.597.679	23.12.2021.	27.10.2021.	19.01.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
15		42	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	FSEU	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama Privrede d.o.o., Petrinja	161.405.269	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
17		41	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	2	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže Ulici Sokolovec u Kutini	519.036	23.12.2021.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
17		41	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Kutina		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
21		10	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci	2	-								-
21		13	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja	2	-								-
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Rekonstrukcija vodovodne mreže Prodol-Taškerovi dvori	5.915.036	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Tlačni cjevovod Rakonek – Prnjani	22.623.765	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Rekonstrukcija ogranka magistralnog cjevovoda Štokovci - Gilešići s redukcijским stanicama Boškari i Režanci	7.057.045	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
36		121	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	2	NPOO	Izgradnja cjevovoda Jelsa-Sučuraj, poddionica Jelsa-Poljica	22.385.414	03.02.2022.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
36		121	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Jelsa - Vrbovska - Stari Grad		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
38		109	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen	2	NPOO	Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Opuzen - dio uz kanal Mala Neretva (dio koji se odnosi na vodoopskrbu procijenjen na 50%)	11.163.839	02.03.2022.	27.10.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
39		113	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2	NPOO	Izgradnja CS Trstenik	8.236.808	23.03.2022.	11.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
39		113	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2	RPHV	Dovršetak sustava vodoopskrbe u naseljima Pomena i Polače	1.750.000	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
39		113	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2	RPHV	Izgradnja magistralnog cjevovoda središnjeg dijela poluotoka Pelješca od Žuljane do Dančanja	19.072.460	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
5		78	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina	2	NPOO	Izgradnja glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Mačkovac-Hum i distributivne vodovodna mreže naselja Hum i Hum Varoš	2.962.773	23.03.2022.	09.10.2018.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
5		78	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Slatina		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
5		79	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica	2	NPOO	Radovi/izgradnja, nadzor i promidžba i vidljivost-vodoopskrbna mreža u Orahovici (ulice A. Starčevića i Dalmatinska)	3.936.805	23.03.2022.	19.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
9		2	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	2	-								-

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
10		4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	2	NPOO	Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Dubravičkoj ulici – Faza 2 – Marija Gorica	1.965.241	03.02.2022.	20.10.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
10		4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Zaprešić		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
10		4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	2	FSEU	Rekonstrukcija vodovoda na području aglomeracije Zaprešić te sanacija zida hale UPOV Zajarki	8.705.270	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
15		47	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2	NPOO	Magistralni cjevovod Glina – Maja – Dragotina	16.031.071	23.03.2022.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
15		47	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2	FSEU	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline - Sanacija vodospreme Pogledić 1	342.150	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
15		47	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2	FSEU	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline - Sanacija vodospreme Pogledić 2	412.500	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
15		47	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2	FSEU	Tehničko rješenje sanacije odrona na padini ispod vodospreme Pogledić u Glini	716.500	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
15		47	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2	FSEU	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama – hitne mjere sanacije na području Grada Gline	1.087.282	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
18		31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Lipik - Pakrac		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
24		67	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone grada Labina, te izgradnja crpnih stanica	10.072.463	23.03.2022.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
25		58	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	2	-								-
27		70	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
28		110	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	2	NPOO	Izgradnja VS Smokvina u vodoopskrbnom sustavu općine Poveljana	6.395.717	23.12.2021.	20.10.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
29	Vreline d.o.o. Vrhovine	140	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	2	RPHV	dobava opreme za traženje gubitaka	40.800	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
29	Vreline d.o.o. Vrhovine	140	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	2	RPHV	ugradnja hirauličnog regulatora tlaka i hvatača nečistoće i izgradnja okna	33.615	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
30		111	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	2	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže i fekalnih kanala (dio vodoopskrbe procijenjen sna 50%)	22.686.108	23.03.2022.	N/p	18.05.2018.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
35		124	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnih građevina na području srednjeg toka Cetine	24.440.959	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
38		128	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	2	RPHV	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih objekata na području sustava Vrgorac (VS Butina)	4.874.913	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
4		36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	2	-								-
5		77	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Virovitica faza 2		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
6		81	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac	2	RPHV	Rekonstrukcija dijela vodoopskrbnih cjevovoda na području Đurđenovca - 4. faza izgradnje	458.896	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
8		144	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Majške Međe	806.591	23.12.2021.	13.10.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
9		136	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada	2	RPHV	rekonstrukcija izvorišta B1 u Pregradi	2.853.874	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
11		33	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac	2	-								-
15		18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	2	FSEU	Izrada idejnog i glavnog projekta magistralnog vodovoda Pašino Vrelo - vodospremnik Panjani	985.000	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
15		18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	2	FSEU	Priključenje zdenca SPBPV-1/06 na sustav javne vodoopskrbe	1.834.978	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
15		18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	2	FSEU	Sanacija zdenaca PVB 1, PVB 2, PVB 3	4.825.000	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
15		18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	2	FSEU	Sanacija od potresa dijela vodovodne i kanalizacijske infrastrukture Grada Hrvatska Kostajnica	9.695.000	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
15		50	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	2	FSEU	Vodovodna mreža u Ulici Zrinskih i Frankopana u Dvoru - Građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b skupine	4.006.681	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
17		21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Novska		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju


Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
		65	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko	2	RPHV	rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda u sklopu izgradnje kanalizacijske mreže kolektora u Vrbovskom	2.960.608	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
		62	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Cres - Lošinj		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
		51	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o. Karlobag	2	-								-
		63	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	2	RPHV	izgradnja vodovodnog cjevovoda u Ulici Damira Tomljanovića Gavrana	9.059.923	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
		63	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	2	RPHV	program za održavanje izvorišta Gusić jezero	598.500	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
		69	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab	2	-								-
		48	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	2	NPOO	Izvođenje radova na vodoopskrbnom cjevovodu u naselju Smoljanac	2.206.819	23.12.2021.	27.09.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		129	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukuljica	2	-								-
		96	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog sustav Biočić - Tepljuh	1.622.728	23.03.2022.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		127	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	2	-								-
		119	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Zamaslina, Marinica i naselja Broce	18.350.907	23.12.2021.	09.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		93	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 41 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	2	NPOO	Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Molunat (procijenjeni dio koji se odnosi na vodoopskrbu 50%)	6.631.778	23.12.2021.	19.10.2021.	25.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		16	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela	3	-								-
		76	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača	3	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Pitomača		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju
		83	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće	3	NPOO	Izvođenje radova, stručni i obračunski nadzor te promidžba nad Rekonstrukcijom i dogradnjom vodoopskrbnih cjevovoda naselja Belišće – II dio	2.844.235	23.03.2022.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		83	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće	3	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu alomeracije Valpovo - Belišće		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
8		135	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDNOST d.o.o. Čepin	3	NPOO	Vodoopskrbna mreža naselja Mala Branjevina	423.429	23.03.2022.	28.10.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
8		135	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDNOST d.o.o. Čepin	3	NPOO	Spojni cjevovod Ulica Franje Račkog i Eugena Kvaternika u Čepinu	514.516	23.03.2022.	28.10.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
10		137	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra	3	-								-
11		17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	3	-								-
12		32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina	3	-								-
14		146	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić	3	-								-
14		151	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	3	-								-
15		138	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	3	-								-
15		43	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	3	FSEU	Sanacija šteta nastalih potresom na vodoopskrbnom sustavu općina Topusko i Gvozd	492.628	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju
17		15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	3	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Jasenovac i Uštica	11.610.850	23.03.2022.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
29		27	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica	3	-								-
29		64	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VISOČICA d.o.o. Donji Lapac	3	-								-
29		66	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje	3	NPOO	Izgradnja objekata za zahvaćanje dodatnih količina vode na izvoru Žižić	5.844.818	23.12.2021.	N/P	5.12.2019.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
36		117	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	3	NPOO								-
38		120	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište	3	-								-
4		139	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac	3	-								-

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
		14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	3	-								-
		52	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac	3	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Vranik	3.271.817	03.02.2022.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		52	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac	3	RPHV	uređenje izvorišta Vriliina i Blatni Jarak	126.440	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
		55	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina	3	RPHV	sanacija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Udbina	5.320.287	Plan HV 2020	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju
	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	104	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	3	NPOO	Vodoopskrbni podsustav naselja Mitlo, Blizna donja i Blizna gornja i Vodoopskrbna mreža naselja Mitlo, Blizna donja i Blizna gornja	5.781.826	23.03.2022.	25.10.2021.	21.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno
		99	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	3	-								-
		97	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrlika	3	-								-
		148	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	3	-								-
		20	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	3	-								-
		106	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo	3	-								-
		147	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	3	-								-
		115	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje	3	-								-
	VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. Senj	1 dodatni	Razvoj alternativnog sustava opskrbe regionalnog vodovoda za UP 28 (VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. Senj)	N/P	u pripremi		1.500.000.000**			u pripremi		u pripremi	u pripremi
		nacionalni 1	Interventna mjera ugradnje klorinatora na vodozahvatima u zonama opskrbe lokalnih vodovoda	N/P	-		5.000.000**						-
		nacionalni 2	Projekt ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe	N/P	u pripremi		100.000.000**	N/P	N/P	N/P	N/P	u pripremi	u pripremi
		nacionalni 3	Projekti potpore smanjenju gubitaka	N/P	RPHV		120.000.000**	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	u provedbi

Uslužno područje	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Vrijednost bez PDV(HRK)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO - a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe
	PNP*	prema nacionalnom postupku										
	**	procjena iz Programa 2021.										

Ukupna vrijednost svih navedenih projekata iznosi oko 5.319.800.000 kn. 54 % od ukupnog iznosa ulaže se u projekte koji su u Programu 2021. ocijenjeni prvim prioritetom. Čak 32 % od ukupnog iznosa se ulaže u nacionalne i dodatne projekte pri čemu se treba naglasiti da još uvijek nije započeto s pripremom i realizacijom projekta: Interventna mjera ugradnje klorinatora na vodozahvatima u zonama opskrbe lokalnih vodovoda.

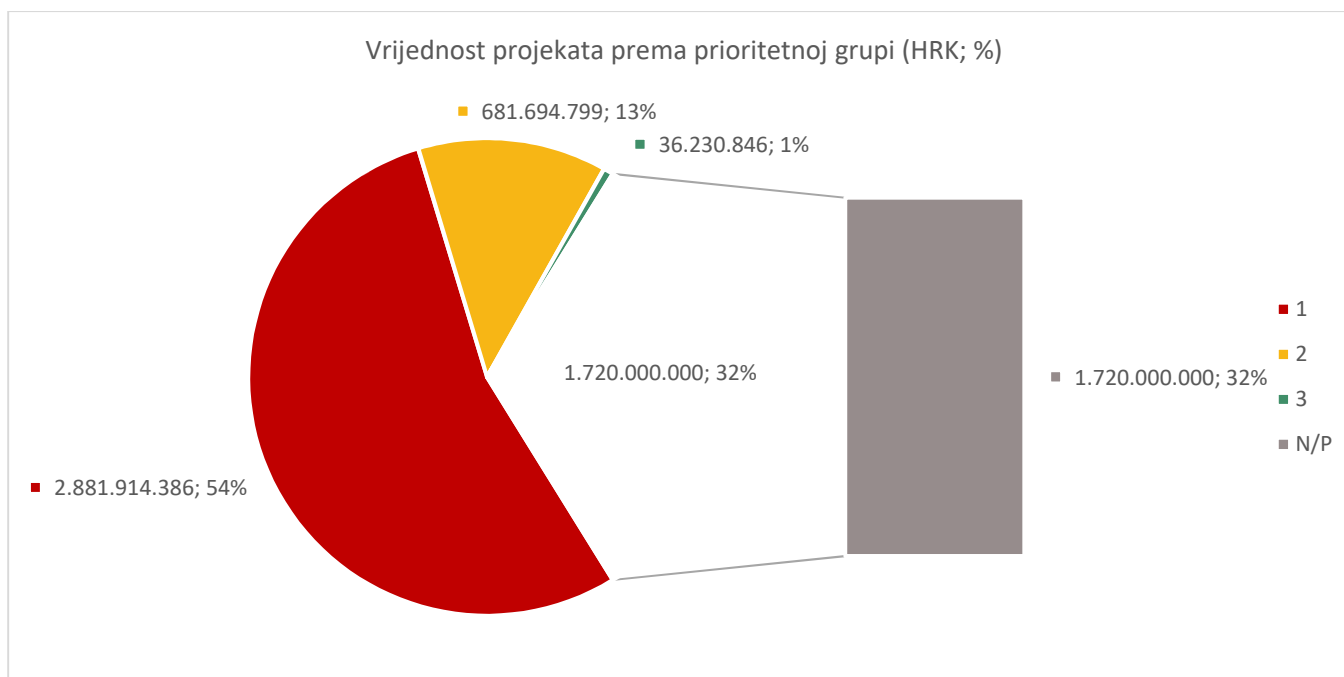


Trenutačno se projekti javne vodoopskrbe realiziraju na svim uslužnim područjima uz napomenu da se na uslužnim područjima 3, 18, 26, 27 i 40 u projekte javne vodoopskrbe ulaže u okviru projekata aglomeracija.


Uslužno područje	Vrijednost projekata (HRK)							Ukupno
	FSEU	OPZO 2007-2013	OPKK 2014-2020	NPOO	RPHV	SD	U pripremi	
1				5.708.393				5.708.393
2					13.429.227			13.429.227
3								u projektu aglomeracije
4				6.569.185				6.569.185
5				6.899.578				6.899.578
6				3.183.365	458.896			3.642.261
7				3.647.709				3.647.709
8		12.351.012	76.647.987	18.922.031				107.921.030
9				538.944	12.672.755			13.211.699
10	8.705.270			1.965.241				10.670.511
11				52.606.558				52.606.558
12					3.707.458			3.707.458
13			707.108.262					707.108.262
14	159.720			20.019.745				20.179.465
15	185.802.989			44.541.656				230.344.645
16	71.066.101							71.066.101
17				12.129.886				12.129.886
18								u projektu aglomeracije
19				2.271.364				2.271.364
20				1.543.610				1.543.610
21				24.395.085				24.395.085
22				2.340.303				2.340.303
23				5.826.131	2.184.245			8.010.375
24				45.668.309				45.668.309
25				15.301.724	10.441.865	113.361.114		139.104.703
26								u projektu aglomeracije
27								u projektu aglomeracije
28				7.863.528	9.658.423		1.500.000.000	1.517.521.951
29				18.499.010	6.459.871			24.958.880

Uslužno područje	Vrijednost projekata (HRK)							Ukupno
	FSEU	OPZO 2007-2013	OPKK 2014-2020	NPOO	RPHV	SD	U pripremi	
30				31.195.398			1.752.349.350	1.783.544.748
31				32.358.236				32.358.236
32				9.881.634	6.654.515			16.536.149
33				38.776.333	4.380.268			43.156.600
34				3.819.062	4.618.350			8.437.412
35					24.440.959			24.440.959
36				23.320.417	2.769.867			26.090.284
37				10.060.501	1.094.032			11.154.532
38				38.928.661	4.874.913			43.803.573
39				48.206.751	20.822.460			69.029.212
40								u projektu aglomeracije
41				6.631.778				6.631.778
RH					120.000.000		100.000.000	220.000.000
Ukupno	265.734.080	12.351.012	783.756.249	543.620.124	248.668.103	113.361.114	3.352.349.350	5.319.840.032

Ukupno gledano gotovo podjednaku vrijednost imaju komponente projekata koje se financiraju sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. i Nacionalnog programa oporavka i otpornosti.

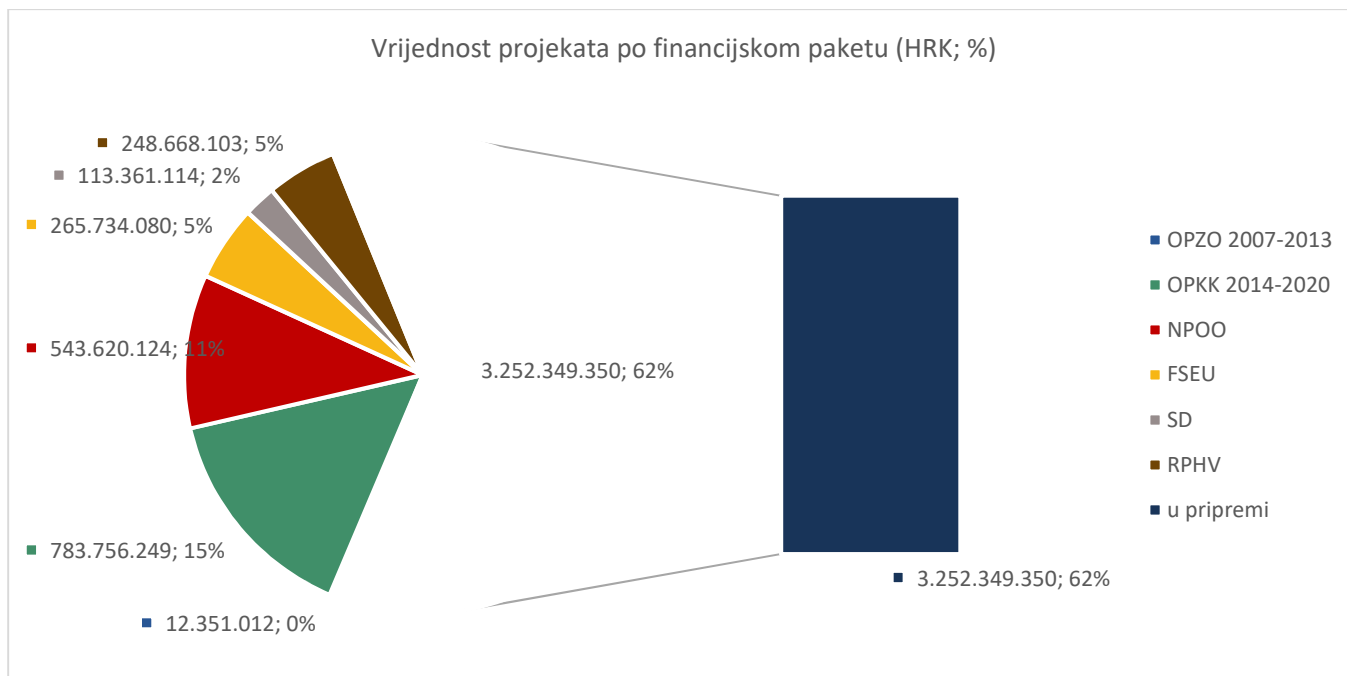

Trenutačno se ne provodi ukupno 45 projekata iz Programa 2021. i to najviše na uslužnim područjima 4 i 14. Od 45 projekata njih 11 (oko 24 %) pripada prvoj prioritetnoj grupi, a 20 projekata (oko 44 %) trećoj prioritetnoj grupi.

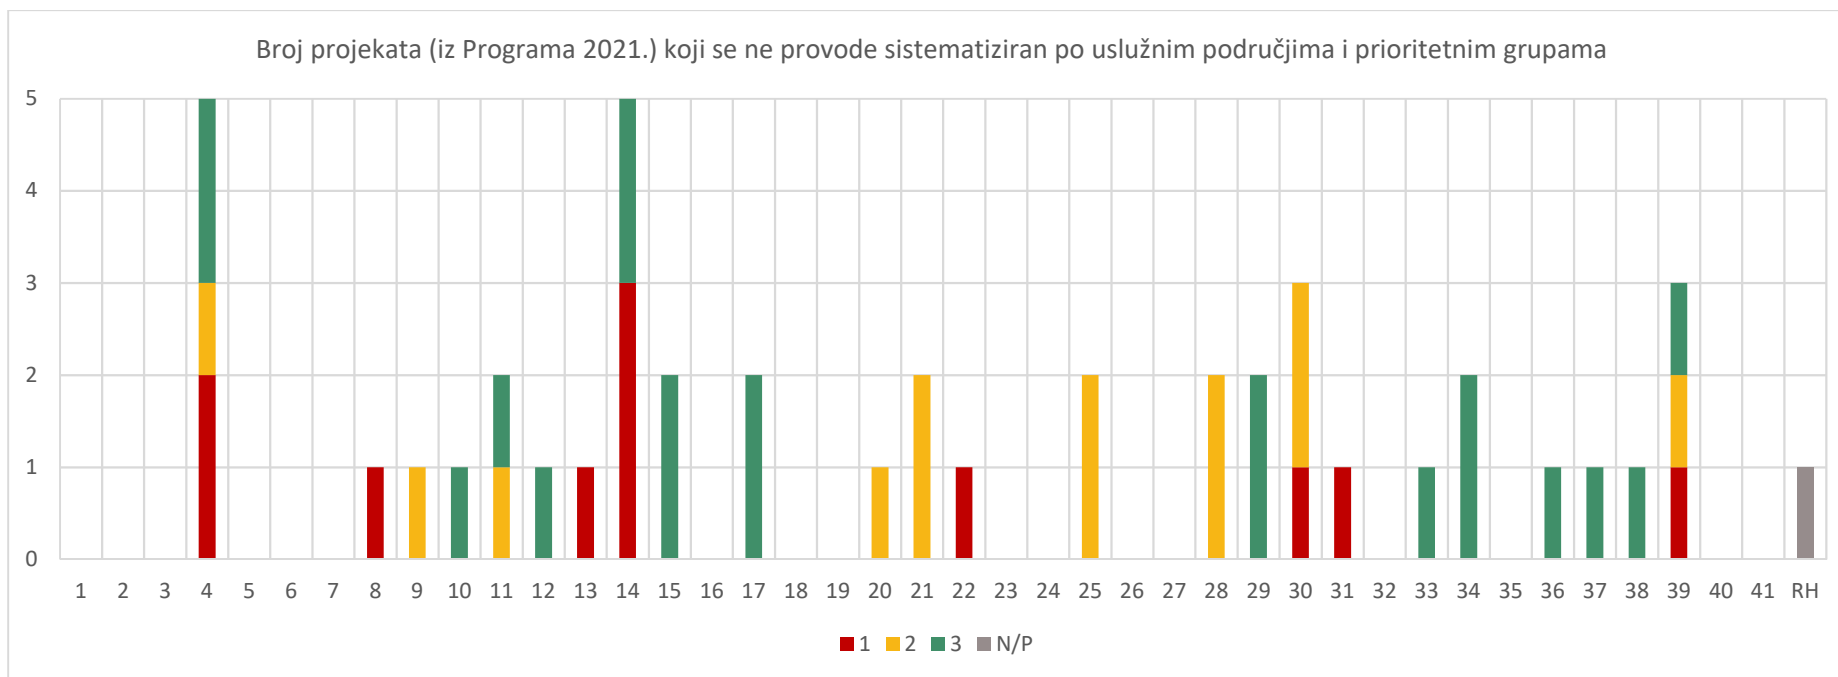

Rješavanje problema javne vodoopskrbe se zbog posljedica potresa s početka 2021. godine na području Banovine (uslužna područja 16 i 17) smatra prioritarnim bez obzira na rezultate provedene prioritizacije planiranih projekata razvoja javne vodoopskrbe. Riječ je o 7 projekata iz Programa 2021. koje provodi 6 javnih isporučitelja vodne usluge vodoopskrbe. Financiranje dijela aktivnosti na ovom području se provodi kroz Fond solidarnosti Europske unije.

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	Prioritetna grupa Projekta prema osnovnoj prioritizaciji planiranih projekata razvoja javne vodoopskrbe u Programu 2021.
16	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	1
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	2
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	2
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	3
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	3

Iz Fonda solidarnosti Europske unije je za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije za operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama potpisano je 15 ugovora ukupnog iznosa 265.734.080 kn. Svi ugovori su navedeni kao posebne komponente u tablici pregleda realizacije projekata javne vodoopskrbe.

2.1.2 Pregled projekata odvodnje

Pregled realizacije projekata javne odvodnje obuhvaća informacije o realizaciji projekata / komponenti / potkomponenti u okviru sljedećih financijskih paketa

Financijski paket	Skraćenica	Razdoblje Financijskog paketa	Napomena
Razvojni programi javnih isporučitelja	RPJI	-	podaci nisu dostupni, nema obveze izvješćivanja (očekuje se u okviru 2. izvješća - godišnje izvješće)
Redoviti program Hrvaskih voda	RPHV	-	prikupljeni podaci o projektima čija je provedba započela u 2022. godini
Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007. - 2013.	OPZO 2007-2013	2007. - 2016.	korišteni podaci
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020.	OPKK 2014-2020	2014. - 2023.	korišteni podaci
Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026.	NPOO	2021. - 2026.	korišteni podaci
Fond solidarnosti Europske unije	FSEU	do svibnja 2023.	neke aktivnosti na sanaciji infrastrukture javne odvodnje uključeni u projekte vodoopskrbe
Višegodišnji financijski okvir 2021. - 2027.	VFO 2021-2027	2022. - 2029.	nema podataka (projekti u pripremi se mogu smatrati potencijalnim kandidatima za financiranje)
Švicarska darovnica	SD	do kraja 2023	korišteni podaci
Program ruarnlog razvoja 2014. - 2020. dodatno proširen na 2021. i 2022. godinu	RR	do kraja 2025.	korišteni podaci

Trenutačno je na području Republike Hrvatske u različitim fazama realizacije 1.008 potkomponenti projekata aglomeracija iz Programa 2021. Kako podaci o financijskoj realizaciji projekata u prvih 6 mjeseci 2022. godine još uvijek nisu dostupni, u tablici su naznačeni samo podaci o ukupnim vrijednostima projekata, odnosno njihovih komponenti / potkomponenti. Očekuje se da će sveobuhvatne podatke o stanju realizacije projekta prema financijskim pokazateljima biti moguće dati u 2. izvješću (godišnje izvješće na kraju 2022. godine).

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	101339	Čakovec	31.12.2018.	273.338.268,00	OPZO 2007-2013	mreža i UPOV	završeno						završeno	
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	101339	Čakovec	31.12.2018.	2.505.363,54	NPOO	Izgradnja kanalizacijske mreže područja Zavrtje u Nedelišću	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5056	Mursko Središće	31.12.2020.	181.777.310,00	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 16.09.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5056	Mursko Središće			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 16.06.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5056	Mursko Središće			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 06.09.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5056	Mursko Središće			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 02.10.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5056	Mursko Središće			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 29.11.2018.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5056	Mursko Središće			31.12.2020.	500.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju odvodnog sustava Toplice Sveti Martin	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5044	Donja Dubrava	31.12.2018.	189.080.650,00	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 19.08.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5044	Donja Dubrava			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 27.01.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5044	Donja Dubrava			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 28.08.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5044	Donja Dubrava			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 30.09.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5044	Donja Dubrava			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 21.12.2018.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5057	Novo Selo na Dravi	31.12.2023.		PREKOGRANIČNA SURADNJA		završeno						završeno	
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5059	Podbrest	31.12.2023.	251.967.562,00			u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5045	Donji Kraljevec	31.12.2023.	154.091.847,80		u pripremi projekt Donji Kraljevec - Goričan	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5049	Goričan	31.12.2023.			u pripremi projekt Donji Kraljevec - Goričan	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5060	Podturen	31.12.2023.	489.321.470,00		u pripremi projekt Podturen - Držimurec - Turčišće - Belica	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5047	Držimurec	31.12.2023.			u pripremi projekt Podturen - Držimurec - Turčišće - Belica	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5065	Turčišće	31.12.2023.			u pripremi projekt Podturen - Držimurec - Turčišće - Belica	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5041	Belica	31.12.2023.			u pripremi projekt Podturen - Držimurec - Turčišće - Belica	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
1	MEDIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5057	Novo Selo na Dravi	31.12.2023.		76.000.000,00	RP HV	Građenje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju Novog Sela na Dravi s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za neselje Kuršanec, Šandorovec, Totovec i Novo Selo na Dravi	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija Dokumentacija o nabavi	Status projekta		
1	MEDIMURSKJE VODE d.o.o. Čakovec	101342	Štrigova	mala	248.978,85	RP HV	Izrada projektne dokumentacije za proširenje sustava odvodnje naselja Štrigova (idejni i glavni projekt)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin	31.12.2018.	684.664.161,00	OPKK 2014-2020	Ugovor br. 198/19 "A-1. Dogradnja sustava odvodnje - Grad Varaždin i sanacija postojećeg sustava odvodnje"	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin			OPKK 2014-2020	Ugovor br. 199/19 "A-2. Dogradnja sustava odvodnje - Općina Cestica, Vinica, Petrijanec, Sračinec"	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin			OPKK 2014-2020	Ugovor br. 190/17 "A-3. Dogradnja sustava odvodnje - Općina Vidovec i Maruševac"	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin			OPKK 2014-2020	Ugovor br. 187/17 "A-4. Dogradnja sustava odvodnje - Općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Knežinec, Trnovec Bartolovečki"	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin			OPKK 2014-2020	Sporazum br. 446/22 "Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanja otpadnih voda UPOV Varaždin"	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin			OPKK 2014-2020	Ugovor o uslugama nadzora nad provedbom projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin"	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin			OPKK 2014-2020	Ugovor br.249/19 "Dobava opreme za održavanje sustava odvodnje, Grupa 1: Nabava vozila"; Ugovor br. 250/19 "Dobava opreme za održavanje sustava odvodnje, Grupa 2: Nabava opreme"	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin			OPKK 2014-2020	Ugovor o uslugama tehničke podrške upravljanja projektom "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin"	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin	OPKK 2014-2020	Ugovor o uslugama informiranja javnosti i vidljivosti projekta sufinanciranog EU sredstvima "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin"	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju		
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin	31.12.2018.	117.500,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta dijela sustava za odvodnju sanitarnih otpadnih voda općine Gornji Knežinec	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin	31.12.2018.	165.000,00	RP HV	Izrada idejnog projekta sustava odvodnje naselja Šemovec i Zamlaka	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin	31.12.2018.	400.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijske mreže u Trnovcu Bartolovečkom - nova ulica	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin	31.12.2018.	10.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijske mreže u Trnovcu Bartolovečkom - nova ulica	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin	31.12.2018.	1.200.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijske mreže u Trnovcu Bartolovečkom - Ulica Vladimira Nazora	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin	31.12.2018.	30.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijske mreže u Trnovcu Bartolovečkom - Ulica Vladimira Nazora	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5035	Varaždin	31.12.2018.	195.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Dubrava Križovljanska, Otok Virje i Vratno otok u općini Cestica	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5036	Varaždinske Toplice	31.12.2023.	49.684.723,00	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 20.02.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5036	Varaždinske Toplice			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 26.08.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	VARKOM d.d. Varaždin	5036	Varaždinske Toplice			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 15.02.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	VARKOM d.d. Varaždin	5036	Varaždinske Toplice			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 20.09.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	VARKOM d.d. Varaždin	5036	Varaždinske Toplice			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 15.02.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	VARKOM d.d. Varaždin	5036	Varaždinske Toplice			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 29.03.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	VARKOM d.d. Varaždin	5025	Ludbreg	31.12.2023.	369.710.574,00			u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5029	Novi Marof	31.12.2023.	278.523.438,00			u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5024	Lepoglava	31.12.2023.	92.460.500,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
2	VARKOM d.d. Varaždin	101061	Veliki Bukovec	31.12.2023.	59.196.344,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5018	Jalžabet	31.12.2023.	108.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
2	VARKOM d.d. Varaždin	3143	Klenovnik	mala	100.000,00	RP HV	Izrada konceptijskog rješenja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Klenovnik	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5008	Beletinec	mala	174.000,00	RP HV	Izrada glavnog projekta sustava odvodnje naselja Beletinec i Krušljevec	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5008	Beletinec	mala	175.500,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta UPOV-a Beletinec	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5008	Beletinec	mala	200.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta UPOV-a Beletinec	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5018	Jalžabet	mala	2.200.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Jakopovec i Kaštelanec – etapa 2022	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5018	Jalžabet	mala	50.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Jakopovec i Kaštelanec – etapa 2022	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n(p)	stručni nadzor	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5018	Jalžabet	mala	605.000,00	RR	Izgradnja spojnog kanala između mreže naselja Jalžabet i UPOV-a i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda; istok - naselja Jalžabet, Imbriovec, Novakovec	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5032	Sveti Ilija	mala	185.000,00	RP HV	Izrada glavnog projekta sustava odvodnje naselja Seketin	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
2	VARKOM d.d. Varaždin	101094	Donja Voća	mala	195.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Donja Voća (I. etapa)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	VARKOM d.d. Varaždin	101145	Kapela Kalnička	mala	154.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje dijela naselja Ljubešćica - II faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	VARKOM d.d. Varaždin	101145	Kapela Kalnička	mala	180.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje dijela naselja Ljubešćica - II faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	VARKOM d.d. Varaždin	101154	Slanje	mala	149.500,00	RP HV	Izrada idejnih i glavnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola za odvodni sustav AG Slanje (naselja Slanje, Leskovec Toplički, Gornja Poljana, Donja Poljana, Jalševac Svibovečki, Grešćevina i Retkovec Svibovečki) i UZPOV Slanje	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	VARKOM d.d. Varaždin	101154	Slanje	mala	180.000,00	RP HV	Izrada idejnih i glavnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola za odvodni sustav AG Slanje (naselja Slanje, Leskovec Toplički, Gornja Poljana, Donja Poljana, Jalševac Svibovečki, Grešćevina i Retkovec Svibovečki) i UZPOV Slanje	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	VARKOM d.d. Varaždin	101154	Slanje	mala	160.000,00	RP HV	Izrada glavnog projekta UZPOV-a aglomeracije Slanje	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5032	Sveti Ilija	mala	7.437.828,47	NPOO	Sustav odvodnje naselja Sveti Ilija	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
2	VARKOM d.d. Varaždin	5018	Jalžabet	mala	1.710.422,26	NPOO	Sanitarna kanalizacija u Kaštelancu i Jakopovcu	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
2	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	5017	Ivanec	31.12.2020.	173.047.160,00	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 07.07.2021. (grupa 1), 29.07.2021. (grupa 2)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
2	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	5017	Ivanec			OPKK 2014-2020	UPOV - otvaranje ponuda održano 24.09.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
2	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	5017	Ivanec			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 25.06.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	5017	Ivanec			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 22.09.2020. (grupa 2)	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	5017	Ivanec			OPKK 2014-2020	oprema - Odluke o odabiru objavljene 13.06.2022. (grupe 1 i 3)	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
2	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	5017	Ivanec			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 05.10.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	5017	Ivanec			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 13.03.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
2	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	101140	Žarovnica	mala	85.000,00	RP HV	Izrada glavnog projekta sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Žarovnica – I. etapa, odvodnja naselja Kamenica i Crkovec	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
2	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	101141	Bednja	mala	3.377.000,00	RR	Građenje građevine 2. skupine, infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda "Sustav odvodnje sanitarnih voda naselj Bednja s pripadajućim UPOV-om"	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
2	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	101141	Bednja	mala	3.385.000,00	RR	Građenje građevine 2. skupine, infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda "Sustav odvodnje sanitarnih voda naselj Bednja s pripadajućim UPOV-om"	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
2	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	101142	Bedenec	mala	4.255.000,00	RR	Sanitarna kanalizacija naselja Bedenec u pojasu ceste ŽC 2101; Grad Ivanec; Bedenec	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica	31.12.2018.	410.073.314,73	OPKK 2014-2020	Građevinski radovi izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe Koprivnica - Grupa 1	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Elektro radovi i radovi na NUS-u Koprivnica - Grupa 2	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Građevinski radovi izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe - Grupa 1	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Elektro radovi i radovi na NUS-u - Grupa 2	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a (proširenje laboratorija) građ radovi - Grupa 3	odobren	da	da	da	da	da	da	završeno
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Zamjena opreme na UPOV-u Herešin	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a, nabava instrumenata i uređaja - Grupa 1	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Dogradnja pogonske zgrade UPOV-a- nabava namještaja - Grupa 2	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Nabava opreme - Grupa 1 - Vozila za održavanje	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Nabava opreme - Grupa 2 - Kombinirani bager - rovokopač	odobren	da	da	da	da	da	da	završeno
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Nabava opreme - Grupa 3 - Teretno vozilo s dizalicom	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Nabava opreme - Grupa 4 - Vozila za prijevoz radnika i materijala	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Nabava opreme - Grupa 5 - Mobilne crpke	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Nabava opreme - Grupa 6 - Mjerna oprema, oprema za ispitivanje i informatička oprema	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Usluga građevinskog nadzora	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Upravljanje projektom – vanjski stručnjaci	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica			OPKK 2014-2020	Promidžba i vidljivost	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica	31.12.2018.	3.400.000,00	RR	Proširenje vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol u naselju Draganovec	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5023	Legrad	mala	100.000,00	RP HV	Izrada konceptijskog rješenja aglomeracije Legrad primjenjivog za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU fondova	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
3	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	5021	Koprivnica	31.12.2018.	7.615.396,09	NPOO	Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i V. Mučna	odobren	da	da, 21.04.2022.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
3	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	4048	Križevci	31.12.2018.	256.370.225,10	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 31.03.2021.	Odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
3	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	4048	Križevci			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 10.05.2022.	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	4048	Križevci			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 29.09.2021.(grupe 3 i 5), 05.10.2021.(grupa 4), 08.10.2021.(grupa 6), 30.09.2021. (grupe 1 i 2)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	4048	Križevci			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 17.01.2020.	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	4048	Križevci			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 20.01.2020.	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	4048	Križevci			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 14.01.2020.	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
3	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	4048	Križevci	31.12.2020.	200.000,00	RP HV	Zamjena crpki zbog dotrajalosti na crpnim stanicama na sifonu 6 i sifonu 7 u Križevcima	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
3	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	4076	Sveti Ivan Žabno	mala	1.212.500,00	RP HV	Izgradnja sustava odvodnje u Svetom Ivanu Žabno uz DC	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
3	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	4076	Sveti Ivan Žabno	mala	37.500,00	RP HV	Izgradnja sustava odvodnje u Svetom Ivanu Žabno uz DC	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
3	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	101108	Sveti Petar Orehovec	mala	198.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Sveti Petar Orehovec	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
3	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	101108	Sveti Petar Orehovec	mala	200.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Sveti Petar Orehovec	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
4	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	6008	Bjelovar	31.12.2018.	205.978.311,00	OPKK 2014-2020	1. Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje	Odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
4	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	6008	Bjelovar			OPKK 2014-2020	2. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Bjelovar“	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	6008	Bjelovar			OPKK 2014-2020	3. Usluge nabave opreme (grupa 1)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	6008	Bjelovar			OPKK 2014-2020	4. Usluge nabave opreme (grupa 2)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	6008	Bjelovar			OPKK 2014-2020	5. Usluge nabave opreme (grupa 3)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	6008	Bjelovar			OPKK 2014-2020	6. Usluge nabave opreme (grupa 4)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	6008	Bjelovar			OPKK 2014-2020	7. Usluge nabave opreme (grupa 5)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	6008	Bjelovar			OPKK 2014-2020	8. Usluge nabave opreme (grupa 6)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	6008	Bjelovar			OPKK 2014-2020	9. Usluge stručnog nadzora	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	6008	Bjelovar			OPKK 2014-2020	10. Upravljanje projektom - vanjski stručnjak	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	6008	Bjelovar			OPKK 2014-2020	11. Informiranje i vidljivost	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	6008	Bjelovar II		99.000.000,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
4	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	6069	Rovišće	31.12.2023.	18.468.000,00			u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUJA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUJA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
4	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	6008	Bjelovar	31.12.2018.	6.269.750,19	NPOO	Izgradnja sustava odvodnje Bjelovar faza 6 i 7	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
4	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	6094	Veliko Trojstvo	mala	489.340,00	RP HV	Izgradnja polja za ozemljavanje mulja na uređaju u Velikom Trojstvu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
4	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	6094	Veliko Trojstvo	mala	10.765,48	RP HV	Izgradnja polja za ozemljavanje mulja na uređaju u Velikom Trojstvu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5012	Đurđevac	31.12.2023.	282.013.010,84	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 20.08.2021. (grupe 3 i 5), 23.09.2021. (grupe 1, 2). 02.12.2021. (grupa 4)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5012	Đurđevac			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 20.08.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5012	Đurđevac			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 20.08.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5012	Đurđevac			OPKK 2014-2020	oprema - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5012	Đurđevac			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 27.09.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5012	Đurđevac			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 17.03.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5038	Virje (Novigrad Podravski)			31.12.2023.	OPKK 2014-2020	dio projekta Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5031	Podravske Sesvete (Kloštar Podravski)			31.12.2023.	OPKK 2014-2020	dio projekta Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	201119	Ferdinandovac			31.12.2023.	OPKK 2014-2020	dio projekta Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5038	Virje			31.12.2023.	OPKK 2014-2020	dio projekta Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5031	Podravske Sesvete	31.12.2023.	OPKK 2014-2020	dio projekta Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju		
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5028	Molve	mala	112.000,00	RP HV	Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju sanitarnog kanala Sanitarni Kolektor 1 uz postojeći oborinski kanal 'Kolektor 1'	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5038	Virje	31.12.2023.	190.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sanitarno fekalne odvodnje sa pročišćavanjem otpadnih voda za naselja Miholjanec	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5038	Virje	31.12.2023.	180.000,00	RP HV	Izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije postojeće izgrađene kanalizacijske mreže naselja Virje i ishođenje uporabne dozvole	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5038	Virje	31.12.2023.	219.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju sustava sanitarno fekalne odvodnje sa pročišćavanjem otpadnih voda naselja Vlaislav i Borovljani	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	5038	Virje	31.12.2023.	195.000,00	RP HV	Izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije postojeće izgrađene sanitarno fekalne kanalizacije	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
							naselja Delovi i Novigrad P. i ishođenje uporabne dozvole							
4	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	201143	Suha Katalena	mala	6.420.000,00	RR	Izgradnja sustava odvodnje naselja Suha Katalena s UPOV-om	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
4	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	6012	Daruvar	31.12.2018.	213.938.572,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
4	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	6012	Daruvar	31.12.2018.	200.000,00	RP HV	Istražni radovi i prijedlog sanacije postojećih kolektora, a koji nisu predmet rekonstrukcije predviđenih EU Projektom na sustavu odvodnje Daruvar.	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
4	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	6021	Đulovac	mala	196.500,00	RP HV	Novelacija projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Đulovac	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
4	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	6044	Končanica	mala	193.700,00	RP HV	Izrada glavnog projekta III. faze kanalizacijskog sustava naselja Končanica-Daruvarski Brestovac	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
4	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	6075	Sirač	mala	198.000,00	RP HV	Novelacija dijela projekta sustava odvodnje otpadnih voda Sirača	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
4	VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	6025	Garešnica	31.12.2023.	135.191.207,91		u pripremi u projektu Garešnica - Hercegovac	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi
4	VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	6032	Hercegovac	31.12.2023.			u pripremi u projektu Garešnica - Hercegovac	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi
4	VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	6029	Grubišno Polje	31.12.2023.	99.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
4	VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	6029	Grubišno Polje	31.12.2023.	3.216.250,00	RP HV	Izgradnja kolektora u Ul. Kralja Zvonimira	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
4	VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	6029	Grubišno Polje	31.12.2023.	179.381,46	RP HV	Izgradnja kolektora u Ul. Kralja Zvonimira	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
4	KAPELAKOM d.o.o. Kapela	6039	Kapela	mala	5.473.400,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijske mreže na području općine Kapela – I faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
4	KAPELAKOM d.o.o. Kapela	6039	Kapela	mala	149.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijske mreže na području općine Kapela – I faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
4	KAPELAKOM d.o.o. Kapela	6039	Kapela	mala	6.280.000,00	RR	Izgradnja UPOV-a.	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
5	VIRKOM d.o.o. Virovitica	5132	Virovitica	31.12.2018.	131.826.659,90	OPZO 2007-2013		završeno						završeno
5	VIRKOM d.o.o. Virovitica	5132	Virovitica			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 16.07.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
5	VIRKOM d.o.o. Virovitica	5132	Virovitica			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 10.01.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
5	VIRKOM d.o.o. Virovitica	5132	Virovitica			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 20.08.2018.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
5	VIRKOM d.o.o. Virovitica	5128	Suhopolje	31.12.2023.	187.900.064,00		u pripremi u projektu Suhopolje - Gradina	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi
5	VIRKOM d.o.o. Virovitica	5093	Gradina	31.12.2023.			u pripremi u projektu Suhopolje - Gradina	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi
5	VIRKOM d.o.o. Virovitica	5132	Virovitica	31.12.2018.	147.997,00	RP HV	Rekonstrukcija RO glavnog kolektora u ulici M. Gupca - ugradnja zapornice i preusmjeravanje vode na UPOV.	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
5	VIRKOM d.o.o. Virovitica	5132	Virovitica	31.12.2018.	10.500,00	RP HV	Rekonstrukcija RO glavnog kolektora u ulici M. Gupca - ugradnja zapornice i preusmjeravanje vode na UPOV.	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
5	VIRKOM d.o.o. Virovitica	5132	Virovitica	31.12.2018.	236.952,35	RP HV	Rekonstrukcija CS naselja Korija II	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
5	VIRKOM d.o.o. Virovitica	5132	Virovitica	31.12.2018.	11.437.000,00	RR	Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Lozan	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
5	KOMRAD d.o.o. Slatina	5123	Slatina	31.12.2020.	213.405.964,20	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 25.08.2021.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
5	KOMRAD d.o.o. Slatina	5123	Slatina			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 03.12.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
5	KOMRAD d.o.o. Slatina	5123	Slatina			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 16.07.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
5	KOMRAD d.o.o. Slatina	5123	Slatina			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 30.07.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
5	KOMRAD d.o.o. Slatina	5123	Slatina			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 06.08.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
5	KOMRAD d.o.o. Slatina	5123	Slatina			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 09.06.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
5	KOMRAD d.o.o. Slatina	5005	Podravska Moslavina	mala	4.799.305,10	RP HV	Izgradnja kanalizacije naselja Podravska Moslavina	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
5	KOMRAD d.o.o. Slatina	5005	Podravska Moslavina	mala	163.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacije naselja Podravska Moslavina	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
5	KOMRAD d.o.o. Slatina	5133	Voćin	mala	3.921.559,83	RP HV	Nastavak izgradnje II. faze sustava odvodnje aglomeracije Voćin	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
5	KOMRAD d.o.o. Slatina	3155	Voćin	mala	76.000,00	RP HV	Nastavak izgradnje II. faze sustava odvodnje aglomeracije Voćin	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
5	KOMRAD d.o.o. Slatina	5078	Čađavica	mala	197.500,00	RP HV	Novelacija projektne tehničke dokumentacije Sanitarno - fekalna kanalizacija naselja čađavica i UPOV-a	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
5	KOMRAD d.o.o. Slatina	5107	Nova Bukovica	mala	190.000,00	RP HV	Izmjena i dopuna idejnog projekta sustava odvodnje Nova Bukovica	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
5	VODAKOM d.o.o. Pitomača	5118	Pitomača	31.12.2023.	209.623.645,00	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 28.08.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
5	VODAKOM d.o.o. Pitomača	5118	Pitomača			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 12.04.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
5	VODAKOM d.o.o. Pitomača	5118	Pitomača			OPKK 2014-2020	oprema - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
5	VODAKOM d.o.o. Pitomača	5118	Pitomača			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 20.02.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
5	VODAKOM d.o.o. Pitomača	5118	Pitomača			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 10.06.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
5	VODAKOM d.o.o. Pitomača	5118	Pitomača			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 22.07.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
5	VODAKOM d.o.o. Pitomača	5118	Pitomača	31.12.2023.	195.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije kanalizacije naselja Sedlarica	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
5	VODA d.o.o. Orahovica	5113	Orahovica	31.12.2023.	80.447.153,00		u pripremi u projektu Orahovica - Čačinci	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
5	VODA d.o.o. Orahovica	5077	Čačinci	31.12.2023.			u pripremi u projektu Orahovica - Čačinci	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
5	VODA d.o.o. Orahovica	5077	Čačinci	31.12.2023.	1.072.248,26	NPOO	Radovi/izgradnja-sustav odvodnje u ulicama Petra Preradovića i Bukvička u naselju Čačinci	odobren	da	da, 22.01.2019.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	6020	Đakovo	31.12.2018.	213.851.627,05	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 02.11.2018.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	6020	Đakovo			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 10.05.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	6020	Đakovo			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 17.10.2018.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	6020	Đakovo			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 28.11.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	6020	Đakovo			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 15.10.2018.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	6020	Đakovo II						Otvaranje ponuda izrade studijske, projektne i dokumentacije o nabavi održano 05.01.2022.	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	6020	Đakovo	31.12.2018.	75.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije produžetka kanalizacijske mreže u Gradu Đakovu (Đakovo II)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	6020	Đakovo	31.12.2018.	1.458.000,00	RP HV	Izgradnja vodovoda i kanalizacijske mreže u Ulici Krešimira Pavića I. faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	6020	Đakovo	31.12.2018.	29.160,00	RP HV	Izgradnja vodovoda i kanalizacijske mreže u Ulici Krešimira Pavića I. faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	6020	Đakovo	31.12.2018.	1.050.000,00	RP HV	Izgradnja sustava javne odvodnje u Ulici Petra Preradovića - dio industrijske zone	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	6020	Đakovo	31.12.2018.	21.000,00	RP HV	Izgradnja sustava javne odvodnje u Ulici Petra Preradovića - dio industrijske zone	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	101043	Semeljci	31.12.2023.	175.653.809,00	OPKK 2014-2020	mreža - ugovori potpisani 27.07.2021. (grupe 1, 2 i 3)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	101043	Semeljci			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 29.04.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	101043	Semeljci			OPKK 2014-2020	oprema - otvaranje ponuda 27.07.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	101043	Semeljci			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 02.10.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	101043	Semeljci			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 02.11.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	101043	Semeljci			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 26.10.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
6	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	101039	Punitovci	31.12.2023.	80.000.000,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
6	NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	5004	Našice	31.12.2018.	166.258.570,00	OPKK 2014-2020	mreža (Našice) - ugovor potpisan 21.01.2021. (grupa 2), 26.03.2021. (grupa 1)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
6	NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	5004	Našice			OPKK 2014-2020	mreža (šire našičko područje - grupe 1 i 2) - ugovori potpisani 28.10.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
6	NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	5004	Našice			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 19.11.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
6	NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	5004	Našice			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 28.09.2020. (grupa 2), 07.12.2020. (grupa 1)	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
6	NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	5004	Našice			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 02.04.2021. (grupa 1), 01.04.2021. (grupe 2 i 3)	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
6	NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	5004	Našice			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 30.12.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
6	NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	5002	Feričanci	mala	220.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije UPOV-a Feričanci	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
6	NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	101047	Podgorač	mala	198.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije UPOV-a Podgorač	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
6	NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	101047	Podgorač	mala	2.596.341,50	RP HV	Izgradnja kanalizacije naselja Stipanovci	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
6	NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	101047	Podgorač	mala	69.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacije naselja Stipanovci	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
6	VODORAD d.o.o. Đurđenovac	5006	Sušine-Đurđenovac	31.12.2023.	105.774.793,00			u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
7	BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	7003	Beli Manastir	31.12.2018.	116.682.963,00	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 05.03.2021.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
7	BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	7003	Beli Manastir			OPKK 2014-2020	UPOV (nadogradnja) - ugovor potpisan 27.12.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
7	BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	7003	Beli Manastir			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 12.04.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
7	BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	7003	Beli Manastir			OPKK 2014-2020	oprema - otvaranje ponuda održano 07.03.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
7	BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	7003	Beli Manastir			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 17.09.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
7	BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	7003	Beli Manastir			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 19.06.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
7	BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	7009	Kneževi Vinogradi	31.12.2023.	37.500.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
7	BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	7003	Beli Manastir	31.12.2020.	2.310.387,79	RP HV	Izgradnja kanalizacije u Zagrebačkoj ulici u Belom Manastiru	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
7	BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	7003	Beli Manastir	31.12.2020.	6.753.238,13	NPOO	Izgradnja sustava javne odvodnje naselja Karanac– 2, 3 i 4 funkcionalna cjelina	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	7012	Osijek	31.12.2018.	350.385.318,41	OPZO 2007-2013	1. faza projekta (programsko razdoblje 2007-2013)	završeno						završeno	
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	7012	Osijek			OPKK 2014-2020	2. faza projekta (programsko razdoblje 2014-2020). Odbren.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	7012	Osijek			OPKK 2014-2020	2. faza projekta (programsko razdoblje 2014-2020). Odbren.	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	7012	Osijek			OPKK 2014-2020	2. faza projekta (programsko razdoblje 2014-2020). Odbren.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	7012	Osijek			OPKK 2014-2020	2. faza projekta (programsko razdoblje 2014-2020). Odbren.	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	7012	Osijek	31.12.2018.	2.900.000,00	RP HV	Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Čvrnsničkoj ulici u Osijeku	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	7012	Osijek	31.12.2018.	58.000,00	RP HV	Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Čvrnsničkoj ulici u Osijeku	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	7012	Osijek	31.12.2018.	2.000.000,00	RP HV	Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Cvjetkovoj ulici u Osijeku	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	7012	Osijek	31.12.2018.	40.000,00	RP HV	Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje u Cvjetkovoj ulici u Osijeku	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	7012	Osijek	31.12.2018.	2.547.016,98	RP HV	Izgradnja sustava odvodnje u produžetku Kanižlićeve ulice; Izgradnja sustava odvodnje u dijelu Vukovarske ulice (od broja 326 do 330); Rekonstrukcija crpne stanice Brijest; stručni nadzor i promidžba	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
8	UREDNOST d.o.o. Čepin	7012	Osijek	31.12.2018.	195.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije kanalizacijske mreže 'Naselja prijateljstva' u Čepinu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	7012	Osijek	31.12.2018.	1.455.180,79	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u produžetku Kanižlićeve ulice - odvodnja	odobren	da	da, 17.6.2022.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	7012	Osijek	31.12.2018.	337.812,27	NPOO	Izgradnja sustava odvodnje u dijelu Vukovarske ulice (od broja 326 do 330)	odobren	da	da, 17.6.2022.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	7012	Osijek	31.12.2018.	244.620,52	NPOO	Rekonstrukcija crpne stanice Brijest	odobren	da	da, 17.6.2022.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	101031	Ernestinovo	31.12.2023.	650.774.023,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
8	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	7006	Dalj	31.12.2023.	35.948.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće	31.12.2018.	271.578.968,00	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan: grupa 1-13.09.2019., grupe 2, 3 i 4-11.09.2019., grupa 5 - 20.04.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 27.04.2021.(UPOV Petrijevci i UPOV Belišće)	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće			OPKK 2014-2020	Postrojenje za pripremu pitke vode - ugovor potpisan 14.06.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 29.04.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 12.04.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće			OPKK 2014-2020	oprema - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 21.05.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	101050	Koška			31.12.2023.		OPKK 2014-2020	odobren unutar projektaValpovo, Belišće, Koška, Petrijevci, Gat	odobren	da	da	da	da	da
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7013	Petrijevci	31.12.2023.		OPKK 2014-2020	odobren unutar projektaValpovo, Belišće, Koška, Petrijevci, Gat	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće	31.12.2018.	98.400,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbne i kanalizacijske mreže do svetišta Sv.Ane	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće	31.12.2018.	12.000,00	RP HV	Vodoopskrbna i kanalizacijska mreže do svetišta Sv.Ane	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće	31.12.2018.	499.988,21	RP HV	Izgradnja kanalizacijske mreže na trgu Ante Starčevića u Belišću.	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće	31.12.2018.	177.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta kanalizacije naselja Gorica Valpovačka	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće	31.12.2018.	197.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta kanalizacije naselja Bocanjevci	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće	31.12.2018.	8.513.243,46	RP HV	Izgradnja kanalizacije naselja Črnkovci	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće	31.12.2018.	150.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacije naselja Črnkovci	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
8	HIDROBEL d.o.o. Belišće	7004	Belišće	31.12.2018.	3.421.425,39	NPOO	Izvođenje radova, stručni i obračunski nadzor te promidžba na Sustavu odvodnje Belišće-Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje naselja Belišće- dio građevine 1-sliv ulice Bana Jelačića	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
8	DVORAC d.o.o. Valpovo	7004	Belišće	31.12.2018.	450.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacije odvojak S.S. Kranjčevića u Valpovu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
8	DVORAC d.o.o. Valpovo	7004	Belišće	31.12.2018.	20.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacije odvojak S.S. Kranjčevića u Valpovu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
8	MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	5001	Donji Miholjac	31.12.2023.	117.758.125,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
8	MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	5001	Donji Miholjac	31.12.2023.	120.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije odvodnog kanala od UPOV-a do recipijenta	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
8	MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	5001	Donji Miholjac	31.12.2023.	1.250.000,00	RP HV	Opremanje UPOV-a	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
8	MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	5001	Donji Miholjac	31.12.2023.	25.000,00	RP HV	Opremanje UPOV-a	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
9	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	4090	Zabok	31.12.2018.	478.479.348,21	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan: LOT 1 - 15.06.2020., LOT 2 - 03.09.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
9	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	4090	Zabok			OPKK 2014-2020	mreža sanacija - ugovor potpisan 19.12.2018.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
9	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	4090	Zabok			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 12.01.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
9	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	4090	Zabok			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 04.02.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
9	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	4090	Zabok			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 15.07.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
9	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	4090	Zabok			OPKK 2014-2020	oprema - otvaranje ponuda održano 13.06.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
9	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	4090	Zabok			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 10.06.2020..	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
9	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	4091	Zlatar			31.12.2020.		OPKK 2014-2020	odobren unutar projekta Zabok-Zlatar	odobren	da	da	da	da	da
9	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	4090	Zabok	31.12.2018.	195.000,00	RP HV	Usluge izrade idejnog i glavnog projekta spojnog kolektora (s pripadajućim objektima) od naselja Donja Šemnica do sustava odvodnje naselja Sveti Križ Začretje (aglomeracija Zabok)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUJA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUJA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
9	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	101094	Desinić	mala	3.903.649,20	RP HV	Izgradnja javnog sustava odvodnj u naseljima Desinić, Osredak Desinički, Turnišće Desiničko i Ivanić Desinički (Svi u sastavu općine Desinić)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
9	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	101094	Desinić	mala	93.890,00	RP HV	Izgradnja javnog sustava odvodnj u naseljima Desinić, Osredak Desinički, Turnišće Desiničko i Ivanić Desinički (Svi u sastavu općine Desinić)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
9	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	101094	Desinić	mala	2.895.977,74	NPOO	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Desinić	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
9	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	4045	Krapinske Toplice	31.12.2023.	51.971.189,00			u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
9	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	101060	Jakovlje	31.12.2023.	92.447.804,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
9	KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	4044	Krapina	31.12.2020.	124.167.883,00			u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
9	KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	4044	Krapina	31.12.2023.	195.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti) za javne sustave odvodnje naselja Bobovje, Pristava Krapinska i Gornja Pačetina (aglomeracija Krapina)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
9	KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	4044	Krapina	31.12.2023.	3.963.754,78	NPOO	Odvodnja dijela naselja Šabac	odobren	da	da,	03.05.2022.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
9	VIOP d.o.o. Pregrada	4068	Pregrada	31.12.2023.	49.504.526,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
9	HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	4036	Hum na Sutli	31.12.2023.	54.601.410,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
10	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	4009	Zaprešić	31.12.2018.	547.040.890,00	OPKK 2014-2020	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Zaprešić	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
10	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	4009	Zaprešić			OPKK 2014-2020	Radovi na mreži odvodnje aglomeracije Donji Kraj	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
10	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	4009	Zaprešić			OPKK 2014-2020	Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
10	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	4009	Zaprešić			OPKK 2014-2020	Usluge nadzora	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
10	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	4009	Zaprešić			OPKK 2014-2020	Usluge upravljanje projektom	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
10	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	4009	Zaprešić			OPKK 2014-2020	Oprema - 3 grupe	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
10	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	4009	Zaprešić			OPKK 2014-2020	Promidžba i vidljivost	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
10	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	4009	Zaprešić			31.12.2018.		FSEU	Sanacija zida hale UPOV Zajarki (provodi se kroz projekt vodoopskrbe)	17.01.2022.	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	4008	Zagreb	31.12.2018.	1.881.764.060,00		ponavlja se Studija izvodljivosti	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	4007	Glavničica	31.12.2020.				u pripremi (projekt Zagreb)	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi

Uslužno područje		ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
Javni isporučitelj vodne usluge															
11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	4005	Gudci	31.12.2023.			u pripremi (projekt Zagreb)	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	4008	Zagreb	31.12.2018.	7.700.000,00	RP HV	Izgradnja javnog kanala u ulici Veliki Vrh	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	4008	Zagreb	31.12.2018.	150.000,00	RP HV	Izgradnja javnog kanala u ulici Veliki Vrh	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	4008	Zagreb	31.12.2018.	3.186.270,50	RP HV	Izgradnja sabirnog kanala u Huzjanovoj	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	4008	Zagreb	31.12.2018.	57.000,00	RP HV	Izgradnja sabirnog kanala u Huzjanovoj	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	4008	Zagreb	31.12.2018.	5.883.324,19	RP HV	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda - sanitarna kanalizacija etapa 1 (Općina Stupnik)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	4008	Zagreb	31.12.2018.	46.000,00	RP HV	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda - sanitarna kanalizacija etapa 1 (Općina Stupnik)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	4008	Zagreb	31.12.2018.	19.200.000,00	RP HV	Izgradnja, nadzor i vođenje projekta sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevac i Vuger Selo u Sesvetama	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	4008	Zagreb	31.12.2018.	199.000,00	RP HV	Izgradnja, nadzor i vođenje projekta sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevac i Vuger Selo u Sesvetama	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	4008	Zagreb	31.12.2018.	150.000,00	RP HV	Izgradnja, nadzor i vođenje projekta sabirnog kanala otpadnih voda naselja Dobrodol, Šimunčevac i Vuger Selo u Sesvetama	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	4008	Zagreb	31.12.2018.	3.593.795,00	RP HV	Izgradnja javnih kanala u slivu sabirnog kanala 'Letnička-Olovska-Fučeki'	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
11	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	4008	Zagreb	31.12.2018.	48.000,00	RP HV	Izgradnja javnih kanala u slivu sabirnog kanala 'Letnička-Olovska-Fučeki'	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
11	ODVODNJA SAMOBOR d.o.o. Samobor	4011	Samobor	31.12.2018.	198.880.366,00		ponavlja se Studija izvodljivosti	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
11	VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	4039	Jastrebarsko	31.12.2020.	135.413.711,45	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 06.07.2017.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
11	VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	4039	Jastrebarsko			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 29.07.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
11	VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	4039	Jastrebarsko			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 16.05.2017.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
11	VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	4039	Jastrebarsko			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 30.10.2018.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
11	VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	4039	Jastrebarsko			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 22.09.2017.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
11	VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	4039	Jastrebarsko			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 14.03.2018.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
11	VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	4024	Donja Zdenčina - Klinča sela	31.12.2023.	61.207.400,00			u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
11	VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	4024	Donja Zdenčina	31.12.2023.	2.798.059,00	RP HV	Izgradnja završne dionice glavnog kolektora Donja Zdenčina	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
11	VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	4024	Donja Zdenčina	31.12.2023.	95.000,00	RP HV	Izgradnja završne dionice glavnog kolektora Donja Zdenčina	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
12	VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	4010	Velika Gorica	31.12.2018.	398.890.121,00	OPKK 2014-2020	mreža A1 - Rekonstrukcija i dogradnja VG centar	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
12	VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	4010	Velika Gorica			OPKK 2014-2020	mreža A2 - Dogradnja sustava odvodnje Črnkovec	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
12	VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	4010	Velika Gorica			OPKK 2014-2020	mreža A3 - Donje Turapolje	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
12	VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	4010	Velika Gorica			OPKK 2014-2020	Projektiranje i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica kapaciteta 74.000 ES, III. stupanj pročišćavanja	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
12	VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	4010	Velika Gorica			OPKK 2014-2020	Usluge nadzora	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
12	VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	4010	Velika Gorica			OPKK 2014-2020	oprema	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
12	VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	4010	Velika Gorica			OPKK 2014-2020	Usluge upravljanje projektom	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
12	VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	4010	Velika Gorica			OPKK 2014-2020	Promidžba i vidljivost	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
12	VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	101114	Mala Buna	31.12.2023.	131.347.488,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4002	Rugvica	31.12.2018.	173.079.910,00	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 13.12.2018.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4002	Rugvica			OPKK 2014-2020	UPOV - Odluka o poništenju objavljena 16.12.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4002	Rugvica			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 28.09.2018.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4002	Rugvica			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 18.06.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4002	Rugvica			OPKK 2014-2020	oprema - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4002	Rugvica			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 02.08.2018.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4037	Ivanić Grad			OPKK 2014-2020	mreža - otvaranje ponuda održano 26.05.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4037	Ivanić Grad	OPKK 2014-2020	UPOV - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi		
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4037	Ivanić Grad	31.12.2018.	286.296.395,00	OPKK 2014-2020	nadzor - otvaranje ponuda održano 11.04.2022.	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi	
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4037	Ivanić Grad	OPKK 2014-2020	upravljanje - žalba na Odluku o odabiru zaprimljena u DKOM 27.05.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi		
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4037	Ivanić Grad	OPKK 2014-2020	vidljivost - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi		
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4089	Vrbovec	31.12.2018.	151.383.610,12	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 29.04.2021.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4089	Vrbovec			OPKK 2014-2020	mreža (odvodni kolektor od UPOV-a do ispusta) - Odluka o poništenju objavljena 01.09.2021.	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4089	Vrbovec			OPKK 2014-2020	UPOV - otvaranje ponuda održano 15.03.2022.	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4089	Vrbovec			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 15.03.2021.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4089	Vrbovec			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 27.04.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4089	Vrbovec			OPKK 2014-2020	oprema - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4089	Vrbovec			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 15.11.2021.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4027	Dubrava	31.12.2023.		OPKK 2014-2020	odobren u projektu Vrbovec	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	101430	Gradec	31.12.2023.		OPKK 2014-2020	odobren u projektu Vrbovec	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4075	Sveti Ivan Zelina	31.12.2023.			u pripremi projekt Sveti Ivan Zelina - Brckovljani - Polonje - Paukovec	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	4018	Brckovljani	31.12.2023.	233.590.575,00		u pripremi projekt Sveti Ivan Zelina - Brckovljani - Polonje - Paukovec	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	101436	Polonje	31.12.2023.			u pripremi projekt Sveti Ivan Zelina - Brckovljani - Polonje - Paukovec	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	101437	Paukovec	31.12.2023.			u pripremi projekt Sveti Ivan Zelina - Brckovljani - Polonje - Paukovec	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	101441	Lipovec Lonjski	31.12.2023.	32.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
13	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	101127	Križ-Novoselec	31.12.2023.	90.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
13	VODE PISAROVINA d.o.o.	4064	Pisarovina	mala	10.497.800,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijskog sustava Donja Kupčina I. faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
13	VODE PISAROVINA d.o.o.	4064	Pisarovina	mala	210.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijskog sustava Donja Kupčina I. faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
13	VODE PISAROVINA d.o.o.	4064	Pisarovina	mala	7.375.117,34	NPOO	Sustavi odvodnje područja općine Pisarovina – I. Etapa podsustav donja Pisarovina	odobren	da	da, 15.02.2019.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
13	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	6011	Čazma	31.12.2023.	91.690.268,28			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
13	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	6050	Narta	mala	200.000,00	RP HV	Štefanje - izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
13	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	6011	Čazma	31.12.2023.	6.291.450,90	NPOO	Gradilište – Kanalizacija Berek	odobren	da	da, 05.03.2018.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	4040	Karlovac-Duga Resa	31.12.2018.	330.746.980,00	OPKK 2014-2020	Izgradnja linijskih objekata aglomeracije Karlovac-Duga Resa (5)	Odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	4040	Karlovac-Duga Resa			OPKK 2014-2020	Ugovor o radovima izgradnje Postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji postojećeg UPOV-a Karlovac-Duga Resa	Odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	4040	Karlovac-Duga Resa			OPKK 2014-2020	Ugovor o uslugama nadzora nad projektom	Odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	4040	Karlovac-Duga Resa			OPKK 2014-2020	Ugovor o uslugama upravljanja projektom te podrške u provedbi postupaka javne nabave i pravne podrške (3)	Odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	4040	Karlovac-Duga Resa			OPKK 2014-2020	Ugovor o isporuci specijaliziranih i radnih vozila i mjerne opreme za UPOV (2)	Odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	4040	Karlovac-Duga Resa			OPKK 2014-2020	Ugovor o uslugama osiguranja promidžbe i vidljivosti projekta	Odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	4040	Karlovac-Duga Resa	31.12.2018.	4.867.267,00	RP HV	Izgradnja kolektora u Vrazovoj ulici u Karlovcu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	4040	Karlovac-Duga Resa	31.12.2018.	35.000,00	RP HV	Izgradnja kolektora u Vrazovoj ulici u Karlovcu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
14	KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.	4040	Karlovac-Duga Resa	31.12.2018.	1.700.000,00	RP HV	Izgradnja sustava odvodnje Mrežnički Varoš	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
14	KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.	4040	Karlovac-Duga Resa	31.12.2018.	35.000,00	RP HV	Izgradnja sustava odvodnje Mrežnički Varoš	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	4040	Karlovac-Duga Resa	31.12.2018.	12.627.423,55	NPOO	Izgradnja sanitarne kanalizacije, rekonstrukcija mješovite kanalizacije i vodoopskrbe – državna cesta D6, dionica Stative-Borlin	odobren	da	da, 11.04.2022.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
14	KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.	4040	Karlovac-Duga Resa	31.12.2018.	4.662.987,84	NPOO	Izgradnja odvodnje Sv. Petar, Gorica i Šeketino Brdo u Dugoj Resi	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	4026	Draganić	31.12.2023.	54.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
14	KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.	4049	Krnjak	mala	164.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog kolektora na sustavu odvodnje naselja Krnjak	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
14	KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.	4049	Krnjak	mala	200.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju uređaja za pročišćavanje aglomeracije Krnjak	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
14	KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.	201111	Barilović	mala	4.904.000,00	RR	Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije, sustava za pročišćavanje otpadnih voda; mjesto ulaganja: Barilović i Donji Velemerić	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
14	KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.	201112	Donji Velemerić	mala	4.904.000,00	RR	Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije, sustava za pročišćavanje otpadnih voda; mjesto ulaganja: Barilović i Donji Velemerić	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	2003	Ogulin	31.12.2023.	169.368.000,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	2003	Ogulin	31.12.2023.	200.000,00	RP HV	Izrada idejnih i glavnih projekata preostalih naselja aglomeracije Ogulin	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	2003	Ogulin	31.12.2023.	496.682,24	RP HV	Izgradnja sustava za prihvat sadržaja septičkih jama	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	2003	Ogulin	31.12.2023.	19.000,00	RP HV	Izgradnja sustava za prihvata sadržaja septičkih jama	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	2003	Ogulin	31.12.2023.	1.500.000,00	RP HV	Unaprjeđenje mjerne opreme i procesa pročišćavanja na uređaju u Ogulinu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	ostalo
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	2002	Josipdol	31.12.2023.	50.400.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
14	KOMUNALAC d.o.o. Slunj	2007	Slunj	31.12.2023.	65.736.203,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
14	KOMUNALNO OZALJ d.o.o.	4062	Ozalj	mala	300.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje lijevog zaobalja Kupe.	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
14	KOMUNALNO OZALJ d.o.o.	4062	Ozalj	mala	2.753.000,00	RR	Sanitarna odvodnja otpadnih voda dijela sustava javne odvodnje s područja grada Ozlja	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
14	KOMUNALNO OZALJ d.o.o.	101385	Žakanje	mala	195.000,00	RP HV	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta aglomeracije Žakanje	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
14	KOMUNALNO OZALJ d.o.o.	101385	Žakanje	mala	200.000,00	RP HV	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta aglomeracije Žakanje	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
15	PRIVREDA d.o.o. Petrinja	4063	Petrinja	31.12.2018.	344.922.279,52	OPKK 2014-2020	28.02.2019. potpisan Ugovor za projektiranje i izgradnju UPOV-a.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
15	PRIVREDA d.o.o. Petrinja	4063	Petrinja	31.12.2018.	1.164.681,43	RP HV	Izrada projektne dokumentacije za vodnokomunalne građevine za javnu odvodnju na području grada Petrinje	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
15	PRIVREDA d.o.o. Petrinja	4063	Petrinja	31.12.2018.	47.500,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije spoja kolektora K7 i K14	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
15	PRIVREDA d.o.o. Petrinja	4063	Petrinja	31.12.2018.		FSEU	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području upravljanja otpadnim vodama (provodi se u okviru projekta vodoopskrbe)	17.01.2022.	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u izvođenju
15	PRIVREDA d.o.o. Petrinja	4053	Lekenik	31.12.2023.	286.073.122,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
15	VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	4031	Glina	31.12.2023.	136.465.000,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
15	VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	4031	Glina	31.12.2023.	464.196,50	RP HV	Izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u Ulici Ružičnjak	PLAN HV 2022.	da	da	da	da	da	u izvođenju
15	VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	4031	Glina	31.12.2023.	13.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u Ulici Ružičnjak	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
15	VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	4031	Glina	31.12.2023.	480.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u Ulici Pjera Križanića	PLAN HV 2022.	da	da	da	da	da	u izvođenju
15	VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	4031	Glina	31.12.2023.	13.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u Ulici Pjera Križanića	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
15	VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	4031	Glina	31.12.2023.	137.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta kolektora u Ulici Stjepana i Antuna Radića u Glini	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
15	VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	4031	Glina	31.12.2023.		FSEU	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području upravljanja otpadnim vodama – hitne mjere sanacije na području Grada Gline (provodi se u okviru projekta vodoopskrbe)	17.01.2022.	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u izvođenju

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
15	KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	4029	Dvor	31.12.2023.	54.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
15	JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	4035	Hrvatska Kostajnica	31.12.2023.	54.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
15	JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	4035	Hrvatska Kostajnica	mala	194.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta priključenja podsustava 'B' na podsustav 'A' sustava odvodnje Hrvatska Kostajnica	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
15	JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	4035	Hrvatska Kostajnica	mala	169.500,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta priključenja podsustava 'B' na podsustav 'A' sustava odvodnje Hrvatska Kostajnica	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
15	JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	4035	Hrvatska Kostajnica	mala		FSEU	Sanacija od potresa dijela kanalizacijske infrastrukture Grada Hrvatska Kostajnica (provodi se kroz projekt vodoopskrbe)	17.01.2022.	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u izvođenju
15	VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	4034	Hrvatska Dubica	mala	2.965.382,08	RP HV	Izgradnja kolektora 3 u Hrvatskoj Dubici	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
15	VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	4034	Hrvatska Dubica	mala	75.000,00	RP HV	Izgradnja kolektora 3 u Hrvatskoj Dubici	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
15	VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	4034	Hrvatska Dubica	mala	493.922,94	RP HV	Izgradnja priprema za kućne priključke	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
15	VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	4034	Hrvatska Dubica	mala	14.817,69	RP HV	Izgradnja priprema za kućne priključke	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
15	VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	4034	Hrvatska Dubica	mala	470.321,00	RP HV	Izgradnja sekundarne kanalizacije središta naselja	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
15	VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	4034	Hrvatska Dubica	mala	13.500,00	RP HV	Izgradnja sekundarne kanalizacije središta naselja	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
15	VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	4034	Hrvatska Dubica	mala	200.000,00	RP HV	Istražni radovi i prijedlog sanacije kolektora 1 u Hrvatskoj Dubici - 2 faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	ostalo
15	JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o.	4038	Jasenovac	mala	500.000,00	RP HV	Nastavak izgradnje priprema za kućne priključke - 2 faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
15	JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o.	4038	Jasenovac	mala	30.000,00	RP HV	Nastavak izgradnje priprema za kućne priključke - 2 faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
15	JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o.	4038	Jasenovac	mala	482.428,00	RP HV	Izmjena i izgradnja tlačnog voda na trasi glavnog kolektora	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
15	JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o.	4038	Jasenovac	mala	15.140,00	RP HV	Izmjena i izgradnja tlačnog voda na trasi glavnog kolektora	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
15	JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o.	4038	Jasenovac	mala	482.700,00	RP HV	Izgradnja CS glavnog voda	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
15	JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o.	4038	Jasenovac	mala	15.140,00	RP HV	Izgradnja CS glavnog voda	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
15	JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o.	4038	Jasenovac	mala	196.160,00	RP HV	Sanacija kolektora temeljem istražnih radova u užem središtu Jasenovca - 1 faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
15	JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o.	4038	Jasenovac	mala	5.925,00	RP HV	Sanacija kolektora temeljem istražnih radova u užem središtu Jasenovca - 1 faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUJA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUJA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
15	JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o.	4038	Jasenovac	mala	200.000,00	RP HV	Sanacija kolektora temeljem istražnih radova u užem središtu Jasenovca - 2 faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
15	JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o.	4038	Jasenovac	mala	6.000,00	RP HV	Sanacija kolektora temeljem istražnih radova u užem središtu Jasenovca - 2 faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
15	JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o.	4038	Jasenovac	mala	189.250,00	RP HV	Nastavak izrade idejnog i glavnog projekta uređaja za pročišćavanje s ciljem izmjene građevinske dozvole	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
15	JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o.	4038	Jasenovac	mala	195.800,00	RP HV	Nastavak izrade projekta verifikacije izvedenog stanja kanalizacije Jasenovac	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
15	VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o.	4080	Topusko	mala	191.900,00	RP HV	Novelacija idejnog i glavnog projekta Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Topusko – II. faza – kanalizacijska mreža	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
15	VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o.	4080	Topusko	mala	189.000,00	RP HV	Idejno rješenje prioriternih zahvata na sustavu odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Topusko i idejni projekt prioriternih zahvata na sustavu odvodnje	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
15	VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o.	4080	Topusko	mala	198.800,00	RP HV	Idejni i glavni projekt Odvodnja otpadnih voda naselja Velika Vranovina	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
16	SISAČKI VODOVOĐ d.o.o. Sisak	4071	Sisak	31.12.2018.	248.563.213,60	OPZO 2007-2013	1. faza projekta (programsko razdoblje 2007-2013)	Završeno						završeno
16	SISAČKI VODOVOĐ d.o.o. Sisak	4071	Sisak II	31.12.2018.	457.825.453,00	OPKK 2014-2020		u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
16	SISAČKI VODOVOĐ d.o.o. Sisak	4071	Sisak	31.12.2018.	1.527.170,00	RP HV	Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Ulici dr. Ive Pedišića	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
16	SISAČKI VODOVOĐ d.o.o. Sisak	4071	Sisak	31.12.2018.	17.400,00	RP HV	Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u Ulici dr. Ive Pedišića	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
16	SISAČKI VODOVOĐ d.o.o. Sisak	4071	Sisak	31.12.2018.	n/p	RP HV	Sufinanciranje otplatnih obroka kredita iskorištenih za građenje vodnih građevina na području aglomeracije Sisak	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	ostalo
16	SISAČKI VODOVOĐ d.o.o. Sisak	4071	Sisak	31.12.2018.		FSEU	Sanacije šteta neposredno poslije potresa na sustavu odvodnje Sisak (kroz projekt vodoopskrbe)	17.01.2022.	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u izvođenju
16	SISAČKI VODOVOĐ d.o.o. Sisak	4074	Sunja	31.12.2023.	61.200.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
17	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	4051	Kutina	31.12.2018.	390.731.724,93	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan - grupe A1 i A2 - 28.07.2020., grupa A3 - 12.10.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
17	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	4051	Kutina	31.12.2018.	390.731.724,93	OPKK 2014-2020	UPOV - Odluka o odabiru objavljena 19.05.2022.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
17	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	4051	Kutina	31.12.2018.	390.731.724,93	OPKK 2014-2020	uređaj za kondicioniranje - ugovor potpisan 12.08.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
17	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	4051	Kutina	31.12.2018.	390.731.724,93	OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 31.10.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
17	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	4051	Kutina	31.12.2018.	390.731.724,93	OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 18.01.2021. (grupa 1) , 28.05.2021. (grupa 2), 21.06.2021. (grupa 3)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
17	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	4051	Kutina	31.12.2018.	390.731.724,93	OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 20.02.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
17	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	4051	Kutina	31.12.2018.	390.731.724,93	OPKK 2014-2020	NUS - Odluka o poništenju objavljena 14.02.2022.	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
17	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	4051	Kutina			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 05.09.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
17	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	4066	Popovača	31.12.2023.	172.989.823,09		u pripremi projekt Popovača - Voloder	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
17	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	4088	Voloder	31.12.2023.			u pripremi projekt Popovača - Voloder	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
17	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	4066	Popovača	31.12.2023.	4.389.830,09	RP HV	Izgradnja sustava odvodnje na području Popovače - Ulica Slavka Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
17	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	4066	Popovača	31.12.2023.	69.900,00	RP HV	Izgradnja sustava odvodnje na području Popovače - Ulica Slavka Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
17	VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	4060	Novska			OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 14.01.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
17	VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	4060	Novska			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 08.04.2021.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
17	VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	4060	Novska			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 04.09.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
17	VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	4060	Novska	31.12.2020.	98.905.027,68	OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 11.12.2020. (grupa 1), 04.12.2020. (grupa 2), 03.12.2020. (grupa 3), 01.12.2020. (grupa 4)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
17	VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	4060	Novska			OPKK 2014-2020	upravljanje projektom - ugovor potpisan 14.01.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
17	VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	4060	Novska			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 11.07.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
17	VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	4072	Stara Subocka	mala	250.000,00	RP HV	Izgradnja priprema za kućne priključke na kanalizaciji Brestača-Nova Subocka	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
17	VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	4072	Stara Subocka	mala	142.500,00	RP HV		PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
17	VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	4072	Stara Subocka	mala	5.021.000,00	RR	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Brestača i Nova Subocka - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - 2.000 ES	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
17	LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	4054	Lipovljani	31.12.2023.	63.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
17	LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	4054	Lipovljani	31.12.2023.	192.500,00	RP HV	Izrada novelacije konceptijskog rješenja odvodnje naselja Krivaj, Piljenice i Kraljeva Velika	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	n/p	n/p	n/p	projektiranje
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6064	Požega			OPKK 2014-2020	mreža - 3 ugovora potpisana 22.05.2019. - sva 3 ugovora završena; ishodne sve uporabne dozvole	odobren	da	da	da	da	da	završeno
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6064	Požega			OPKK 2014-2020	UPOV (dogradnja) - ugovor potpisan 05.03.2020.; građ. Dozvola ishodena 02/22 u tijeku radovi	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6064	Požega	31.12.2018.	171.777.186,90	OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 11.02.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6064	Požega			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 15.10.2019. - oprema isporučena	odobren	da	da	da	da	da	završeno
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6064	Požega			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 07.12.2018.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUJA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUJA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6064	Požega	31.12.2018.	798.906,65	RP HV	Izgradnja prelivnog kolektora u Zagrebačkoj ulici	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6064	Požega	31.12.2018.	37.040,00	RP HV	Izgradnja prelivnog kolektora u Zagrebačkoj ulici	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6064	Požega	31.12.2018.	3.438.059,48	NPOO	Kanalizacijska mreža u ulici Jagodnjak u Požegi	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6061	Pleternica	31.12.2020.	141.426.792,10	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 30.10.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6061	Pleternica			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 22.10.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6061	Pleternica			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 11.02.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6061	Pleternica			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 15.10.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6061	Pleternica			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 22.03.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6045	Kutjevo	31.12.2023.	110.236.472,50		u pripremi projekt Kutjevo - Velika	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6089	Velika	31.12.2023.			u pripremi projekt Kutjevo - Velika	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6040	Kaptol	31.12.2023.	48.600.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6040	Kaptol	mala	600.095,09	RP HV	Izgradnja odvodnje u Vetovačkoj ulici (gravitacijski i tlačni cjevovod s crpnom stanicom)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6040	Kaptol	mala	27.900,00	RP HV	Izgradnja odvodnje u Vetovačkoj ulici (gravitacijski i tlačni cjevovod s crpnom stanicom)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
18	TEKIJA d.o.o. Požega	4022	Čaglin	mala	146.000,00	RP HV	Izgradnja crpne stanice CS2 u naselju Čaglin	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
18	TEKIJA d.o.o. Požega	4022	Čaglin	mala	4.000,00	RP HV	Izgradnja crpne stanice CS2 u naselju Čaglin	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
18	TEKIJA d.o.o. Požega	6023	Eminovci	mala	2.563.000,00	RR	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Ramanovci; Općina Kaptol; Ramanovci	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
18	TEKIJA d.o.o. Požega	101464	Bertelovci	mala	2.822.000,00	RR	Vodovodna i kanalizacijska mreža naselja Tekić; Općina Jakšić; Tekić	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
18	TEKIJA d.o.o. Požega	101117	Brodski Drenovac	mala	8.870.098,10	NPOO	Sustav odvodnje naselja Brodski Drenovac – Bučje – Zagrađe	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
18	VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	6047	Lipik-Pakrac	31.12.2018.	153.546.408,40	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 29.01.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
18	VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	6047	Lipik-Pakrac			OPKK 2014-2020	UPOV (nadogradnja) - ugovor potpisan 17.05.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
18	VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	6047	Lipik-Pakrac			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 02.08.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
18	VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	6047	Lipik-Pakrac			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 25.10.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
18	VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	6047	Lipik-Pakrac			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 16.01.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
18	VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	6047	Lipik-Pakrac			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 30.11.2018.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
18	VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	101476	Marino Selo	mala	199.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Marino Selo	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
19	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	6051	Nova Gradiška	31.12.2018.	17.661.526,06	OPZO 2007-2013	1. faza projekta (programsko razdoblje 2007-2013)	završeno						završeno
19	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	6051	Nova Gradiška	31.12.2018.	125.507.952,04	OPKK 2014-2020	2. faza projekta (programsko razdoblje 2014-2020).	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
19	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	6055	Okučani	31.12.2018.	1.391.617,30	NPOO	Izgradnja II. faze kanalizacije naselja Okučani	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
19	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	6055	Okučani	31.12.2023.	69.839.415,00		u pripremi projekt Okučani - Staro Petrovo Selo	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
19	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	6081	Staro Petrovo Selo	31.12.2023.	240.369.580,00		u pripremi projekt Okučani - Staro Petrovo Selo	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
19	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	6002	Batrina	31.12.2023.				u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
19	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	6013	Davor	31.12.2023.	47.700.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
19	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	6058	Orubica	mala	11.042.049,51	NPOO	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda naselja Orubica	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
20	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	6077	Slavonski Brod	31.12.2018.	225.355.428,00	OPZO 2007-2013	mreža i UPOV	završeno						završeno
20	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	6024	Garčin	31.12.2023.			u pripremi projekt Garčin - Brodski Stupnik - Donji Andrijevi	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
20	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	6009	Brodski Stupnik	31.12.2023.	500.225.522,52		u pripremi projekt Garčin - Brodski Stupnik - Donji Andrijevi	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
20	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	6016	Donji Andrijevi	31.12.2023.			u pripremi projekt Garčin - Brodski Stupnik - Donji Andrijevi	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
20	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	6057	Oriovac	31.12.2023.			u pripremi projekt Oriovac - Beravci - Gundinci - Slavonski šamac - Vrpolje	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
20	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	6006	Beravci	31.12.2023.			u pripremi projekt Oriovac - Beravci - Gundinci - Slavonski šamac - Vrpolje	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
20	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	6031	Gundinci	31.12.2023.	497.713.000,00		u pripremi projekt Oriovac - Beravci - Gundinci - Slavonski šamac - Vrpolje	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
20	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	6079	Slavonski šamac	31.12.2023.			u pripremi projekt Oriovac - Beravci - Gundinci - Slavonski šamac - Vrpolje	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
20	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	6099	Vrpolje	31.12.2023.			u pripremi projekt Oriovac - Beravci - Gundinci - Slavonski šamac - Vrpolje	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
20	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	6077	Slavonski Brod	31.12.2018.	40.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije prespajanja ispusta u Savu na kolektor na šetalištu u Slavonskom Brodu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
20	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	6077	Slavonski Brod	31.12.2018.	200.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije kanalizacijskih kolektora (Cesarčeva, Starčevića) u Slavonskom Brodu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
20	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	6077	Slavonski Brod	31.12.2018.	72.000,00	RP HV	Izrada idejnog projekta za proširenje mreže javne odvodnje u naselju Brodski Varoš	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta		
20	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	6077	Slavonski Brod	31.12.2018.	98.600,00	RP HV	Izrada idejnog projekta za proširenje mreže javne odvodnje u naselju Brodsko Vinogorje	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje		
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7050	Vinkovci	31.12.2018.	384.560.952,11	OPKK 2014-2020	NVV 03 2018 Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje u aglomeraciji Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju		
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7050	Vinkovci			OPKK 2014-2020	NMV 05 2018 Dogradnja UPOV-a Jošine (Vinkovci), Ivankovo, Otok, Cerna i izgradnja kišnih preljevnih spremnika	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7050	Vinkovci			OPKK 2014-2020	Usluge nadzora nad provedbom projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo"	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7050	Vinkovci			OPKK 2014-2020	Ugovor o isporuci opreme za održavanje sustava odvodnje	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7050	Vinkovci			OPKK 2014-2020	Ugovor o ulugama informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanju kapaciteta	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7034	Otok (Vinkovci)			31.12.2023.	OPKK 2014-2020	odobren unutar projekta Vinkovci	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7029	Ivankovo			31.12.2023.	OPKK 2014-2020	odobren unutar projekta Vinkovci	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7021	Cerna			31.12.2023.	OPKK 2014-2020	odobren unutar projekta Vinkovci	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7050	Vinkovci			31.12.2018.	5.195.923,36	RP HV	Rekonstrukcija i dogradnja kanalizacijske mreže u Vinkovcima I.faza – 1,1 km (H.D.Genschera, Stanka Vraza i druge ulice)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7050	Vinkovci	31.12.2018.	102.000,00	RP HV	Rekonstrukcija i dogradnja kanalizacijske mreže u Vinkovcima I.faza – 1,1 km (H.D.Genschera, Stanka Vraza i druge ulice)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor		
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7050	Vinkovci	31.12.2018.	2.000.000,00	RP HV	Rekonstrukcija i dogradnja kanalizacijske mreže u Vinkovcima II.faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju		
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7050	Vinkovci	31.12.2018.	40.000,00	RP HV	Rekonstrukcija i dogradnja kanalizacijske mreže u Vinkovcima II.faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor		
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7071	Nuštar	31.12.2023.	358.922.993,32		u pripremi projekt Nuštar - Jarmina	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi		
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7061	Jarmina	31.12.2023.			u pripremi projekt Nuštar - Jarmina	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi		
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7016	Babina Greda	31.12.2023.			u pripremi projekt Babina Greda - Vođinci	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi		
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7051	Vođinci	31.12.2023.	174.601.174,00		u pripremi projekt Babina Greda - Vođinci	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi		
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7031	Nijemci	31.12.2023.	237.600.000,00		u pripremi projekt Nijemci - Novi Jankovci - Vrbanja	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi		
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7032	Novi Jankovci	31.12.2023.			u pripremi projekt Nijemci - Novi Jankovci - Vrbanja	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi		

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
21	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	7052	Vrbanja	31.12.2023.			u pripremi projekt Nijemci - Novi Jankovci - Vrbanja	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
21	KOMUNALAC d.o.o. Županja	7053	Županja	31.12.2018.	20.179.766,14	OPZO 2007-2013	1. faza projekta (programsko razdoblje 2007-2013)	završeno						završeno
21	KOMUNALAC d.o.o. Županja	7053	Županja	31.12.2018.	56.817.385,96	OPKK 2014-2020	2. faza projekta (programsko razdoblje 2014-2020).	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
21	KOMUNALAC d.o.o. Županja	7026	Gradište	31.12.2023.	91.675.154,00		u pripremi projekt Gradište - Bošnjaci	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
21	KOMUNALAC d.o.o. Županja	7020	Bošnjaci	31.12.2023.			u pripremi projekt Gradište - Bošnjaci	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
21	KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja	7027	Gunja	31.12.2023.	208.118.986,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
21	DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci	7040	Rajevo Selo	31.12.2023.	54.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
22	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	7081	Vukovar	31.12.2018.	52.593.712,00	OPZO 2007-2013	1. faza projekta (programsko razdoblje 2007-2013)	završeno						završeno
22	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	7081	Vukovar	31.12.2018.	314.144.301,00	OPKK 2014-2020	2. faza projekta (programsko razdoblje 2014-2020). Projekt odobren.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
22	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	7081	Vukovar	31.12.2018.	1.897.650,00	RP HV	Opremanje crpnih stanica na području grada Vukovara	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
22	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	7081	Vukovar	31.12.2018.	32.000,00	RP HV	Opremanje crpnih stanica na području grada Vukovara	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
22	KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	7060	Ilok	31.12.2023.	50.725.546,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
22	KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	7060	Ilok	31.12.2018.	2.026.226,54	NPOO	Rekonstrukcija sustava odvodnje u Ulici Stjepana Radića	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
22	KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	7065	Lovas	mala	194.500,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije UPOV-a Lovas u Opatovcu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
23	ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč	101444	Lanterna	31.12.2018.	224.078.529,20	OPZO 2007-2013	1. faza projekta (programsko razdoblje 2007-2013)	završeno						završeno
23	ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč	1095	Poreč-Sjever	31.12.2018.		OPZO 2007-2013	1. faza projekta (programsko razdoblje 2007-2013)	završeno						završeno
23	ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč	1094	Poreč-Jug	31.12.2018.		OPZO 2007-2013	1. faza projekta (programsko razdoblje 2007-2013)	završeno						završeno
23	ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč	1169	Vrsar	31.12.2018.		OPZO 2007-2013	1. faza projekta (programsko razdoblje 2007-2013)	završeno						završeno
23	ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč	101444	Lanterna	31.12.2018.	286.542.747,00	OPKK 2014-2020	2. faza projekta (programsko razdoblje 2014-2020). Projekt odobren.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
23	ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč	1095	Poreč-Sjever	31.12.2018.		OPKK 2014-2020	2. faza projekta (programsko razdoblje 2014-2020). Projekt odobren.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
23	ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč	1094	Poreč-Jug	31.12.2018.		OPKK 2014-2020	2. faza projekta (programsko razdoblje 2014-2020). Projekt odobren.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
23	ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč	1169	Vrsar	31.12.2018.		OPKK 2014-2020	2. faza projekta (programsko razdoblje 2014-2020). Projekt odobren.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
23	ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč	1094	Poreč Jug	31.12.2018.	1.034.171,74	NPOO	Izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Ladrovići s priključenjem na postojeći kanalizacijski kolektor Baderna – Žbandaj	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija Dokumentacija o nabavi	Status projekta		
23	ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. Rovinj	101105	Rovinj	31.12.2018.	223.862.868,00	OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 22.07.2020.	odobren	da	da	da	da	u izvođenju		
23	ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. Rovinj	101105	Rovinj	31.12.2018.	1.160.287,80	NPOO	Rekonstrukcija i razdjeljivanje mješovite sanitarne odvodnje ulica V.Š.Paje, M.Macana i M.Maretića	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
23	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	1156	Umag	31.12.2018.	445.355.470,66	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 18.08.2020. (grupe 1 i 2), 03.05.2021.(grupa 3)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
23	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	1156	Umag			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 21.10.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
23	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	1156	Umag			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 03.12.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
23	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	1156	Umag			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 29.05.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
23	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	1156	Umag			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 10.07.2019..	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
23	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	1156	Umag			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 29.05.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
23	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	1076	Novigrad Istarski			31.12.2018.	OPKK 2014-2020	odobren unutar projekta Umag	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
23	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	1076	Novigrad Istarski			31.12.2018.	634.677,40	RP HV	Izgradnja sanitarne kanalizacije 'BIKOKERE - sjever'	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da
23	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	1076	Novigrad Istarski	31.12.2018.	2.766.000,00	RR	Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije Bužinija	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
23	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	3024	Buje	31.12.2023.	173.412.399,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
23	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	3024	Buje	31.12.2023.	181.700,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje na području naselja Buroli	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
23	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	3024	Buje	31.12.2023.	42.250,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje na području naselja Kršete	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
23	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	1156	Umag	31.12.2018.	1.949.902,00	NPOO	Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Jeci s crpnom stanicom	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
23	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	1156	Umag	31.12.2018.	1.006.870,66	NPOO	Izgradnja kanalizacijskog sustava dijela naselja Petrovija s crpnom stanicom Petrovija II	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3099	Pazin	31.12.2023.	843.245.800,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3099	Pazin	31.12.2023.	11.408.000,00	RR	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za III grupu malih naselja LINDAR, Grad Pazin; Lindar	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3099	Pazin	31.12.2023.	5.448.730,67	NPOO	Izgradnja kanalizacijskog kolektora naselja Rijavac u Pazinu	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3074	Lupoglav Istarski	mala	1.786.540,56	NPOO	Izgradnja kanalizacijskog kolektora i UPOVa u naselju Lupoglav, Općina Lupoglav	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3003	Žminj	mala	198.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sanacije UPOV-a Žminj	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3028	Cerovlje	mala	149.400,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica na području Općine Cerovlje	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUJA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUJA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3028	Cerovlje	mala	200.270,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica na području Općine Cerovlje	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3043	Gračišće	mala	199.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava na području naselja Mandalenčići II faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3043	Gračišće	mala	150.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava na području naselja Mandalenčići III faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3124	Tinjan	mala	199.900,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Tinjan I faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3124	Tinjan	mala	199.900,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Tinjan II faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3124	Tinjan	mala	190.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Muntrilj I faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3124	Tinjan	mala	198.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Muntrilj I faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3124	Tinjan	mala	194.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda starogradske jezgre Tinjana	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3143	Karobjba	mala	194.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava naselja Karobjbe na području Općine Karobjba I faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	3143	Karobjba	mala	148.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava Kamena Vas na području Općine Karobjba II faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
23	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	101096	Motovun	mala	200.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Brkač	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
23	PARK ODVODNJA D.O.O. Buzet	3026	Buzet	31.12.2023.	131.145.117,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
23	PARK ODVODNJA D.O.O. Buzet	3026	Buzet	31.12.2023.	555.915,45	NPOO	Izgradnja sustava sanitarne odvodnje Franečići – Žeina i stručni nadzor	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
23	KANFANAR ODVODNJA d.o.o. Kanfanar	3056	Kanfanar	31.12.2023.	8.968.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
23	USLUGA VIŠNJAN d.o.o.	101099	Višnjani	mala	464.301,50	RP HV	Izgradnja fekalne kanalizacije Kadore-Rov	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
23	USLUGA VIŠNJAN d.o.o.	101099	Višnjani	mala	9.286,00	RP HV	Izgradnja fekalne kanalizacije Kadore-Rov	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
23	IVS d.o.o. Buzet	3045	Grimalda	mala	3.311.000,00	RR	Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda za II. Grupu malih naselja u Istarskoj županiji - fekalna kanalizacija naselja Podmeja-Cerje-Grimalda	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
23	IVS d.o.o. Buzet	201121	Mandalenčići	mala	3.947.000,00	RR	Odvodnja otpadnih voda naselja Mandalenčići - kolektorska mreža; Općina Gračišće; Mandalenčići	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
23	IVS d.o.o. Buzet	201131	Ritošin Brig	mala	3.937.000,00	RR	Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije Ritošin brig	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
24	PRAGRANDE d.o.o. Pula	1107	Pula-Centar	31.12.2018.	671.154.917,00			u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi
24	PRAGRANDE d.o.o. Pula	1108	Pula-Sjever	31.12.2020.	345.843.963,13			u pripremi	da	da	n/p	n/p	n/p	u pripremi
24	PRAGRANDE d.o.o. Pula	1108	Pula-Sjever	31.12.2020.	55.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sanitarne odvodnje na području naselja Valbandon (Općina Fažana) - ulica Pineta I., II. i III. Geodetske usluge za potrebe izrade projektne dokumentacije sanitarne odvodnje na području naselja Valbandon (Općina Fažana) - ulica Pineta I, II i III.	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
24	PRAGRANDE d.o.o. Pula	1108	Pula-Sjever	31.12.2020.	28.681,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sanitarne odvodnje na području naselja Valbandon (Općina Fažana) - ulica Pineta I., II. i III. Geodetske usluge za potrebe izrade projektne dokumentacije sanitarne odvodnje na području naselja Valbandon (Općina Fažana) - ulica Pineta I, II i III.	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
24	PRAGRANDE d.o.o. Pula	1012	Brijuni	mala	320.000,00	RP HV	Izrada studijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih i oborinskih voda područja Nacionalni park Brijuni.	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
24	PRAGRANDE d.o.o. Pula	1107	Pula Centar	31.12.2018.	855.441,32	NPOO	Izgradnja dijela sustava odvodnje unutar grada Pule – Katarina-Monumenti	odobren	da	da, 16.05.2019.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
24	ALBANEŽ d.o.o. Pomer	1066	Medulin	31.12.2018.	1.312.459,92	NPOO	Izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Medulin - Burle	odobren	da	da, 14.06.2017.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
24	ALBANEŽ d.o.o. Pomer	1066	Medulin	31.12.2018.	287.500,00	RP HV	Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu naselja Medulin - kanal Smrikve	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
24	ALBANEŽ d.o.o. Pomer	1066	Medulin	31.12.2018.	8.625,00	RP HV	Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu naselja Medulin - kanal Smrikve	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
24	ALBANEŽ d.o.o. Pomer	1066	Medulin	31.12.2018.			u pripremi projekt Medulin - Banjole - Prementura	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
24	ALBANEŽ d.o.o. Pomer	1001	Banjole	31.12.2023.	296.303.339,20		u pripremi projekt Medulin - Banjole - Prementura	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
24	ALBANEŽ d.o.o. Pomer	1101	Premantura	31.12.2023.			u pripremi projekt Medulin - Banjole - Prementura	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
24	ALBANEŽ d.o.o. Pomer	1001	Banjole	31.12.2023.	501.400,00	RP HV	Izgradnja sanitarne odvodnje dijela naselja Banjole, ulica Volme	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
24	ALBANEŽ d.o.o. Pomer	1001	Banjole	31.12.2023.	15.042,00	RP HV	Izgradnja sanitarne odvodnje dijela naselja Banjole, ulica Volme	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
24	VODOVOD LABIN D.O.O. Labin	3068	Labin	31.12.2020.			u pripremi projekt Labin - Rabac - Raša	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
24	VODOVOD LABIN D.O.O. Labin	1112	Rabac	31.12.2023.	620.828.371,00		u pripremi projekt Labin - Rabac - Raša	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
24	VODOVOD LABIN D.O.O. Labin	1113	Raša	31.12.2023.			u pripremi projekt Labin - Rabac - Raša	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
24	VODOVOD LABIN D.O.O. Labin	3068	Labin	31.12.2020.	4.032.000,00	RR	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Marceljani sa spojem na sustav Labin	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
24	IVS d.o.o. Buzet	201141	Sveti Bartul-Vicani	mala	5.583.000,00	RR	Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za IV-A grupu malih naselja - sanitarna kanalizacija naselja Vicani, Općina Raša, Sveti Bartul	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
24	IVS d.o.o. Buzet	201142	Loborika	mala	12.055.000,00	RR	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja - Loborika, Općina Marčana	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka	31.12.2018.	1.761.563.462,00	OPKK 2014-2020	Izgradnja sustava odvodnje: Komponenta A. Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka Zapad	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Izgradnja sustava odvodnje: Komponenta B. Izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka Istok	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Izgradnja sustava odvodnje: Komponenta C. Proširenje Rijeka	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Izgradnja sustava odvodnje: Komponenta D. Proširenje Kastav	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Izgradnja sustava odvodnje: Komponenta E. Proširenje Viškovo	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Izgradnja sustava odvodnje: Komponenta F. Proširenje Čavle	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Izgradnja sustava odvodnje: Komponenta G. Proširenje Jelenje	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Radovi sa Hrvatskim cestama faza 1 - Keršimirova ulica	odobren	da	da	da	da	da	da	završeno
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Radovi sa Hrvatskim cestama faza 2 - Adamićeva ulica	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Radovi sa Županijskom upravom za ceste - cesta Mladenići-Ronjgi	odobren	da	da	da	da	da	da	završeno
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Radovi sa Županijskom upravom za ceste - rotor Viškovo	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Radovi sa Gradom Rijeka - Rekonstrukcija ulice Vjekoslava Dukića	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Nabava opreme: Oprema za održavanje sustava odvodnje	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Nabava opreme: NUS sustav	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka	OPKK 2014-2020	Nabava opreme: Male crpne stanice	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi		

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Nadzor radova: Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Nadzor radova: Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Rijeka	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Nadzor radova sa Hrvatskim cestama 1 faza	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Nadzor radova sa Županijskom upravom za ceste	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Upravljanje projektom	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka			OPKK 2014-2020	Informiranje javnosti o projektu i vidljivost projekta	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1045	Kostrena	31.12.2023.	400.000.000,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1046	Kraljevica	31.12.2023.	229.898.711,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1045	Kostrena	31.12.2023.	3.186.200,00	RP HV	Projektiranje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sustava Bakra	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1045	Kostrena	31.12.2023.	29.859.883,97	RP HV	Projektiranje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sustava Bakra	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka	31.12.2018.	n/p	RP HV	Troškovi kredita	PLAN HV 2022.	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	ostalo
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka	31.12.2018.	2.392.307,79	NPOO	Crpna stanica sanitarnih otpadnih voda CS Brajdica - Pećine	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
25	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	1116	Rijeka	31.12.2018.	411.085,62	NPOO	Kanalizacijski ogranak Gorica	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
25	LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	1081	Opatija-Lovran	31.12.2018.			u pripremi projekt Opatija - Lovran - Mošćenička Draga	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi
25	LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	1070	Mošćenička Draga	31.12.2023.	590.633.835,00		u pripremi projekt Opatija - Lovran - Mošćenička Draga	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi
25	LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	1081	Opatija-Lovran	31.12.2018.	5.906.120,90	NPOO	Izvođenje radova na izgradnji sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
25	LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	201140	Brseč	mala	6.311.000,00	RR	Izgradnja kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
25	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2163	Delnice	31.12.2023.	24.080.086,95	SD	Delnice faza 3	završeno	pnp	pnp	da	da	da	završeno
25	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2163	Delnice	31.12.2023.	28.576.000,00	SD	UPOV Delnice	završeno	pnp	pnp	da	da	da	završeno
25	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2178	Fužine	31.12.2023.	20.642.116,35	SD	Fužine - grupa 1 - Fužine i Vrata	odobren	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
25	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2178	Fužine	31.12.2023.	26.941.408,99	SD	Fužine - grupa 2 - Lič	odobren	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
25	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2178	Fužine	31.12.2023.	7.962.981,00	SD	UPOV Fužine	odobren	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
25	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2155	Brod Moravice	mala	9.425.367,40	SD	Brod Moravice mreža	odobren	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
25	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2155	Brod Moravice	mala	7.811.201,00	SD	UPOV Brod Moravice	odobren	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
25	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2236	Mrkopalj	mala	6.200.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijske mreže kolektora K10, K10.G, K10.T, K11, K12.G, K12.T, K13, K14, K16, K17 i K21 u Mrkoplju	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
25	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2236	Mrkopalj	mala	180.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijske mreže kolektora K10, K10.G, K10.T, K11, K12.G, K12.T, K13, K14, K16, K17 i K21 u Mrkoplju	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
25	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2260	Ravna Gora	mala	1.000.000,00	RP HV	Izgradnja kolektora Suhi Vrh - Ravna Gora	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
25	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2260	Ravna Gora	mala	48.000,00	RP HV	Izgradnja kolektora Suhi Vrh - Ravna Gora	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
25	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2260	Ravna Gora	mala	400.000,00	RP HV	Završetak izgradnje kanalizacijskih kolektora SJO Ravna Gora prva faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
25	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2260	Ravna Gora	mala	20.000,00	RP HV	Završetak izgradnje kanalizacijskih kolektora SJO Ravna Gora prva faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
25	VODE VRBOVSKO d.o.o.	2283	Vrbovsko	mala	1.536.701,50	RP HV	Izrada tehničke i projektne dokumentacije i izgradnja sustava javne odvodnje naselja Vrbovsko	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
25	VODE VRBOVSKO d.o.o.	2283	Vrbovsko	mala	2.118.379,81	RP HV	Izgradnja dijela sustava javne odvodnje naselja Vrbovsko - DIO I	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
25	VODE VRBOVSKO d.o.o.	2283	Vrbovsko	mala	59.200,00	RP HV	Izgradnja dijela sustava javne odvodnje naselja Vrbovsko - DIO I	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
25	VODE VRBOVSKO d.o.o.	2283	Vrbovsko	mala	30.000,00	RP HV	Recenzija projektne i natječajne dokumentacije	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
26	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1047	Krk	31.12.2018.	510.913.257,00	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 21.09.2017.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
26	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1047	Krk			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 08.10.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
26	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1047	Krk			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 23.08.2017.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
26	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1047	Krk			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 31.08.2017.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
26	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1047	Krk			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 31.08.2017.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
26	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1047	Krk			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 22.12.2020. (grupa 1), 11.12.2020. (grupa 2, 5), 08.12.2020. (grupa 4), 14.12.2020. (grupa 6), 14.04.2021. (grupa 3), 16.04.2021. (grupa 7)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
26	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1061	Malinska-Njivice			31.12.2020.	OPKK 2014-2020	odobren unutar projekta Krk	odobren	da	da	da	da	da
26	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1109	Punat	31.12.2023.	OPKK 2014-2020	odobren unutar projekta Krk	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUJA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUJA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta		
26	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1080	Omišalj	31.12.2023.		OPKK 2014-2020	odobren unutar projekta Krk	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju		
26	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1003	Baška	31.12.2023.		OPKK 2014-2020	odobren unutar projekta Krk	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
26	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1020	Klimno-Šilo	31.12.2023.		OPKK 2014-2020	odobren unutar projekta Krk	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
26	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1167	Vrbnik	mala	1.724.906,72	NPOO	Izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Vrbnik I.-a faza	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
26	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	1017	Cres	31.12.2023.	387.020.156,00	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 15.07.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
26	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	1017	Cres			OPKK 2014-2020	mreža (Nerezine) - Odluka o odabiru objavljena 12.05.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	da	u pripremi
26	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	1017	Cres			OPKK 2014-2020	UPOV (Cres, M. Lošinj, V. Lošinj) - ugovor potpisan 03.09.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
26	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	1017	Cres			OPKK 2014-2020	UPOV (Martinšćica i Nerezine) - Odluka o odabiru objavljena 12.05.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
26	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	1017	Cres			OPKK 2014-2020	oprema - otvaranje ponuda održano 27.06.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	da	u pripremi
26	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	1017	Cres			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 22.01.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
26	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	1017	Cres			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 04.09.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
26	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	1017	Cres			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 22.09.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
26	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	1064	Martinšćica			31.12.2023.	OPKK 2014-2020	dio projekta Cres - Mali Lošinj - Veli Lošinj - Martinšćica - Nerezine.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
26	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	1072	Nerezine			31.12.2023.	OPKK 2014-2020	dio projekta Cres - Mali Lošinj - Veli Lošinj - Martinšćica - Nerezine.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
26	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	1060	Mali Lošinj	31.12.2020.	OPKK 2014-2020	dio projekta Cres - Mali Lošinj - Veli Lošinj - Martinšćica - Nerezine.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju		
26	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	201139	Orlec	mala	5.358.000,00	RR	Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Orlec na otoku Cresu; Grad Cres; Orlec	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	da	u izvođenju	
26	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	201120	Unije	mala	3.846.824,58	NPOO	Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda otoka Unije – dio 1. faze	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1018	Crikvenica	31.12.2018.	367.636.276,28	OPKK 2014-2020	Aktivnost Projekta br. 1 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1018	Crikvenica	31.12.2018.		OPKK 2014-2020	Aktivnost Projekta br. 2 - KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA S CRPNOM STANICOM I VODOOPSKRBNA MREŽA SUSTAVA NOVI VINODOLSKI - CJEVOVODI U SKLOPU NAUTIČKE MARINE	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1018	Crikvenica	31.12.2018.		OPKK 2014-2020	Aktivnost Projekta br. 3 - PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I PUŠTANJE U RAD UPOV-A, POSTROJENJA ZA SUŠENJE MULJA I GLAVNIH TRANSPORTNIH CRPNIH STANICA	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1018	Crikvenica	31.12.2018.	367.636.276,28	OPKK 2014-2020	Aktivnost Projekta br. 4.1 - NABAVA OPREME (Grupa 1)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1018	Crikvenica	31.12.2018.		OPKK 2014-2020	Aktivnost Projekta br. 4.2 - NABAVA OPREME (Grupa 2)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1018	Crikvenica	31.12.2018.		OPKK 2014-2020	Aktivnost Projekta br. 4.3 - NABAVA OPREME (Grupa 3)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1018	Crikvenica	31.12.2018.		OPKK 2014-2020	Aktivnost Projekta br. 5 - NADZOR RADOVA	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1018	Crikvenica	31.12.2018.		OPKK 2014-2020	Aktivnost Projekta br. 6 - NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA I KOORDINATOR II ZAŠTITE NA RADU - KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA S CRPNIM STANICAMA I VODOOPSKRBNA MREŽA SUSTAVA NOVI VINODOLSKI - CJEVOVODI U SKLOPU NAUTIČKE MARINE	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1018	Crikvenica	31.12.2018.		OPKK 2014-2020	Aktivnost Projekta br. 7 - USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM (vanjski dio)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1018	Crikvenica	31.12.2018.		OPKK 2014-2020	Aktivnost Projekta br. 7 - USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM (unutranja jedinica - administrator)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1018	Crikvenica	31.12.2018.		OPKK 2014-2020	Aktivnost Projekta br. 8 - USLUGE INFORMIRANJA, JAČANJA VIDLJIVOSTI I OSNAŽIVANJA KAPACITETA U PROVEDBI PROJEKTA	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1018	Crikvenica	31.12.2018.		OPKK 2014-2020	Aktivnost Projekta br. 9 - Imovinsko – pravni odnosi	odobren	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u izvođenju
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1075	Novi Vinodolski	31.12.2023.		367.636.276,28	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 16.03.2020.	odobren	da	da	da	da	da
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1075	Novi Vinodolski		OPKK 2014-2020		UPOV - otvaranje ponuda održano 12.01.2022.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1075	Novi Vinodolski		OPKK 2014-2020		nadzor - ugovor potpisan 13.12.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1075	Novi Vinodolski		OPKK 2014-2020		oprema - ugovor potpisan 11.12.2020. (grupe 1 i 2), 12.05.2021. (grupa 3)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1075	Novi Vinodolski		OPKK 2014-2020		upravljanje - ugovor potpisan 24.03.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1075	Novi Vinodolski		OPKK 2014-2020		vidljivost - ugovor potpisan 30.10.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1031	Jadranovo	31.12.2023.	117.973.460,00			U pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
27	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	1038	Klenovica	31.12.2023.	213.194.262,00			U pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
28	KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	1074	Novalja	31.12.2018.	248.353.489,69	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 05.05.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
28	KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	1074	Novalja			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 22.12.2021.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
28	KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	1074	Novalja			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 01.04.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
28	KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	1074	Novalja			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 04.08.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
28	KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	1074	Novalja			OPKK 2014-2020	oprema - otvaranje ponuda održano 17.01.2022. (grupe 1, 2 i 3)	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
28	KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	1074	Novalja			OPKK 2014-2020	oprema - otvaranje ponuda održano 11.04.2022. (grupa 4)	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
28	KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	1074	Novalja			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 15.07.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
28	VRELO d.o.o. Rab	1111	Rab	31.12.2018.			u pripremi projekt Rab - Supetarska Draga - Lopar	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
28	VRELO d.o.o. Rab	1142	Supetarska Draga	31.12.2023.	522.383.979,00		u pripremi projekt Rab - Supetarska Draga - Lopar	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
28	LOPARKO d.o.o. Lopar	1052	Lopar	31.12.2023.			u pripremi projekt Rab - Supetarska Draga - Lopar	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
28	KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	1086	Pag	31.12.2023.			u pripremi projekt Pag - Poveljana - Mandre	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
28	VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	1099	Poveljana	31.12.2023.	400.000.000,00		u pripremi projekt Pag - Poveljana - Mandre	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
28	KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	101057	Mandre	31.12.2023.			u pripremi projekt Pag - Poveljana - Mandre	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
28	KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	1086	Pag	31.12.2023.	2.270.312,54	NPOO	Izgradnja kanalizacijske crpne stanice CS3 Jadran, s pripadajućim gravitacijskim kolektorima Ulice Golija u Pagu	odobren	da	da, 12.5.2022.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
28	LOPARKO d.o.o. Lopar	1052	Lopar	31.12.2023.	932.005,00	RP HV	Izgradnja kolektora u Loparu ogranak dijela Dražica	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
28	LOPARKO d.o.o. Lopar	1052	Lopar	31.12.2023.	26.880,00	RP HV	Izgradnja kolektora u Loparu ogranak dijela Dražica	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
28	VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	1099	Poveljana	31.12.2023.	500.000,00	RP HV	Sanacija kanalizacijskog sustava fekalne odvodnje, 3. faza sanacije	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
28	VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	1099	Poveljana	31.12.2023.	20.000,00	RP HV	Sanacija kanalizacijskog sustava fekalne odvodnje, 3. faza sanacije	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
28	VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	1099	Poveljana	31.12.2023.	1.392.000,00	RR	Rekonstrukcija i modernizacija UPOV-a Poveljana	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
28	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	1123	Senj	31.12.2023.	1.669.623,00	RP HV	Izgradnja sanitarnog kolektora	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
28	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	1123	Senj	31.12.2023.	26.980.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
28	CRNO VRILO d.o.o. Karlobag	1036	Karlobag	31.12.2023.	35.200.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
29	KOMUNALAC d.o.o. Otočac	2245	Otočac	31.12.2023.	71.790.873,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
29	KOMUNALAC d.o.o. Otočac	201127	Donji Babin Potok	mala	4.031.198,63	NPOO	Izgradnja III. faze kanalizacijskog sustava naselja Donji Babin Potok	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
29	VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	2005	Plitvička jezera	31.12.2023.	199.500,00	RP HV	Nastavak izrade tehničke dokumentacije za lokacijsku i građevinsku dozvolu sanitarne kanalizacije Jezerce	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
29	VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	2005	Plitvička jezera	31.12.2023.	309.730.848,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
29	USLUGA d.o.o. Gospić	2186	Gospić	31.12.2023.	228.270.193,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
29	USLUGA d.o.o. Gospić	2246	Perušić	mala	496.010,00	RP HV	Radovi na zamjeni uređaja za pročišćavanje fekalnih otpadnih voda u industrijskoj zoni u Perušiću	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
29	USLUGA d.o.o. Gospić	2246	Perušić	mala	9.920,20	RP HV	Radovi na zamjeni uređaja za pročišćavanje fekalnih otpadnih voda u industrijskoj zoni u Perušiću	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
29	USLUGA d.o.o. Gospić	2246	Perušić	mala	1.998.109,62	RP HV	Izgradnja kanalizacijskog sustava na području naselja Kvarte	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
29	USLUGA d.o.o. Gospić	2246	Perušić	mala	45.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijskog sustava na području naselja Kvarte	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
30	ODVODNJA d.o.o. Zadar	1171	Zadar - Petržane	31.12.2018.	453.641.772,00	OPKK 2014-2020	Linijske građevine četvrti Bokanjac	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
30	ODVODNJA d.o.o. Zadar	1171	Zadar - Petržane			OPKK 2014-2020	Linijske građevine grada Zadra	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
30	ODVODNJA d.o.o. Zadar	1171	Zadar - Petržane			OPKK 2014-2020	Linijske građevine četvrti Put Bokanjca i aglomeracije Petržane	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
30	ODVODNJA d.o.o. Zadar	1171	Zadar - Petržane			OPKK 2014-2020	Dogradnja UPOV-a Centar	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
30	ODVODNJA d.o.o. Zadar	1171	Zadar - Petržane			OPKK 2014-2020	Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
30	ODVODNJA d.o.o. Zadar	1171	Zadar - Petržane			OPKK 2014-2020	Upravljanje projektom - vanjski stručnjaci	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
30	ODVODNJA d.o.o. Zadar	1171	Zadar - Petržane			OPKK 2014-2020	Nabava opreme	odobren	da	da	da	da	da	da	završeno
30	ODVODNJA d.o.o. Zadar	1171	Zadar - Petržane			OPKK 2014-2020	Promidžba i vidljivost	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
30	ODVODNJA d.o.o. Zadar	1115	Ražanac	31.12.2023.	1.445.519.680,59		u pripremi projekt Novigradski zaljev	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
30	ODVODNJA d.o.o. Zadar	1096	Posedarje	31.12.2023.			u pripremi projekt Novigradski zaljev	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
30	ODVODNJA d.o.o. Zadar	1134	Starigrad Zadarski	31.12.2023.			u pripremi projekt Novigradski zaljev	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
30	ODVODNJA d.o.o. Zadar	2126	Škabrnja	31.12.2023.				u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
30	ODVODNJA d.o.o. Zadar	1171	Zadar	31.12.2018.	15.382.588,18	NPOO	Izgradnja kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Sinjoretovo u gradu Zadru	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
30	ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o. Bibinje	101390	Bibinje-Sukošan	31.12.2020.	294.410.930,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
30	OTOK UGLJAN d.o.o. Preko	1155	Ugljan	31.12.2023.	140.140.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
30	OTOK UGLJAN d.o.o. Preko	1100	Preko	31.12.2023.	177.547.599,86		u pripremi projekt Preko - Kali	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
30	ODVODNJA Kali d.o.o. Kali	1034	Kali	31.12.2023.			u pripremi projekt Preko - Kali	u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi	
30	VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	1073	Nin	31.12.2020.	438.889.847,44	OPKK 2014-2020	Projektiranje i izgradnja UPOV-a Grgur za 26.000 ES i drugi stupanj pročišćavanja - ugovor potpisan 4.11.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
30	VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	1073	Nin			OPKK 2014-2020	Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
30	VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	1073	Nin			OPKK 2014-2020	Promidžba i vidljivost - ugovor potpisan 16.5.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
30	VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	1073	Nin			OPKK 2014-2020	Izgradnja sustava odvodnje i crpnih stanica, izgradnja podmorskog ispusta, sanacija vodovodne mreže zbog izgradnje sustava odvodnje - ugovor potpisan 14.2.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
30	VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	1073	Nin			OPKK 2014-2020	Usluga nadzora nad ugovorima o radovima - ugovor potpisan 19.2.2019.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
30	VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	1073	Nin			OPKK 2014-2020	Upravljanje projektom i administracija - VANJSKO Predmetna nabava pokriva upravljanje projektom na dvije aglomeracije NPV I Vir - ugovor potpisan 15.5.2020.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
30	VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	1163	Vir	31.12.2020.	744.753.614,00			u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi
30	VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	1163	Vir	31.12.2020.	34.074.839,77	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže i fekalnih kanala	odobren	da	da, 18.05.2018.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
30	GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	2045	Gračac	31.12.2023.				u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
30	ODVODNJA NOVIGRAD d.o.o.	1077	Novigrad Zadarski	mala	120.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije dijela sustava odvodnje za naselje Gajine u Novigradu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
30	ODVODNJA NOVIGRAD d.o.o.	1077	Novigrad Zadarski	mala	499.800,00	RP HV	Sanacija crpnih stanica i UPOV-a na sustavu odvodnje i pročišćavanja, 2. faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
30	ODVODNJA NOVIGRAD d.o.o.	1077	Novigrad Zadarski	mala	12.000,00	RP HV	Sanacija crpnih stanica i UPOV-a na sustavu odvodnje i pročišćavanja, 2. faza	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
30	ZEMUNIK ODVODNJA d.o.o.	2141	Zemunik Donji	mala	243.000,00	RP HV	Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 'Zemunik'	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
30	ZEMUNIK ODVODNJA d.o.o.	2141	Zemunik Donji	mala	7.000,00	RP HV	Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 'Zemunik'	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
30	ZEMUNIK ODVODNJA d.o.o.	2141	Zemunik Donji	mala	5.164.325,88	NPOO	Izgradnja glavnih kolektora odvodnje naselja Zemunik Donji - Centar	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
31	KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	1006	Biograd	31.12.2018.	547.649.724,00			u pripremi	da	da	da	da	da	u pripremi
31	KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	1006	Biograd	31.12.2018.	4.972.000,00	RR	Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije - Pakoštone, Drage; Ulaganje u kupnju opreme i strojeva koji su sastavni dio projekta, uključujući hardver i softver za kanalizacijski sustav	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
31	KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	1087	Pašman	31.12.2023.	268.230.809,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
31	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	2011	Benkovac	31.12.2023.				u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
31	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	2011	Benkovac	31.12.2023.	3.941.249,88	RP HV	Izgradnja kanalizacijskog spoja Benkovačko Selo - Benkovac	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
31	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	2011	Benkovac	31.12.2023.	185.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijskog spoja Benkovačko Selo - Benkovac	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1124	Šibenik	31.12.2018.	397.025.090,00	OPKK 2014-2020	MREŽA - završeno, ishođene uporabne dozvole	Odobren	da	da	da	da	da	završeno
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1124	Šibenik			OPKK 2014-2020	UPOV - 28.06.2022. objavljeno prethodno savjetovanje koje traje do 11.07.2022.	Odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1124	Šibenik			OPKK 2014-2020	postrojenje za sušenje mulja - u pripremi novi natječaj	Odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1124	Šibenik			OPKK 2014-2020	OPREMA	Odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1124	Šibenik			OPKK 2014-2020	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	Odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1124	Šibenik			OPKK 2014-2020	NADZOR	Odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1124	Šibenik			OPKK 2014-2020	USLUGE - SUSTAV UPRAVLJANJA GUBICIMA	Odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1124	Šibenik			OPKK 2014-2020	UPRAVLJANJE PROJEKTOM	Odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1124	Šibenik	31.12.2018.	194.000,00	RP HV	Idejni i glavni projekt za ishođenje lokacijske dozvole sustava odvodnje otpadnih voda naselja Jadrija na području grada Šibenika	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1124	Šibenik	31.12.2018.	200.000,00	RP HV	Idejni i glavni projekt za ishođenje lokacijske dozvole sustava odvodnje otpadnih voda naselja Jadrija na području grada Šibenika	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1124	Šibenik	31.12.2018.	200.000,00	RP HV	Idejni i glavni projekt za sustav odvodnje od Posjetiteljskog centra 'Kanal Sv. Ante' do naselja Zablaće	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1124	Šibenik	31.12.2018.	n/p	RP HV	Građenje vodnih građevina sustava javne odvodnje u Šibeniku (podsustav Ražine Dornje i Ražine Donje, zona Ražine i poslovna zona Podi)- otplata kredita EBRD	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	ostalo
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1165	Vodice I	31.12.2018.	30.388.036,77	OPZO 2007-2013	1. faza projekta (programsko razdoblje 2007-2013)	završeno						završeno
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1165	Vodice I		84.233.985,37	OPKK 2014-2020	2. faza projekta (programsko razdoblje 2014-2020). Projekt odobren.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1165	Vodice II		383.344.695,00	OPKK 2014-2020		u pripremi						u pripremi
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1165	Vodice	31.12.2018.	3.200.060,00	RP HV	Izgradnja dijela 'mreže' sustava odvodnje na području Vodica u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 od jugoistočnog upornjaka nadvožnjaka kod 1. ulaza u grad iz smjera Zadra do skretanja za objekt 'Hacienda' u Vodicama u duljini cca 1.700 m	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1165	Vodice	31.12.2018.	128.000,00	RP HV	Izgradnja dijela 'mreže' sustava odvodnje na području Vodica u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 od jugoistočnog upornjaka nadvožnjaka kod 1. ulaza u grad iz smjera Zadra do skretanja za objekt 'Hacienda' u Vodicama u duljini cca 1.700 m	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1005	Betina-Murter	31.12.2023.	124.691.413,00	OPKK 2014-2020	mreža - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1005	Betina-Murter			OPKK 2014-2020	UPOV - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1005	Betina-Murter			OPKK 2014-2020	nadzor - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1005	Betina-Murter			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 16.03.2022.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1005	Betina-Murter			OPKK 2014-2020	vidljivost - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1088	Pirovac-Tisno-Jezera	31.12.2020.	401.515.104,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	1117	Rogoznica	31.12.2023.	190.329.370,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
32	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	101471	Bilice	31.12.2023.	66.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
32	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	1039	Knin	31.12.2020.	119.144.721,20	OPZO 2007-2013		završeno						završeno
32	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	1039	Knin	31.12.2020.	199.995,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije CS Bare i alternativnog dovodnog cjevovoda do UPOV-a	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
32	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	1039	Knin	31.12.2020.	2.448.640,00	RP HV	Sanacija kanalizacije u Vukovarskoj ulici, sanacija kanalizacijskog i oborinskog kolektora u Jovićevoj ulici, izgradnja fekalnog kolektora Ušće na Cesarićevoj obali, izgradnja i prespajanje postojećih vodovodnih priključaka na izgrađenu mrežu vodovoda i uključujući i naselje Mediči iz Projekta IPA	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
32	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	1039	Knin	31.12.2020.	199.000,00	RP HV	Sanacija kanalizacije u Vukovarskoj ulici, sanacija kanalizacijskog i oborinskog kolektora u Jovićevoj ulici, izgradnja fekalnog kolektora Ušće na Cesarićevoj obali, izgradnja i prespajanje postojećih vodovodnih priključaka na izgrađenu mrežu vodovoda i uključujući i naselje Mediči iz Projekta IPA	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
32	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	101498	Golubić	mala	579.000,00	RP HV	Izrada studijsko-projektne dokumentacije izgradnje novog UPOV-a Golubić i dovoda do UPOV-a	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
32	RAD d.o.o. Drniš	1022	Drniš	31.12.2023.	49.020.000,00	ISPA		Završeno						završeno
32	RAD d.o.o. Drniš	1022	Drniš	31.12.2023.	750.000,00	RP HV	Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Krš u Drnišu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
32	RAD d.o.o. Drniš	1022	Drniš	31.12.2023.	30.000,00	RP HV	Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Krš u Drnišu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
32	PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o. Primošten	101294	Primošten	31.12.2023.	169.649.094,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
32	USLUGA d.o.o. Vrlika	1168	Vrlika	mala	493.290,03	RP HV	Izgradnja UPOV-a radne zone Kosore	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
32	USLUGA d.o.o. Vrlika	1168	Vrlika	mala	14.850,00	RP HV	Izgradnja UPOV-a radne zone Kosore	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
32	USLUGA d.o.o. Vrlika	1168	Vrlika	mala	481.973,96	RP HV	Izgradnja fekalnog kolektora u južnom nogostupu državne ceste D1 na području grada Vrlike	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin	31.12.2018.	1.419.408.482,10	OPKK 2014-2020	Radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže naselja Srinjine (Ugovor 0A)	Odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin			OPKK 2014-2020	Stručni nadzora nad radovima izgradnje sekundarne mreže naselja Srinjine (Ugovor 0B)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin			OPKK 2014-2020	Spoj sustava odvodnje južnog sliva na CUPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč (Ugovor 1)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin			OPKK 2014-2020	Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica i Korešnica (Ugovor 2)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin			OPKK 2014-2020	Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva sa rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita (Ugovor 3)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin			OPKK 2014-2020	Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje (Ugovor 4)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin			OPKK 2014-2020	SDNU i regulacija dovoda vode izvorište Jadro – CS Ravne Njive (Ugovor 5)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin			OPKK 2014-2020	Projektiranje i dogradnja CUPOV-a Stupe 275.000 ES (Ugovor 6)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin			OPKK 2014-2020	Nabava opreme za održavanje mreže (Ugovor 7) Za ovaj paket nabave predviđena je jedna nabava sa više lotova/ugovora.	Odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin			OPKK 2014-2020	Stručni nadzor nad radovima izgradnje na području aglomeracije Split-Solin osim naselja Srinjine (Ugovor 8)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin			OPKK 2014-2020	Tehnička pomoć za pripremu programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži (Ugovor 10)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin			OPKK 2014-2020	Upravljanje projektom i administracija (vanjsko osoblje JPP-a)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin			OPKK 2014-2020	Promidžba i vidljivost (Ugovor 9)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin (Dugopolje)			31.12.2018.	OPKK 2014-2020	odobren unutar projekta Split-Solin	odobren	da	da	da	da	da	da
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin (Klis)	31.12.2018.	OPKK 2014-2020	odobren unutar projekta Split-Solin	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin (Podstrana)	31.12.2018.	OPKK 2014-2020	odobren unutar projekta Split-Solin	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin	31.12.2018.	180.000,00	RP HV	Izrada idejnog projekta sustava odvodnje otpadnih voda područja kod Instituta za oceanografiju i ribarstvo na Marjanu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin	31.12.2018.	118.600,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije kanalizacijske mreže predjela Srinjine - Put Bilaja i Put Gaja (idejni i glavni projekt)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin	31.12.2018.	35.000,00	RP HV	Izrada (novelacija) glavnog projekta odvodnje otpadnih voda obalnog područja predjela Strožanac u Podstrani, dionica: Hotel Lav – Lučica Strožanac	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin	31.12.2018.	1.144.076,37	RP HV	Izgradnja dijela sustava odvodnje otpadnih voda općine Podstrana (područje Miljevac)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin	31.12.2018.	20.500,00	RP HV	Izgradnja dijela sustava odvodnje otpadnih voda općine Podstrana (područje Miljevac)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin	31.12.2018.	4.875.210,18	NPOO	Vodoopskrbni cjevovodi i kanalizacijski kolektori u Dugopolju	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1131	Split-Solin	31.12.2018.	5.472.162,60	NPOO	Vodoopskrbni i kanalizacijski sustav naselja Rupotina i Put stare Salone u Solinu	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1136	Stomorska	mala	122.000,00	RP HV	Projektiranje sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Stomorska	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1136	Stomorska	mala	6.801.160,32	RP HV	Izgradnja kanalizacije otpadnih voda naselja Stomorska	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1136	Stomorska	mala	149.500,00	RP HV	Izgradnja kanalizacije otpadnih voda naselja Stomorska	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1063	Marina	31.12.2023.	354.200.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	101396	Vinišće	31.12.2023.				nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	2078	Muč	31.12.2023.	118.800.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir	31.12.2018.	1.151.030.595,12	OPKK 2014-2020	Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području Grada Kaštela (južno od glavne ceste D8 do mora); (Paket 1 - Tender 1)	Odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir			OPKK 2014-2020	Izgradnja dijela mreže vodoopskrbe i odvodnje na području Kaštela(sjeverno od glavne ceste: Sućurac, Gomilica, Kambelovac) i grada Trogira (Plano); (Paket 1 - Tender 0)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir			OPKK 2014-2020	Izgradnja sekundarne i vodovodne mreže na području Grada Trogira (Paket 1 - Tender 2)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir			OPKK 2014-2020	Nadogradnja CUPOV-a DIVULJE (Paket 1 - Tender 3)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir			OPKK 2014-2020	Nadzor nad gradnjom 1. paketa ugovora (Paket 1 - Tender 5)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir			OPKK 2014-2020	Usluge SDNU (Paket 1 - Tender 4)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir			OPKK 2014-2020	Upravljanje projektom - vanjsko (Paket 1 - Tender 6)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir			OPKK 2014-2020	Vidljivost projekta (Paket 1 - Tender 7)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir			OPKK 2014-2020	Arheološki radovi (Paket 1 - Tender 8)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta		
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir			OPKK 2014-2020	Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbne mreže Podstav Kaštela, Trogir, Seget, Okrug, Slatine - 4 lota (Paket 2 - Tender 1)	Odobren	da	da	da	da	da	u pripremi		
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir			OPKK 2014-2020	Projektiranje i izgradnja UPOV-a ČIOVO (Paket 2 - Tender 2)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir			OPKK 2014-2020	Nabava opreme (Paket 2 - Tender 3)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir			OPKK 2014-2020	Usluge izrade i poboljšanje baze podataka (Paket 2 - Tender 4)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir			OPKK 2014-2020	Nadzor nad gradnjom 2. paketa ugovora (Paket 2 - Tender 5)	Odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi	
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	201118	Čiovo			31.12.2018.	OPKK 2014-2020	odobren unutar projekta Kaštela-Trogir	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	201118	Čiovo	31.12.2018.	5.862.137,16	NPOO	Dio kanalizacijskog sustava na području Čiova	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno		
33	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1037	Kaštela-Trogir	31.12.2018.	5.465.780,26	NPOO	Dodatna kanalizacijska mreža Grada Kaštela	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno		
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1126	Sinj	31.12.2018.	302.669.801,30	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 19.11.2021. (grupa 1)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju		
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1126	Sinj			OPKK 2014-2020	mreža - Odluka o odabiru objavljena 08.09.2021. (grupa 3)	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1126	Sinj			OPKK 2014-2020	mreža - otvaranje ponuda održano 21.01.2021. (grupa 2)	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi	
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1126	Sinj			OPKK 2014-2020	UPOV (nadogradnja) - ugovor potpisan 24.11.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1126	Sinj			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 04.09.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1126	Sinj			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 18.08.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju	
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1126	Sinj			OPKK 2014-2020	oprema 1 - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi	
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1126	Sinj			OPKK 2014-2020	oprema 2 - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi	
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1126	Sinj			OPKK 2014-2020	oprema 3 - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi	
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1126	Sinj			OPKK 2014-2020	ostalo, priključci	odobren	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1126	Sinj			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 27.08.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	101321	Otok			31.12.2023.	80.218.156,08	OPKK 2014-2020	mreža Otok-Dicmo - ugovor u realizaciji (potpisan 06.08.2021.)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	101321	Otok	OPKK 2014-2020	oprema - nabava u pripremi			odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	101321	Otok			OPKK 2014-2020	modernizacija upravljanja - nabava u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	101321	Otok			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor u realizaciji (potpisan 22.09.2020.)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	101321	Otok			OPKK 2014-2020	imovinsko-pravni poslovi - u realizaciji	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	101321	Otok			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor u realizaciji (potpisan 18.08.2020.)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	101321	Otok			OPKK 2014-2020	promidžba i vidljivost - ugovor u realizaciji (potpisan 27.08.2020.)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1150	Trilj			OPKK 2014-2020	mreža Trilj - ugovor u realizaciji (potpisan 28.10.2020.)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1150	Trilj			OPKK 2014-2020	UPOV Trilj (nadogradnja) - ugovor u realizaciji (potpisan 17.05.2022.)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1150	Trilj			OPKK 2014-2020	oprema - nabava u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1150	Trilj	31.12.2023.	112.508.787,40	OPKK 2014-2020	modernizacija upravljanja - nabava u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1150	Trilj			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor u realizaciji (potpisan 22.09.2020.)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1150	Trilj			OPKK 2014-2020	imovinsko-pravni poslovi - u realizaciji	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1150	Trilj			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor u realizaciji (potpisan 18.08.2020.)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1150	Trilj			OPKK 2014-2020	promidžba i vidljivost - ugovor u realizaciji (potpisan 27.08.2020.)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	101358	Dicmo	31.12.2023.		OPKK 2014-2020	dio projekta Otok-Dicmo - ugovor u realizaciji (potpisan 06.08.2021.)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	2051	Hrvace	mala	4.500.000,00	RP HV	Izgradnja Ispusta iz UPOV-a u rijeku Cetinu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	2051	Hrvace	mala	100.000,00	RP HV	Izgradnja Ispusta iz UPOV-a u rijeku Cetinu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	2051	Hrvace	mala	50.000,00	RP HV	Izgradnja Ispusta iz UPOV-a u rijeku Cetinu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	2051	Hrvace	mala	69.000,00	RP HV	Izrada dokumentacije za nadmetanje za nabavu radova na izgradnji UPOV-a Hrvace	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	ostalo
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	2051	Hrvace	mala	193.800,00	RP HV	Izrada Glavnog projekta za dio Kanalizacijskog sustava Općine Hrvace - podustav Rumin	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
34	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	2051	Hrvace	mala	200.000,00	RP HV	Izrada Idejnog i glavnog projekta sekundarne mreže Kanalizacijskog sustava Općine Hrvace	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
35	VODOVOD d.o.o. Omiš	1079	Omiš	31.12.2023.	155.500.543,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
35	VODOVOD d.o.o. Omiš	101296	Dugi Rat	31.12.2023.	177.235.092,63			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
35	VODOVOD d.o.o. Omiš	101359	Mimice	31.12.2023.	23.256.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
36	HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	101207	Jelsa-Vrboska	31.12.2020.	378.933.698,00		OPKK 2014-2020 mreža - ugovor potpisan 30.07.2020. (grupe 1, 2 i 3)	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
36	HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	101207	Jelsa-Vrboska				OPKK 2014-2020 UPOV - ugovor potpisan 18.06.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
36	HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	101207	Jelsa-Vrboska				OPKK 2014-2020 oprema - otvaranje ponuda 06.07.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
36	HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	101207	Jelsa-Vrboska				OPKK 2014-2020 nadzor - ugovor potpisan 02.09.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
36	HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	101207	Jelsa-Vrboska				OPKK 2014-2020 upravljanje - ugovor potpisan 29.11.2019.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
36	HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	101207	Jelsa-Vrboska				OPKK 2014-2020 vidljivost - ugovor potpisan 10.08.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
36	HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	1137	Sučuraj				mala	5.820.019,73	NPOO	Izgradnja fekalne kanalizacije južnog dijela općine Sućuraj	odobren	u postupku	u postupku	da	da
36	ODVODNJA HVAR d.o.o. Hvar	1027	Hvar	31.12.2023.	200.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
36	VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1141	Supetar	31.12.2023.	32.908.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
36	VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1008	Bol	31.12.2023.	19.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
36	VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1144	Sutivan	31.12.2023.	6.992.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
36	VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1097	Postira	31.12.2023.	12.008.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
36	VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1068	Milna	31.12.2023.	21.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
36	VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1097	Postira	31.12.2023.	4.446.000,00	RR	Izgradnja kanalizacijskog kolektora Dol - Postira; Općina Postira; Dol; Postira	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
36	VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1098	Povlja	mala	1.088.000,00	RR	Kanalizacija u ulicama Niz vrh sela i Put Mainca u Povljima	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
36	VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1141	Supetar	31.12.2023.	3.558.006,99	NPOO	Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže u ulicama Tina Ujevića i 22. lipnja u Supetru	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
36	VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	201123	Murvica (Bol)	mala	7.841.760,33	NPOO	Izgradnja kanalizacijskog sustava Murvica	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
36	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	1042	Komiža	31.12.2023.	173.800.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
36	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	1042	Komiža	31.12.2023.	10.615.154,09	NPOO	Radovi na kanalizacijskom sustavu grada Komiže od CS-2 do podmorskog ispusta	odobren	da	da, 27.05.2022.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
36	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	1164	Vis	31.12.2023.	242.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađena aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
36	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	1164	Vis	31.12.2023.	75.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog kolektora uz rekonstrukciju bujičnog kanala Samogor u gradu Visu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
36	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	1164	Vis	31.12.2023.	475.000,00	RP HV	Sanacija dijela obalnih kolektora u Gradu Visu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
36	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	1164	Vis	31.12.2023.	25.000,00	RP HV	Sanacija dijela obalnih kolektora u Gradu Visu	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
37	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	2052	Imotski	31.12.2018.	231.014.071,75	OPKK 2014-2020	LOT 1 - Područje 1 – grad Imotski	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi	
37	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	2052	Imotski			OPKK 2014-2020	LOT 2 - Područje 2 - Glavina donja – Zapad, Proložac i Postranje	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
37	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	2052	Imotski			OPKK 2014-2020	LOT 3 -Područje 3 - Glavina Donja – Istok, Medvidovića Draga, Donji Vinjani	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
37	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	2052	Imotski			OPKK 2014-2020	LOT 4 -Vodoopskrba	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
37	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	2052	Imotski			OPKK 2014-2020	Nadogradnja UPOV Imotski	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
37	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	2052	Imotski			OPKK 2014-2020	Oprema za održavanje sustava javne odvodnje	odobren	da	da	da	da	da	da	završeno
37	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	2052	Imotski			OPKK 2014-2020	Oprema NUS I GIS	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
37	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	2052	Imotski			OPKK 2014-2020	Usluge stručnog nadzora	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
37	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	2052	Imotski			OPKK 2014-2020	Upravljanje projektom - Eksterno osoblje	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
37	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	2052	Imotski			OPKK 2014-2020	Promidžba i vidljivost	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
37	VODOVOD d.o.o. Makarska	1058	Makarska	31.12.2020.	239.357.976,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
37	VODOVOD d.o.o. Makarska	1010	Brela	31.12.2023.	343.623.000,00		u pripremi projekt Makarsko primorje	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
37	VODOVOD d.o.o. Makarska	1004	Baška Voda	31.12.2023.			u pripremi projekt Makarsko primorje	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
37	VODOVOD d.o.o. Makarska	1153	Tučepi	31.12.2023.			u pripremi projekt Makarsko primorje	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
37	VODOVOD d.o.o. Makarska	1092	Podgora	31.12.2023.			u pripremi projekt Makarsko primorje	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
37	VODOVOD d.o.o. Makarska	101495	Promajna-Krvavica	31.12.2023.			u pripremi projekt Makarsko primorje	u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
37	VODOVOD d.o.o. Makarska	1175	Živogošće	31.12.2023.		44.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
37	VODOVOD d.o.o. Makarska	1023	Drvenik	31.12.2023.	165.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
37	VODOVOD d.o.o. Makarska	1092	Podgora	31.12.2023.	1.083.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske te građevinskih dozvola za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda naselja Živogošće Porat - Igrane	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
38	METKOVIĆ d.o.o. Metković	1067	Metković	31.12.2018.	358.929.889,00	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 01.02.2021.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
38	METKOVIĆ d.o.o. Metković	1067	Metković			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 20.04.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
38	METKOVIĆ d.o.o. Metković	1067	Metković			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 23.12.2021. (grupa 1), 28.12.2021. (grupa 2)	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
38	METKOVIĆ d.o.o. Metković	1067	Metković			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 10.09.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
38	METKOVIĆ d.o.o. Metković	1067	Metković			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 31.01.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
38	METKOVIĆ d.o.o. Metković	1067	Metković			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 06.04.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
38	IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	1089	Ploče	31.12.2023.	199.275.528,58	OPKK 2014-2020	mreža - ugovor potpisan 17.03.2021.	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
38	IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	1089	Ploče			OPKK 2014-2020	UPOV - ugovor potpisan 30.11.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
38	IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	1089	Ploče			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 08.05.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
38	IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	1089	Ploče			OPKK 2014-2020	upravljanje - ugovor potpisan 06.10.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
38	IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	1089	Ploče			OPKK 2014-2020	oprema - ugovor potpisan 26.04.2021. (grupa 1, grupa 2), 10.06.2021. (grupa 3)	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
38	IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	1089	Ploče			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 31.07.2020.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
38	IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	1025	Gradac	31.12.2023.	53.600.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
38	IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	1041	Komin	mala	1.736.500,00	RP HV	Izrada projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (sa sanacijom postojećeg vodoopskrbnog sustava) na području aglomeracije Komin (naselja Komin i Banja)	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
38	KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	2137	Vrgorac	31.12.2023.	29.032.000,00	ISPA		završeno						završeno	
38	KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	2137	Vrgorac	31.12.2023.	298.945,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Dusina	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
38	KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	2137	Vrgorac	31.12.2023.	16.255.740,55	RP HV	Rekonstrukcija i dogradnja transportnog sustava odvodnje od radne zone 'Ravča' do sustava odvodnje Grada Vrgorca (sa sanacijom kolničke konstrukcije punog profila državne ceste DC62 i ugradnjom kablenskog raspleta 20 kV iz TS 110/20(10) KV 'Vrgorac' prema GZ Ravča), nadzor i upravljanje	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
38	KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	2137	Vrgorac	31.12.2023.	1.000.000,00	RP HV	Rekonstrukcija i dogradnja transportnog sustava odvodnje od radne zone 'Ravča' do sustava odvodnje Grada Vrgorca (sa sanacijom kolničke konstrukcije punog profila državne ceste DC62 i ugradnjom	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	


Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
							kabelskog raspleta 20 kV iz TS 110/20(10) KV "Vrgorac" prema GZ Ravča), nadzor i upravljanje							
38	KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	2137	Vrgorac	31.12.2023.	328.900,00	RP HV	Rekonstrukcija i dogradnja transportnog sustava odvodnje od radne zone 'Ravča' do sustava odvodnje Grada Vrgorca (sa sanacijom kolničke konstrukcije punog profila državne ceste DC62 i ugradnjom kabelskog raspleta 20 kV iz TS 110/20(10) KV "Vrgorac" prema GZ Ravča), nadzor i upravljanje	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
38	KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	2137	Vrgorac	31.12.2023.	73.200,00	RP HV	Izrada glavnog projekta automatske rešetke na UPOV-u grada Vrgorca	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
38	ODVODNJA Opuzen d.o.o. Opuzen	1082	Opuzen	31.12.2023.	209.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
38	ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina	1082	Opuzen	31.12.2023.	200.000,00	RP HV	Izrada idejnih i glavnih projekata dijela sekundarne kanalizacije i sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Opuzen	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
38	ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina	1082	Opuzen	31.12.2023.	350.000,00	RP HV	Geotehnički istražni radovi i izrada geotehničkih elaborata lokacije UPOV-a aglomeracije Opuzen	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
38	ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina	1062	Malostonski zaljev	31.12.2023.	902.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema
38	ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina	1062	Malostonski zaljev	31.12.2023.	156.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta za ishođenje Lokacijske dozvole za sekundarnu mrežu na području naselja Klek, Repić, Radalj, Duboka te Komarna	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
38	ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina	1062	Malostonski zaljev	31.12.2023.	200.000,00	RP HV	Izrada idejnog i glavnog projekta za ishođenje Lokacijske dozvole za sekundarnu mrežu na području naselja Klek, Repić, Radalj, Duboka te Komarna	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
38	ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina	1062	Malostonski zaljev	31.12.2023.	50.000,00	RP HV	Izrada Elaborata zaštite okoliša za sustav odvodnje dijela Općine Slivno koji se priključuje na ROS Komarna-Neum-Mljetski kanal (području naselja Klek, Repić, Radalj, Duboka te Komarna) sa sekundarnom mrežom	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
38	ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina	1062	Malostonski zaljev	31.12.2023.	6.714.414,51	NPOO	Izgradnja kanalizacijskog podsustava: „Duboka – Klek – Neum“ dionica: „Duboka – Klek“	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
38	ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina	1062	Malostonski zaljev	31.12.2023.	5.680.216,94	NPOO	Dovršetak kanalizacijskog sustava općine Slivno: Kanalizacijski podustav Komarna: II faza izgradnje – dionica CS Komarna – Duboka i dovršetak dionice u naselju Komarna	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
38	ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina	1062	Malostonski zaljev	31.12.2023.	35.724.285,08	NPOO	Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Opuzen - dio uz kanal Mala Neretva	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno
38	ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina	101370	Blace	mala	200.000,00	RP HV	Izrada izmjene glavnog projekta dijela kanalizacijske mreže, Izrada idejnog projekta UPOV-a i natječajne dokumentacije, Izrada elaborata zaštite okoliša	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta
38	ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina	101370	Blace	mala	200.000,00	RP HV	Izrada izmjene glavnog projekta dijela kanalizacijske mreže, Izrada idejnog projekta UPOV-a i natječajne dokumentacije, Izrada elaborata zaštite okoliša	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
38	ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina	101370	Blace	mala	40.000,00	RP HV	Izrada izmjene glavnog projekta dijela kanalizacijske mreže, Izrada idejnog projekta UPOV-a i natječajne dokumentacije, Izrada elaborata zaštite okoliša	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
39	KOMUNALAC D.O.O. Vela Luka	101058	Vela Luka	31.12.2020.	96.205.010,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
39	KOMUNALAC D.O.O. Vela Luka	101058	Vela Luka	31.12.2023.	3.600.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijskih cjevovoda i crpne stanice	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
39	KOMUNALAC D.O.O. Vela Luka	101058	Vela Luka	31.12.2023.	70.000,00	RP HV	Izgradnja kanalizacijskih cjevovoda i crpne stanice	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
39	VODOVOD d.o.o. Blato	1007	Blato	31.12.2023.	187.815.393,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
39	VODOVOD d.o.o. Blato	1130	Smokvica-Brna	31.12.2023.				u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
39	VODOVOD d.o.o. Blato	1007	Blato	31.12.2023.	3.780.000,00	RP HV	Izgradnja dijela sustava odvodnje oborinskih voda, dijela sustava fekalne odvodnje, te sanacija vodovodne mreže naselja Blato.	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
39	VODOVOD d.o.o. Blato	1007	Blato	31.12.2023.	100.000,00	RP HV	Izgradnja dijela sustava odvodnje oborinskih voda, dijela sustava fekalne odvodnje, te sanacija vodovodne mreže naselja Blato.	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
39	NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	1032	Janjina	31.12.2023.	110.000.000,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
39	NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	1043	Korčula	31.12.2023.	137.100.000,00			U pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
39	NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	1056	Lumbarda	31.12.2023.	16.100.000,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
39	NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	1069	Mljet	mala	56.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije: idejni i glavni projekti - izmjene i dopune za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda NP Mljet	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje
39	NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	1069	Mljet	mala	7.617.653,90	RP HV	Dovršetak sustava vodoopskrbe i odvodnje u naseljima Pomena i Polače	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
39	NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	1069	Mljet	mala	196.000,00	RP HV	Dovršetak sustava vodoopskrbe i odvodnje u naseljima Pomena i Polače	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
39	NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	1104	Prud	mala	2.235.900,00	RP HV	Izgradnja dijela 'Zapadnog kraka' kanalizacijske mreže Ljubuškog - dionica 'stari grad - kružni tok'	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju
39	NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	1104	Prud	mala	23.006,00	RP HV	Nadzor nad izgradnjom dijela 'Zapadnog kraka' kanalizacijske mreže Ljubuškog - dionica 'stari grad - kružni tok'	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor
39	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	1084	Orebić	31.12.2023.	308.816.014,65			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi
39	IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	1151	Trpanj	31.12.2023.	118.800.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema

Uslužno područje	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
Javni isporučitelj vodne usluge														
39 IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	1151	Trpanj	31.12.2023.	149.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sustava nadzora i upravljanja (NUS-a) kanalizacijskim sustavom naselja Trpanj, izrada idejnog i glavnog projekta sekundarne mreže kanalizacijskog sustava Trpanj, izrada elaborata zaštite okoliša za dogradnju sustava odvodnje naselja Trpanj	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
39 IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	1151	Trpanj	31.12.2023.	189.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sustava nadzora i upravljanja (NUS-a) kanalizacijskim sustavom naselja Trpanj, izrada idejnog i glavnog projekta sekundarne mreže kanalizacijskog sustava Trpanj, izrada elaborata zaštite okoliša za dogradnju sustava odvodnje naselja Trpanj	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
39 IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	1151	Trpanj	31.12.2023.	200.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sustava nadzora i upravljanja (NUS-a) kanalizacijskim sustavom naselja Trpanj, izrada idejnog i glavnog projekta sekundarne mreže kanalizacijskog sustava Trpanj, izrada elaborata zaštite okoliša za dogradnju sustava odvodnje naselja Trpanj	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
39 IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	1151	Trpanj	31.12.2023.	20.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sustava nadzora i upravljanja (NUS-a) kanalizacijskim sustavom naselja Trpanj, izrada idejnog i glavnog projekta sekundarne mreže kanalizacijskog sustava Trpanj, izrada elaborata zaštite okoliša za dogradnju sustava odvodnje naselja Trpanj	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
39 IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	1151	Trpanj	31.12.2023.	1.585.963,49	RP HV	Izgradnja kućnih priključaka na izgrađeni sustav fekalne kanalizacije dijela naselja Trpanj	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	da	u izvođenju	
39 IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	1151	Trpanj	31.12.2023.	69.000,00	RP HV		PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	stručni nadzor	
40 VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1024	Dubrovnik	31.12.2018.	647.820.209,34	OPKK 2014-2020	IZGRADNJA I SANACIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE - GRUPA 4.1. IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE U NASELJIMA MOKOŠICA, ŠTIKOVICA I MALI ZATON	odobren	da	da	da	da	da	u izvođenju	
40 VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1024	Dubrovnik			OPKK 2014-2020	USLUGE INFORMIRANJA I VIDLJIVOSTI	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
40 VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1024	Dubrovnik			OPKK 2014-2020	OSTALI TROŠKOVI (imovinsko-pravni, elektroenergetski priključak, dozvole i doprinosi)	odobren	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u izvođenju
40 VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1024	Dubrovnik			OPKK 2014-2020	sanacija vodoopskrbe (tender 3) - otvaranje ponuda održano 03.05.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
40 VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1024	Dubrovnik			OPKK 2014-2020	sanacija Straduna (tender 5) - Odluka o odabiru objavljena 28.06.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
40 VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1024	Dubrovnik			OPKK 2014-2020	nadzor - ugovor potpisan 11.05.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
40 VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1024	Dubrovnik			OPKK 2014-2020	upravljanje - žalba na Odluku o odabiru zaprimljena u DKOM 02.06.2022.	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi

Uslužno područje	Javni isporučitelj vodne usluge	ID aglomeracije	Aglomeracija	Rok usklađenja aglomeracije	Vrijednost bez PDV(HRK)	Financijski paket	Komponenta/pod-komponenta	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPUA ili PUO	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPUA ili PUO	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Dokumentacija o nabavi	Status projekta	
40	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1024	Dubrovnik			OPKK 2014-2020	oprema - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	u pripremi	
40	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1024	Dubrovnik			OPKK 2014-2020	institucionalno jačanje - u pripremi	odobren	da	da	da	da	da	da	u pripremi
40	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1024	Dubrovnik			OPKK 2014-2020	vidljivost - ugovor potpisan 12.07.2021.	odobren	da	da	da	da	da	da	u izvođenju
40	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1024	Dubrovnik	31.12.2018.	16.221.056,06	NPOO	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda istočnog dijela naselja Orašac	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
40	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1053	Lopud	mala	10.172.781,56	NPOO	Gradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Lopuda, kolektora odvodnje, crpne stanice Sutiona, crpne stanice Lukovice i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	odobren	u postupku	u postupku	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
40	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1062	Malostonski zaljev	31.12.2023.	195.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije na kanalizacijskim podsustavima Mali Ston, Hodilje, Luka i Malo selo	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
40	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1062	Malostonski zaljev	31.12.2023.	145.000,00	RP HV	Izrada projektne dokumentacije sekundarne kanalizacije na području Općine Ston	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
40	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1062	Malostonski zaljev	31.12.2023.	30.000,00	RP HV	Izrada Elaborata zaštite okoliša	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
40	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1173	Zaton	31.12.2023.	182.600.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
40	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1178	Župa Dubrovačka	31.12.2023.	500.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
40	DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o. Slano	1129	Slano	31.12.2023.	23.704.780,00			u pripremi	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	
41	KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	1015	Cavtat	31.12.2023.	330.000.000,00			nije započela priprema	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	nije započela priprema	
41	KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	101234	Molunat	mala	199.200,00	RP HV	Izrada konceptijskog rješenja odvodnje otpadnih voda (s vodoopskrbom) područja Konavle - zapad	PLAN HV 2022.	pnp	pnp	da	da	n/p	projektiranje	
41	KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	101234	Molunat	mala	7.937.832,76	NPOO	Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Molunat	odobren	da	da, 25.5.2022.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
41	KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	101234	Molunat	mala	7.401.911,16	NPOO	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Molunat	odobren	da	da, 25.5.2022.	da	da	da	u izvođenju - retroaktivno	
		I prioritet - prema roku usklađenja													
		II prioritet - prema roku usklađenja													
		III prioritet - prema roku usklađenja													

Gotovo 90% vrijednosti projekata se financira kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020.

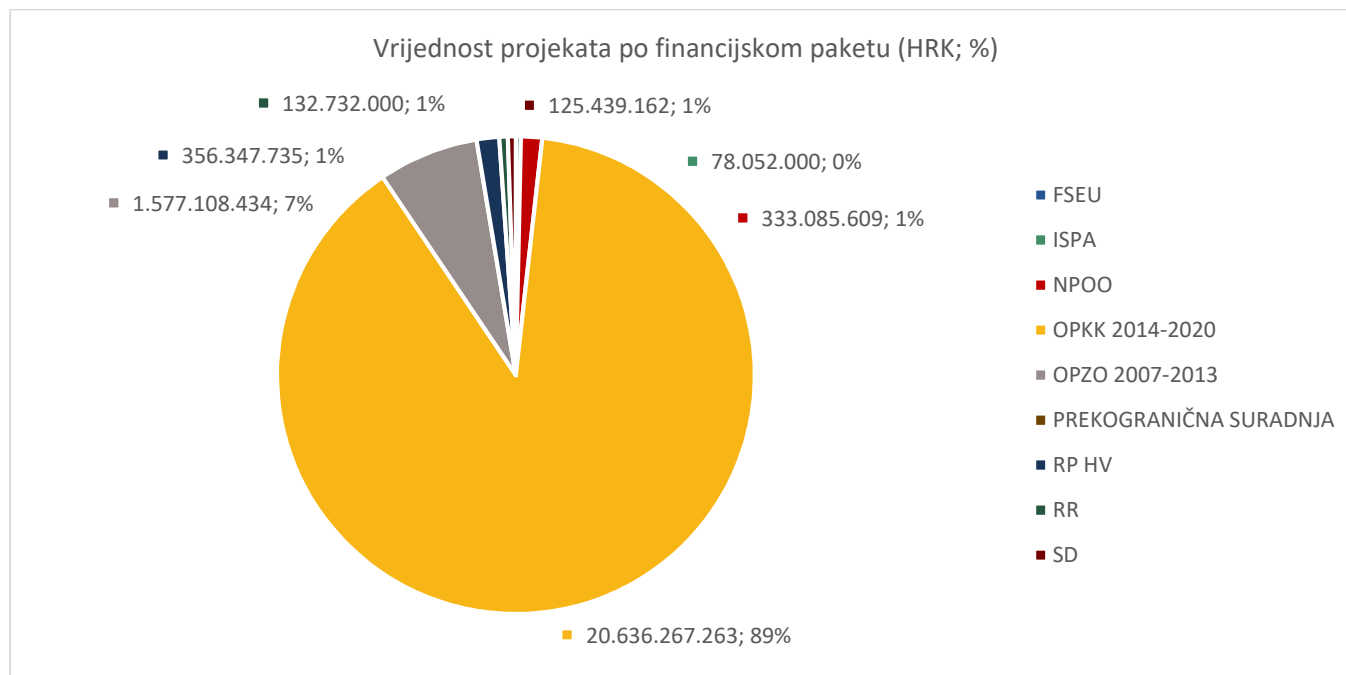

2.1.3 Projekti potpore razvoju vodnocomunalnih usluga

Kako su projekti potpore razvoju vodnocomunalnih usluga koji se provode na nacionalnoj razini vezani uz uspostavu uslužnih područja, njihova realizacija još uvijek nije započela. Riječ je o projektima unapređenja poslovanja isporučitelja vodnih usluga kako slijedi:

1. Projekti poticanja energetske učinkovitosti:
 - povezivanje u informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), odnosno uvođenje certificiranih sustava gospodarenja energijom (kao ISO 50001) (vidjeti poglavlje 6.3.4. mjere MEN - 7 / MEN - 8),
 - sredstva za pripremu aplikacija za korištenje dodatnih sredstava iz ove namjene (mjera MEN - 31)
2. Projekt uspostave kibernetičke sigurnosti - osiguranje sredstava za pripremu tehničke dokumentacije

Projekt (prema Programu 2021.)	Financijski paket	Stanje realizacije projekta prema prethodnom izvješću		Stanje realizacije Projekta	
		uslužno područje	stanje	uslužno područje	stanje
Projekt poticanja energetske učinkovitosti	-			1 - 41	-
Projekt uspostave kibernetičke sigurnosti	-			1 - 41	-
-	projekt se ne provodi				

2.2 Pregled stanja indikatora provedbe Programa 2021. (pokazatelji ishoda)

Pregled stanja indikatora provedbe prati sistematizaciju Programa 2021., odnosno daje se na razini Republike Hrvatske i uslužnih područja (u nastavku teksta), te isporučitelja vodnih usluga ili Projekata (u Prilogu izvješća). Prema definicijama interventne logike „aktivnost – mjera – cilj“ riječ je o pokazateljima ishoda odnosno pokazateljima učinka. Doprinos svake Komponente Projekta povećanju indikatora uzima se u obzir tek nakon što je ishođena uporabna dozvola, odnosno smatra se da završetak realizacije (završeno) potkomponente ne doprinosi promjeni vrijednosti ovih indikatora. U slučajevima kada je riječ o broju priključenih stanovnika na sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje na razini polugodišnjeg izvješća daju se procijenjeni podaci, koji će se provjeriti i po potrebi korigirati u suradnji s isporučiteljima vodnih usluga sukladno situaciji na terenu najmanje na 2-godišnjoj razini (na kraju kalendarske godine), a po mogućnosti i godišnje.

2.2.1 Ciljevi vezani uz reformu vodnocomunalnog sektora

Reforma vodnocomunalnog sektora obuhvaća međusobno usklađeni proces donošenja zakonodavnog okvira i provedbe investicija kroz Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda i Program razvoja javne vodoopskrbe. Nastavak te daljnji koraci u provođenju reforme vodnocomunalnog sektora, odnosno postizanja ciljeva vezani za reformu komunalnog sektora određeni su samo na razini Republike Hrvatske i prate se na osnovu sljedećih indikatora:

R.br	Cilj	Indikator uspješnosti postizanja ciljeva	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	
			broj	broj	broj	broj	broj	%
1	Do kraja 2022., doneseni podzakonski propisi: Uredba o uslužnim područjima, Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga te Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga čime će se provesti reforma javnih isporučitelja vodnih usluga	-	-	4	-	-	-	25%
2	Do kraja 2023., integracija postojećih 200 javnih isporučitelja na 41 uslužnom području po principu jedan isporučitelj vodnih usluga po uslužnom području	-	-	ispunjen				
3	Uspostavljena uslužna područja	broj uslužnih područja	0	41			0	0%
4	Prihvaćena preporuka Strategije upravljanja vodama o jedinstvenom obavljanju usluge vodoopskrbe i odvodnje	broj uslužnih područja	31	41			31	75,6%
5	ispoštovano načelo jedan isporučitelj na uslužnom području	broj uslužnih područja	11	41			11	26,8%

2.2.2 Ciljevi postizanja standarda obavljanja usluge javne vodoopskrbe, odnosno opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju

Ciljevi postizanja standarda obavljanja usluge javne vodoopskrbe su određeni na razini projekta i Republike Hrvatske u cjelini. Napominje se da su projekti u daleko najvećem broju slučajeva planirani na način da, u različitom omjeru, zadovoljavaju sva tri navedena cilja. Isti zaključak se može izvesti i kada je riječ o većini zahvata koji se planiraju realizirati. Naime, određeni zahvati u prostoru omogućavaju i povećanje kapaciteta sustava i smanjenje gubitaka i smanjenje rizika po zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju. Očekivane učinke provedenih projekata moguće je procijeniti budući da je poznat njihov prostorni obuhvat.

R.br	Cilj	Indikator uspješnosti postizanja ciljeva	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno	% u odnosu na ciljnu vrijednost
1	Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji	ima pristup vodi za ljudsku potrošnju prema procijenjenom broju stanovnika iz 2018.	%	93,4%	98%		93,4%	
			broj	3.808.525	3.996.101		3.808.525	95,3%

R.br	Cilj	Indikator uspješnosti postizanja ciljeva		Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno	% u odnosu na ciljanu vrijednost
2	Smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode namijenjene ljudskoj potrošnji	broj stanovnika s dostupnom zdravstveno ispravnom vodom	%	58%	98%			58%	
			broj	2.348.585	3.996.101			2.348.585	58,8%
3	Smanjenje gubitaka iz vodoopskrbnih sustava - smanjenje opterećenja voda zahvaćanjem vode namijenjene za ljudsku potrošnju	Gubici u sustavima javne odvodnje - prosjek za Republiku Hrvatsku	%	45% - 48%	< 20 %			45% - 48%	

Navedene ciljane vrijednosti za Republiku Hrvatsku se oslanjaju na pretpostavku da će se realizacijom projekata omogućiti priključenje 75 % nepriključenih stanovnika koji gravitiraju javnim vodoopskrbnim sustavima i lokalnim vodovodima, te 50 % stanovnika s individualnom vodoopskrbom, te će se, ukoliko ne postoje točni podaci koji proizlaze iz tehničke dokumentacije i snimka izvedenog stanja, odnosno podaci potvrđeni od strane isporučitelja vodnih usluga, indikator proračunavati prema prethodno navedenim pretpostavkama.

Ciljevi postizanja standarda javne vodoopskrbe - početne i ciljane vrijednosti pokazatelja po uslužnim područjima:


Uslužno područje	Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji						Smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode						Smanjenje gubitaka iz sustava javne vodoopskrbe					
	stanovnici koji imaju pristup vodi						stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi						omjer između zahvaćene i isporučene količine vode					
	početna	ciljana	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	ukupno postignuta vrijednost indikatora		početna	ciljana	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	ukupno postignuta vrijednost indikatora		početna*	ciljana	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	broj	broj	%	%	%	%	%	%	%
1	109.191	109.451			109.191	99,8%	109.191	109.451			109.191	99,8%	31%	20%			31%	
2	157.398	164.343			157.398	95,8%	155.562	164.343			155.562	94,7%	37% - 51%	20%			37% - 51%	
3	67.918	75.358			67.918	90,1%	67.770	75.358			67.770	89,9%	12% - 34%	20%			12% - 34%	
4	110.646	121.776			110.646	90,9%	84.559	121.776			84.559	69,4%	9% - 48%	20%			9% - 48%	
5	73.925	74.874			73.925	98,7%	73.843	74.874			73.843	98,6%	20% - 34%	20%			20% - 34%	
6	66.536	68.435			66.536	97,2%	11.374	68.435			11.374	16,6%	36% - 55%	20%			36% - 55%	
7	19.411	19.914			19.411	97,5%	9.112	19.914			9.112	45,8%	48%	20%			48%	
8	182.657	183.865			182.657	99,3%	39.650	183.865			39.650	21,6%	17% - 38%	20%			17% - 38%	
9	103.540	122.150			103.540	84,8%	97.313	122.150			97.313	79,7%	19% - 43%	20%			19% - 43%	
10	49.973	49.981			49.973	100,0%	49.973	49.981			49.973	100,0%	34% - 45%	20%			34% - 45%	
11	820.322	869.307			820.322	94,4%	529.636	869.307			529.636	60,9%	45% - 55%	20%			45% - 55%	
12	68.510	72.072			68.510	95,1%	67.479	72.072			67.479	93,6%	15% - 31%	20%			15% - 31%	

Uslužno područje	Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji stanovnici koji imaju pristup vodi						Smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi						Smanjenje gubitaka iz sustava javne vodoopskrbe omjer između zahvaćene i isporučene količine vode					
	početna		ciljana		ukupno postignuta vrijednost indikatora		početna		ciljana		ukupno postignuta vrijednost indikatora		početna*		ciljana		ukupno postignuta vrijednost indikatora	
	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	broj	broj	%	%	%	%	%	%	%
	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje
13	91.259	101.358			91.259	90,0%	12.982	101.358			12.982	12,8%	26% - 43%	20%			26% - 43%	
14	108.921	114.013			108.921	95,5%	90.046	114.013			90.046	79,0%	43% - 71%	20%			43% - 71%	
15	33.549	40.188			33.549	83,5%	33.206	40.188			33.206	82,6%	49% - 81%	20%			49% - 81%	
16	48.458	49.621			48.458	97,7%	47.675	49.621			47.675	96,1%	52%	20%			52%	
17	47.970	50.158			47.970	95,6%	47.804	50.158			47.804	95,3%	1% - 68%	20%			1% - 68%	
18	61.371	64.724			61.371	94,8%	59.501	64.724			59.501	91,9%	40% - 47%	20%			40% - 47%	
19	29.029	34.853			29.029	83,3%		34.853				0,0%	46% - 20%	20%			46% - 20%	
20	92.808	98.670			92.808	94,1%	18.842	98.670			18.842	19,1%	36% - 61%	20%			36% - 61%	
21	110.644	110.762			110.644	99,9%	15.351	110.762			15.351	13,9%	22% - 51%	20%			22% - 51%	
22	41.655	41.684			41.655	99,9%		41.684				0,0%	26% - 42%	20%			26% - 42%	
23	97.249	99.858			97.249	97,4%	97.249	99.858			97.249	97,4%	24%	20%			24%	
24	105.786	107.640			105.786	98,3%	105.786	107.640			105.786	98,3%	20% - 26%	20%			20% - 26%	
25	219.925	222.740			219.925	98,7%	216.046	222.740			216.046	97,0%	23% - 69%	20%			23% - 69%	
26	29.629	31.091			29.629	95,3%	13.301	31.091			13.301	42,8%	23%	20%			23%	
27	18.810	18.868			18.810	99,7%	18.810	18.868			18.810	99,7%	45%	20%			45%	
28	24.010	25.344			24.010	94,7%	17.925	25.344			17.925	70,7%	23% - 62%	20%			23% - 62%	
29	33.031	34.916			33.031	94,6%	32.548	34.916			32.548	93,2%	25% - 90%	20%			25% - 90%	
30	121.109	128.574			121.109	94,2%	183	128.574			183	0,1%	45% - 89%	20%			45% - 89%	
31	24.064	27.499			24.064	87,5%	3.051	27.499			3.051	11,1%	45% - 73%	20%			45% - 73%	
32	98.781	101.786			98.781	97,0%	87.055	101.786			87.055	85,5%	56% - 72%	20%			56% - 72%	
33	275.259	286.126			275.259	96,2%	8.369	286.126			8.369	2,9%	56% - 60%	20%			56% - 60%	
34	44.809	45.459			44.809	98,6%	43.103	45.459			43.103	94,8%	43% - 70%	20%			43% - 70%	
35	22.007	22.770			22.007	96,6%	22.007	22.770			22.007	96,6%	15%	15%			15%	
36	27.770	29.131			27.770	95,3%	13.581	29.131			13.581	46,6%	17% - 35%	20%			17% - 35%	
37	48.102	49.759			48.102	96,7%	14.646	49.759			14.646	29,4%	15% - 75%	20%			15% - 75%	
38	40.513	40.865			40.513	99,1%	9.105	40.865			9.105	22,3%	25% - 81%	20%			25% - 81%	
39	21.889	23.671			21.889	92,5%	8.584	23.671			8.584	36,3%	22% - 59%	20%			22% - 59%	
40	52.055	54.127			52.055	96,2%	8.331	54.127			8.331	15,4%	22%	20%			22%	
41	8.036	8.324			8.036	96,5%	8.036	8.324			8.036	96,5%	28%	20%			28%	
*	Indikativna vrijednost prema izvještajima javnih isporučitelja za 2019. godinu, preciznija početna vrijednost pokazatelja će se utvrditi pri izradi detaljne tehničke dokumentacije																	


Komentar: S obzirom na to da je riječ o 1. Izvješću te da u izvještajnom razdoblju nije završen niti jedna komponenta projekta ukupno postignuta vrijednost sva 3 indikatora postizanja ciljeva standarda javne vodoopskrbe jednaka su početnim vrijednostima indikatora kako je to navedeno u Programu 2021.

Uspoređujući postignutu vrijednost indikatora (u ovom 1. Izvješću postignuta vrijednost indikatora je jednaka početnoj vrijednosti indikatora, generalno se može zaključiti sljedeće:

- Indikator „dostupnost vode za ljudsku potrošnju“ je na vrlo visokoj razini ispunjenosti, odnosno ciljani indikator je postignut na razini od oko 95 %. Na uslužnom području 10 indikator je u potpunosti ispunjen, dok se vrlo visoki stupanj ispunjenosti indikatora dostupnosti vode za ljudsku potrošnju (veći od 95 %) bilježi na 26 uslužnih područja. Na 4 uslužna područja (9, 15, 19 i 31) razina ispunjenosti indikatora je manja od 90 %, ali se ne spušta ispod razine od 83,5 %.

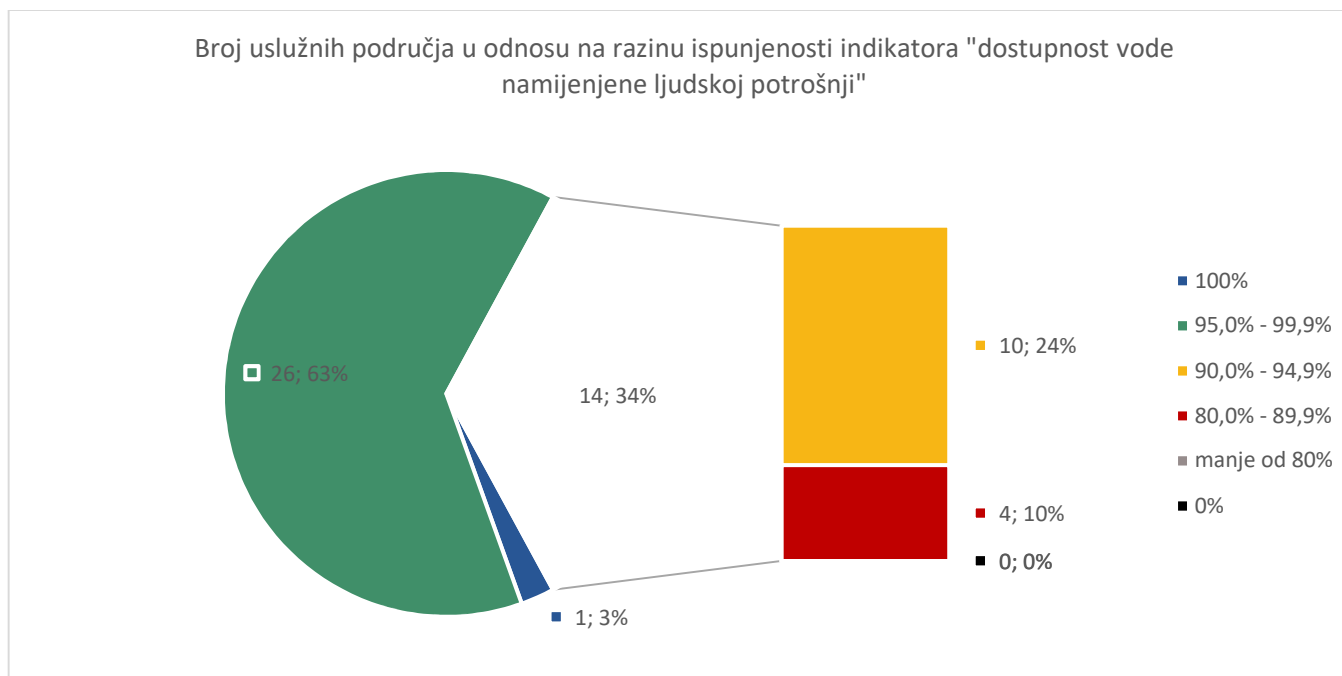

- Indikator „smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode“ je na značajno nižoj razini ispunjenosti i u prosjeku iznosi 58,8 %. Na uslužnom području 10 indikator je u potpunosti ispunjen dok se vrlo visoki stupanj ispunjenosti indikatora dostupnosti vode za ljudsku potrošnju (veći od 80 %) bilježi na 18 uslužnih područja. Posebno se naglašava da je na 4 uslužna područja razina ispunjenosti indikatora iznimno niska i to 0 % (uslužna područja 19 i 22), odnosno uslužna područja 30 i 33 (0,1 % i 2,9 % respektivno).

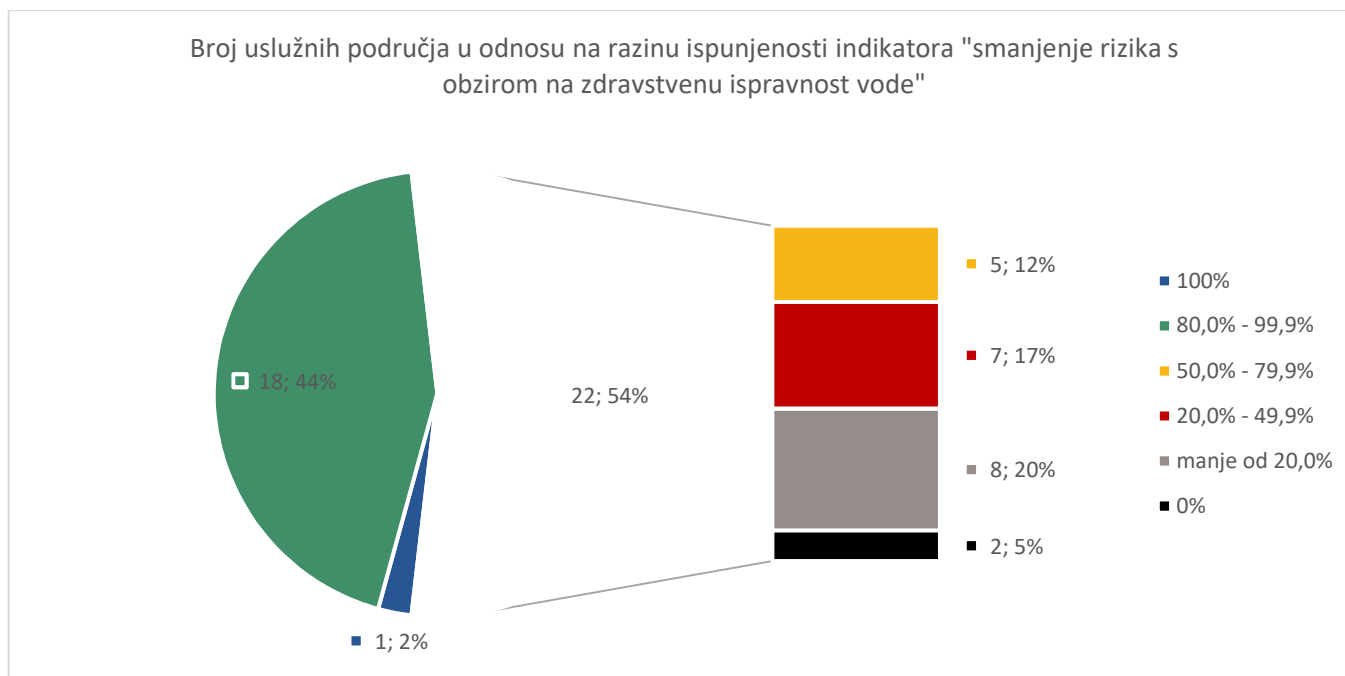

- Na uslužnom području 10 potrebna ulaganja je potrebno usmjeriti na smanjenje gubitaka s 34 % - 45 % na ciljanih 20 %.

2.2.3 Ciljevi postizanja standarda javne odvodnje

Ciljevi postizanja standarda javne odvodnje u Programu 2021. odnose se isključivo na aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES.

R.br	Cilj	Indikator uspješnosti postizanja ciljeva	Broj aglomeracija	Ukupno opterećenje	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno	% u odnosu na ciljnu vrijednost
1	Priključenost na sustav javne odvodnje	usklađeno (ES)	15	243.908	242.769	242.769	-	-	242.769	100%
		uvjetno usklađeno (ES)	7	269.242	249.498	263.857			249.498	95%
		treba uskladiti (ES)	228	4.498.248	2.921.228	4.408.283			2.921.228	66%
2	Usklađenost s obzirom na potrebnu razinu pročišćavanja	Broj aglomeracija (broj)			45	260			45	17%
		Opterećenje priključeno na UPOV-e zahtijevanog stupnja (ES)			242.769	4.914.909			242.769	5%

Indikator „priključenost na sustav javne odvodnje“ se prati u odnosu na ocjenu postojećeg stanja usklađenosti gdje se:

- usklađenim sustavom smatra sustav na kome je priključeno više od 98 % opterećenja na zahtijevani stupanj pročišćavanja
- uvjetno usklađenim sustavom smatra sustav na kome je priključeno između 90 % i 98 % opterećenja na zahtijevani sustav pročišćavanja


sve ostalo se smatra neusklađenim sustavom.

Komentar: S obzirom na to da je riječ o 1. Izvješću te da u izvještajnom razdoblju nije završen niti jedna komponenta projekta ukupno postignuta vrijednost oba indikatora postizanja ciljeva standarda javne odvodnje jednaka su početnim vrijednostima indikatora kako je to navedeno u Programu 2021.

Uslužno područje	Početna vrijednost Priključeno opterećenje (ES)			Ciljano priključeno opterećenje (ES)			Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću (ES)			Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju (ES)			Ukupno postignuta vrijednost indikatora (ukupno postignuta usklađenost)				
	usklađeno	neusklađeno	uvjetno	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	ukupno ciljana vrijednost - opterećenje	postignuta vrijednost prema prethodnom izvješću	ukupno postignuta vrijednost u izvještajnom razdoblju	postignuta vrijednost indikatora na kraju izvještajnog razdoblja	
	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	%
1	3.087	65.983		3.087	140.716	0							143.803			3.087	2,15%
2		125.055		0	186.677	0							186.677			0	0,00%
3		62.349		0	82.197	0							82.197			0	0,00%
4		73.549		0	98.499	0							98.499			0	0,00%
5		38.093	4.875	0	58.353	4.963							63.316			0	0,00%
6		37.641		0	59.641	0							59.641			0	0,00%
7		10.907		0	16.873	0							16.873			0	0,00%
8	8.250	174.194		8.250	212.572	0							220.822			8.250	3,74%
9		35.028		0	68.289	0							68.289			0	0,00%
10		30.726		0	52.530	0							52.530			0	0,00%
11		872.710		0	998.352	0							998.352			0	0,00%
12		48.048		0	67.197	0							67.197			0	0,00%
13		46.027		0	89.553	0							89.553			0	0,00%
14		46.340		0	79.611	0							79.611			0	0,00%
15		17.087	2.027	0	34.062	2.084							36.146			0	0,00%
16		31.084		0	53.827	0							53.827			0	0,00%
17		31.246		0	46.252	0							46.252			0	0,00%
18		45.173		0	63.312	0							63.312			0	0,00%
19		16.578	2.294	0	32.563	2.346							34.910			0	0,00%
20		60.635		0	106.531	0							106.531			0	0,00%
21		56.568		0	128.914	0							128.914			0	0,00%
22		27.880	8.101	0	36.673	8.586							45.258			0	0,00%
23	135.933	11.644	100.893	135.933	15.411	105.671							257.015			135.933	52,89%
24	11.843	63.176	79.874	11.843	99.497	86.626							197.967			11.843	5,98%
25		166.891		0	236.696	0							236.696			0	0,00%
26		68.758	22.286	0	102.903	23.231							126.134			0	0,00%
27		40.371		0	53.561	0							53.561			0	0,00%
28	11.750	53.744	3.830	11.750	85.093	3.892							100.735			11.750	11,66%

Uslužno područje	Početna vrijednost Priključeno opterećenje (ES)			Ciljano priključeno opterećenje (ES)			Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću (ES)			Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju (ES)			Ukupno postignuta vrijednost indikatora (ukupno postignuta usklađenost)				
	usklađeno	neusklađeno	uvjetno	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	ukupno ciljana vrijednost - opterećenje	postignuta vrijednost prema prethodnom izvješću	ukupno postignuta vrijednost u izvještajnom razdoblju	postignuta vrijednost indikatora na kraju izvještajnog razdoblja	
																ES	ES
29		10.258		0	18.757	0							18.757			0	0,00%
30		87.682		0	242.207	0							242.207			0	0,00%
31		31.779		0	58.540	0							58.540			0	0,00%
32		72.201		0	150.947	0							150.947			0	0,00%
33		205.004		0	337.956	0							337.956			0	0,00%
34		12.815		0	31.002	0							31.002			0	0,00%
35		11.745		0	24.466	0							24.466			0	0,00%
36	3.742	19.395	23.189	3.742	35.122	24.187							63.052			3.742	5,93%
37	68.164	3.560	2.125	68.164	24.723	2.271							95.158			68.164	71,63%
38		34.549		0	54.058	0							54.058			0	0,00%
39		7.937		0	42.611	0							42.611			0	0,00%
40		64.554		0	78.577	0							78.577			0	0,00%
41		2.264		0	2.959	0							2.959			0	0,00%
RH	242.769	2.921.228	249.494	242.769	4.408.283	263.857							4.914.909			242.769	4,94%

Postignuta vrijednost indikatora „priključenost na sustav javne odvodnje“ kojim se mjeri ukupna potpuna uskladenost s zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda je iznimno niska i na razini Republike Hrvatske iznosi oko 5 %. Naime na čak 34 uslužna područja usklađenost je 0 %. Najpovoljnija situacija je na uslužnim područjima 37 i 23 gdje je oko 71,2 %, odnosno 52,9 % stanovnika priključeno na odgovarajući sustav i odgovarajuću razinu pročišćavanja otpadnih voda.

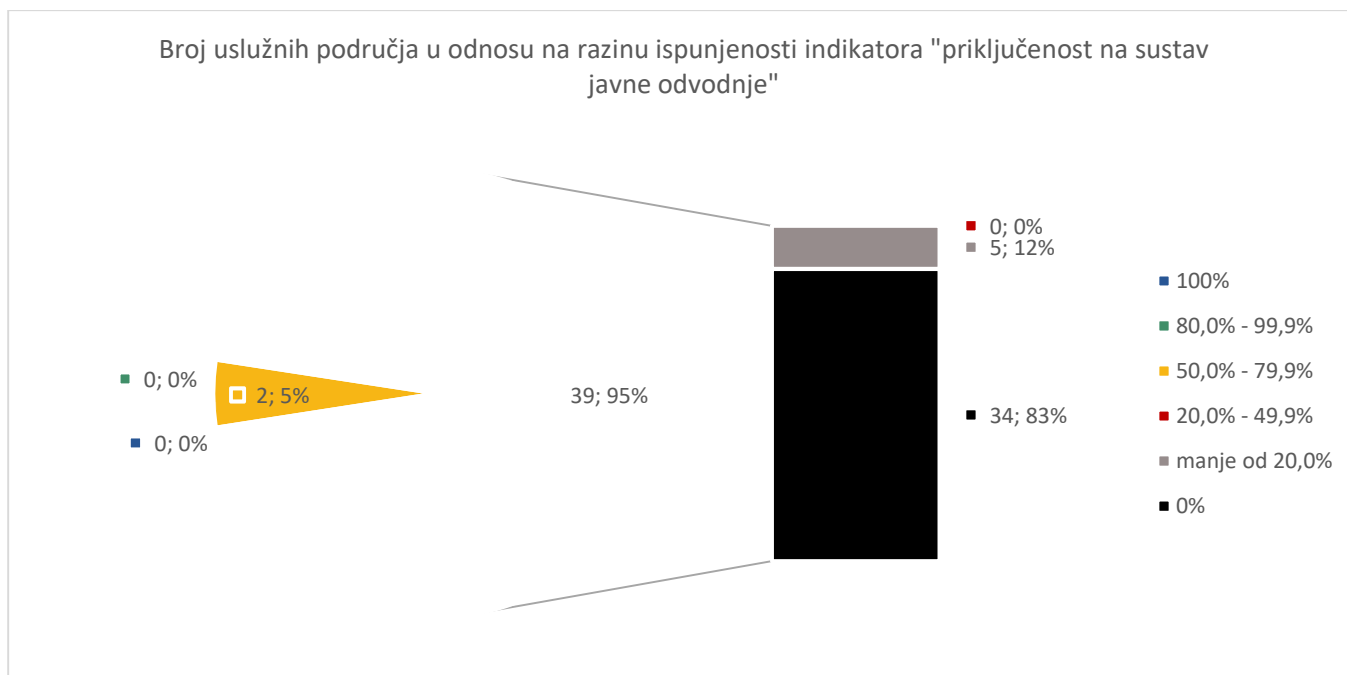


Usklađenost s obzirom na indikator „potrebna razina pročišćavanja“ se prati u odnosu na ukupan broj aglomeracija na kojima je uspostavljen zahtijevani stupanj pročišćavanja.

Uslužno područje	Početna vrijednost usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Ciljana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	
	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	%
1	4	7	11			4	36,4%
2	0	8	8			0	0,0%
3	1	1	2			1	50,0%
4	5	4	9			5	55,6%
5	1	6	7			1	14,3%
6	1	4	5			1	20,0%
7	1	1	2			1	50,0%
8	2	5	7			2	28,6%

Uslužno područje	Početna vrijednost usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Ciljana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	
	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	%
9	1	6	7			1	14,3%
10	0	1	1			0	0,0%
11	0	6	6			0	0,0%
12	0	2	2			0	0,0%
13	1	11	12			1	8,3%
14	2	3	5			2	40,0%
15	0	5	5			0	0,0%
16	1	1	2			1	50,0%
17	0	5	5			0	0,0%
18	1	5	6			1	16,7%
19	0	5	5			0	0,0%
20	1	8	9			1	11,1%
21	4	12	16			4	25,0%
22	1	1	2			1	50,0%
23	4	7	11			4	36,4%
24	0	8	8			0	0,0%
25	1	6	7			1	14,3%
26	0	10	10			0	0,0%
27	1	3	4			1	25,0%
28	1	8	9			1	11,1%
29	3	0	3			3	100,0%
30	1	11	12			1	8,3%
31	1	2	3			1	33,3%
32	2	7	9			2	22,2%
33	0	6	6			0	0,0%
34	1	2	3			1	33,3%
35	0	3	3			0	0,0%
36	1	9	10			1	10,0%
37	0	9	9			0	0,0%
38	1	5	6			1	16,7%
39	0	8	8			0	0,0%
40	1	3	4			1	25,0%
41	0	1	1			0	0,0%
Ukupno	45	215	260			45	17,3%

Zahtijevanu, odnosno „potrebnu razinu pročišćavanja“ ima oko 17 % aglomeracija u Republici Hrvatskoj. Čak 14 uslužnih područja nema niti jednu aglomeraciju koja je s potrebnom razinom pročišćavanja. Najpovoljnija situacija je na uslužnom području 29 na kojem su sve 3 aglomeracije u potpunosti usklađene s obzirom na potreban stupanj pročišćavanja, ali je na tom području potrebno investirati u sustave prikupljanja komunalnih otpadnih voda. Na 5 uslužnih područja (3, 4, 7, 16 i 22) preko 50 % aglomeracija ima zahtijevanu razinu pročišćavanja.

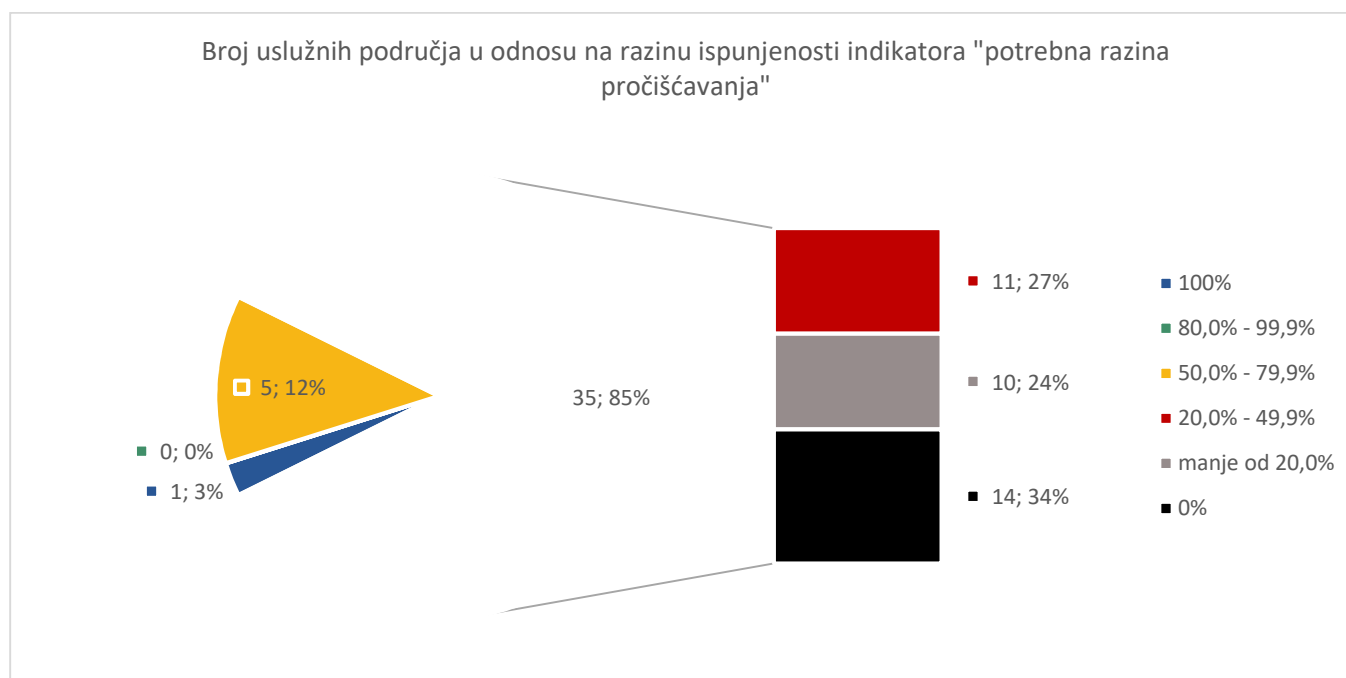

3 ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Na osnovu prikupljenih podataka o realizaciji projekata iz Programa 2021. može se zaključiti sljedeće:

1. Izvješće je koncipirano na način da su preuzete početne i ciljane vrijednosti indikatora na način na koji su te vrijednosti navedene u Programu 2021. Napominje se da su u međuvremenu objavljeni prvi rezultati Popisa stanovništva 2021., koji se u određenoj mjeri razlikuju od procijenjenog broja stanovnika u 2018. godini koji je korišten za izradu Programa 2021. Naime, prema prvim rezultatima ukupan broj stanovnika iznosi 3.888.529 što je u odnosu na procijenjeni broj u 2018. od 4.076.246 dalje smanjenje za 187.717 stanovnika. Mada je riječ o razlici od oko 5 % na razini ukupnog broja stanovnika (u odnosu na broj stanovnika prema prvim rezultatima Popisa 2021.), procijenjeni broj i broj stanovnika prema Popisu stanovništva 2021. na razini naselja se može značajno razlikovati. Nakon objave konačnih rezultata, početne i ciljane vrijednosti indikatora iz Programa 2021. će biti usklađene i nastavno korištene u Izvješćima. Navedena promjena će jasno biti naznačena na samom početku Izvješća. Dodatno, prema prvim rezultatima Popisa stanovništva 2021., a nakon donošenja Programa 2021. korigirana je tablica s podacima za novi ciklus izvješćivanja prema Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda po članku 17. Kako je riječ o 1. Izvješću, te s obzirom da podaci Popisa stanovništva 2021. još uvijek nisu konačni, a kako bi se uspostavila jasna veza između Programa 2021. i Izvješća, podaci vezani uz razvoj sustava javne odvodnje u 1. i 2. Izvješću će pratiti podatke iz Programa 2021. Podaci u 3. Izvješću će se usuglasiti s podacima za novi ciklus izvješćivanja prema članku 17. Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.
2. Način prikupljanja podataka o provedbi i uspješnosti projekata (učestalost) značajno je različit ovisno o financijskom paketu kroz koji se svaki projekt, odnosno komponenta projekta financira. Karakteristično je da se praćenje realizacije projekata i njihovih komponenti i potkomponenti koji se:
 - sufinanciraju sredstvima Hrvatskih voda i sredstvima isporučitelja vodnih usluga (naknada za razvoj), odnosno
 - isključivo sredstvima isporučitelja vodnih usluga (naknada za razvoj)prate na godišnjoj razini, odnosno na kraju proračunske godine. U takvim slučajevima se podaci u polugodišnjim Izvješćima mogu smatrati nepotpunim ili procijenjenim.
3. Doprinos svake komponente projekta povećanju indikatora uzima se u obzir tek nakon što je ishođena uporabna dozvola (kraj realizacije), odnosno smatra se da završetak realizacije potkomponente ne doprinosi promjeni vrijednosti indikatora. U slučajevima kada je riječ o broju priključenih stanovnika na sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje na razini polugodišnjeg izvješća daju se procijenjeni podaci, koji se provjeravaju i po potrebi korigiraju u suradnji s isporučiteljima vodnih usluga sukladno situaciji na terenu najmanje na 2-godišnjoj razini (na kraju kalendarske godine), a po mogućnosti i godišnje. Takve korekcije će posebno biti naglašene i praćene kroz sukcesivna Izvješća.
4. Pokazatelji rezultata komponenti / potkomponenti odnosno aktivnosti razlikuju se za različite financijske pakete i posebno su razrađeni u izvješćima o realizaciji Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. i Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. Tako je:

- a. Prema izvješću o pokazateljima rezultata za Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. do kraja ovog izvještajnog razdoblja iz 1. poziva odobreno 73 projekta. Do kraja drugog kvartala 2022. godine izvedeno je 126,08 km nove ili rekonstruirane mreže javne odvodnje, te ukupno 255,53 km nove ili rekonstruirane mreže javne vodoopskrbe čime su zadane ciljane vrijednosti indikatora ostvarene za ovaj izvještajni period. U tijeku je drugi poziv za male intervencije, te je pripremljen poziv za aglomeracije (12) i upućen je u Europsku komisiju na odobrenje.
- b. Realizacija projekata koji se financiraju sredstvima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. se prati kroz nekoliko pokazatelja rezultata. U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. odobreno je 60 projekata, no s obzirom da svih 60 odobrenih projekata neće biti dovršeno u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. ciljani pokazatelji rezultata su sljedeći:
 - ciljana vrijednost pokazatelja CO19 - povećanje broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda (ES) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. iznosi 800.000 ES od čega do sada 63.000 ES koristi poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda
 - ciljana vrijednost pokazatelja CO18 - povećanje u broju stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vode u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. iznosi 300.000 od čega do sada 268.130 stanovnika ima pristup poboljšanoj opskrbi vodom

Kroz 60 odobrenih projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. do sada je:

 - Izgrađeno 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja ukupnog kapaciteta 42.000 ES,
 - Izgrađen 1 uređaj za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja kapaciteta 20.000 ES,
 - Izgrađeno oko 1.600 km nove mreže javne odvodnje otpadnih voda i 130 km je rekonstruirano,
 - Izgrađeno 310 km nove vodoopskrbne mreže i rekonstruirano oko 360 km
- c. Prema za sada dostupnim informacijama pokazatelji o rezultatima projekata koji se financiraju u okviru drugih financijskih paketa se ne prate i ne sistematiziraju.

5. S obzirom na to da se broj ostvarenih priključaka, odnosno odgovarajući broj stvarno priključenih stanovnika na javne sustave vodoopskrbe i javne sustave odvodnje prati kako u okviru NPOO tako i u okviru OPKK 2014. - 2022., te da je u Programu 2021. indikator uglavnom vezan uz broj stanovnika koji imaju mogućnost priključenja, broj „stvarno“ priključenih stanovnika će se dodati kao još jedan indikator ishoda Programa 2021. Početna i ciljana vrijednost ovog indikatora će se odrediti u 2. ili 3. Izvješću ovisno o raspoloživosti i pouzdanosti raspoloživih podataka.
6. S obzirom na to da je riječ o 1. Izvješću te da u izvještajnom razdoblju nije završen niti jedna komponenta projekta ukupno postignuta vrijednost oba indikatora postizanja ciljeva standarda javne odvodnje jednaka su početnim vrijednostima indikatora kako je to navedeno u Programu 2021. Razina ispunjenosti indikatora je značajno povoljnija u javnoj vodoopskrbi nego što je to slučaj u javnoj odvodnji. Međutim, valja napomenuti da je dodatno planirano povećanje dostupnosti vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju odgovarajuće zdravstvene ispravnosti, odnosno dostupnosti javne vodoopskrbe u financijskom i tehničkom smislu iznimno zahtjevno (priključenje manjih udaljenih naselja, odnosno rad na rekonstrukciji ili povećanju kapaciteta postojeće infrastrukture u urbanim sredinama).

4 PRILOZI

4.1 Popis Projekata prema Planu 2021.

4.1.1 Javna vodoopskrba

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
1	72	MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
2	74	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec
	143	VARKOM d.d. Varaždin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin
3	75	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
	35	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci
4	39	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar
	16	KAPELAKOM d.o.o. Kapela	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela
	73	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac
	40	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma
	45	VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica
	34	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar
	139	VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac
	36	VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje
5	78	KOMRAD d.o.o. Slatina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina
	77	VIRKOM d.o.o. Virovitica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica
	79	VODA d.o.o. Orahovica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica
	76	VODAKOM d.o.o. Pitomača	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
6	12	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo
	80	NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice
	81	VODORAD d.o.o. Đurđenovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac
7	84	BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir
8	89	DVORAC d.o.o. Valpovo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo
	83	HIDROBEL d.o.o. Belišće	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće
	82	MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac
	135	UREDOST d.o.o. Čepin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU UREDOST d.o.o. Čepin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDOST d.o.o. Čepin
	144	VODOOPSKRBA d.o.o. Darda	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda
	87	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek
9	2	HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli
	3	KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina
	136	VIOP d.o.o. Pregrada	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada
	1	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok
10	4	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić
	137	VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra
11	46	VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko
	33	VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac
	145	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
	17	VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina
12	6	VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica
	32	VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina
13	149	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 13 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma
	5	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb
14	9	KOMUNALAC d.o.o. Slunj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj
	11	KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa
	24	KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj
	146	VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić
	29	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac
	22	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin
	44	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić
	151	VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja
15	18	JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica
	50	KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor
	42	PRIVREDA d.o.o. Petrinja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja
	138	SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak
	43	VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko
	47	VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
	148	VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja
16	25	SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak
17	15	JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac
	20	LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani
	41	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina
	14	VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica
	21	VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska
18	28	TEKIJA d.o.o. Požega	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na VP JIVU TEKIJIA d.o.o. Požega	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKIJIA d.o.o. Požega
	31	VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac
19	37	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška
20	131	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo
	26	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod
21	10	DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci
	38	KOMUNALAC d.o.o. Županja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja
	13	KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja
	49	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci
22	90	KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok
	88	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar
23	57	ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
24	68	VODOVOD d.o.o Pula	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula
	67	VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin
25	61	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
	53	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice
	56	KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar
	58	LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići
	65	VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko
26	59	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk
	62	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres
27	70	VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski
28	51	CRNO VRILO d.o.o. Karlobag	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o. Karlobag	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o. Karlobag
	54	KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja
	112	KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag
	63	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj
	110	VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana
	69	VRELO d.o.o. Rab	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab
29	52	KAPLJA d.o.o. Lovinac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac
	140	KOMUNALAC d.o.o. Otočac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac
	55	KRALJEVAC d.o.o. Udbina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
	27	SPELEKOM d.o.o. Rakovica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica
	60	USLUGA d.o.o. Gospić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić
	64	VISOČICA d.o.o. Donji Lapac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU VISOČICA d.o.o. Donji Lapac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VISOČICA d.o.o. Donji Lapac
	66	VODOVOD d.o.o. Brinje	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje
	48	VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica
30	125	GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac
	105	KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali
	142	OTOK UGLJAN d.o.o. Preko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko
	129	SABUŠA d.o.o. Kukljica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica
	111	VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir
	123	VODOVOD d.o.o. Zadar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar
31	141	KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru
	116	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac
32	91	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin
	96	RAD d.o.o. Drniš	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš
	104	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split
	98	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik
33	150	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split
	99	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
34	106	KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo
	97	USLUGA d.o.o. Vrlika	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrlika	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrlika
35	108	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj
	124	VODOVOD d.o.o. Omiš	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš
36	121	HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa
	126	VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar
37	117	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža
	102	VODOVOD d.o.o. Makarska	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska
	147	VODOVOD d.o.o. Omiš	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš
	122	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski
38	92	IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče
	128	KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac
	94	METKOVIĆ d.o.o. Metković	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković
	114	NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula
	109	VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen
	120	ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište
39	127	IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj
	113	NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula
	115	VODA MLJET d.o.o. Babino Polje	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
	100	VODOVOD d.o.o. Blato	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato
	119	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik
	130	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić
40	118	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik
41	93	KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 41 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 41 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi
28		VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. Senj	Razvoj alternativnog sustava opskrbe regionalnog vodovoda za UP 28	Razvoj alternativnog sustava opskrbe regionalnog vodovoda za UP 28

4.1.2 Javna odvodnja

Aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje	Naziv aglomeracije	ID aglomeracije
6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag	Buje	3024
	Novigrad Istarski	1076
	Umag	1156
ALBANEŽ d.o.o., Pomer	Banjole	1001
	Premantura	1101
	Medulin	1066
BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir	Kneževi Vinogradi	7009
	Beli Manastir	7003
CRNO VRILO d.o.o., Karlobag	Karlobag	1036
DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar	Daruvar	6012
DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci	Rajevo Selo	7040
DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Slano	Slano	1129
DVORAC d.o.o., Valpovo	Koška	101050
	Petrijevci	7013
ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo	Punitovci	101039
	Semeljci	101043
	Đakovo	6020
GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac	Gračac	2045
HIDROBEL d.o.o., Belišće	Belišće	7004
HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli	Hum na Sutli	4036
HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa	Jelsa-Vrboska	101207
	Stari Grad	101117
IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec	Ivanec	5017
IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj	Trpanj	1151
IZVOR Ploče javna ustanova Ploče	Gradac	1025
	Ploče	1089
JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica	Hrvatska Kostajnica	4036
KANFANAR ODVODNJA d.o.o., Kanfanar	Kanfanar	3056
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka	Kraljevica	1046
	Rijeka	1116
	Kostrena	1045
KOMRAD d.o.o., Slatina	Slatina	5123
KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor	Dvor	4029
KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice	Delnice	2036
	Fužine	2178
KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru	Biograd	1006
	Pašman	1087
KOMUNALAC d.o.o., Otočac	Otočac	2245
KOMUNALAC d.o.o., Slunj	Slunj	2007
KOMUNALAC d.o.o., Županja	Županja	7053
	Bošnjaci	7020
	Gradište	7026
KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac	Virje	5038
	Đurđevac	5012
	Podravske Sesvete	5031
KOMUNALIJE d.o.o., Ilok	Ilok	7060
KOMUNALIJE d.o.o., Novalja	Novalja	1074
KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma	Čazma	6011
KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac	Vrgorac	2137
KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag	Pag	1086
	Mandre	101057
KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin	Knin	1036

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje	Naziv aglomeracije	ID aglomeracije
KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Gunja	Gunja	7027
KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi	Cavtat	1015
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica	Koprivnica	5021
KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina	Krapina	4044
LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići	Mošćenička Draga	1070
	Opatija-Lovran	1081
LIP-KOM d.o.o., Lipovljani	Lipovljani	4054
LOPARKO d.o.o., Lopar	Lopar	1052
MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec	Donji Kraljevec	5045
	Novo Selo na Dravi	5057
	Podturen	5060
	Čakovec	101339
	Belica	5041
	Držimurec	5047
	Goričan	5049
	Podbrest	5059
	Turčišće	5065
	Donja Dubrava	5044
	Mursko Središće	5056
METKOVIĆ d.o.o., Metković	Metković	1067
MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac	Donji Miholjac	5001
MOSLAVINA d.o.o., Kutina	Popovača	4066
	Voloder	4088
	Kutina	4051
NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice	Našice	5004
NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula	Janjina	1032
	Korčula	1043
	Lumbarda	1056
ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o., Bibinje	Bibinje-Sukošan	101390
ODVODNJA HVAR d.o.o., Hvar	Hvar	1027
ODVODNJA Kali d.o.o., Kali	Kali	1034
ODVODNJA Opuzen d.o.o., Opuzen	Opuzen	1082
ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreč	Vrsar	1069
	Poreč-Jug	1094
	Lanterna	101444
	Poreč-Sjever	1095
ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., Rovinj	Rovinj	101105
ODVODNJA SAMOBOR d.o.o., Samobor	Samobor	4011
ODVODNJA SLIVNO d.o.o., Podgradina	Malostonski zaljev	1062
ODVODNJA, d.o.o., Zadar	Zadar	1171
	Starigrad Zadarski	1134
	Posedarje	1096
	Škabrnja	2126
	Ražanac	1115
OTOK UGLJAN d.o.o., Preko	Preko	1100
	Ugljan	1155
PARK ODVODNJA d.o.o., Buzet	Buzet	3026
PONIKVE VODA d.o.o., Krk	Omišalj	1080
	Klimno-Šilo	1020
	Baška	1003
	Krk	1047
	Malinska-Njivice	1061
	Punat	1109
PRAGRANDE d.o.o., Pula	Pula-Centar	1107
	Pula-Sjever	1108
PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o., Primošten	Primošten	101294
PRIVREDA d.o.o., Petrinja	Lekenik	4053
	Petrinja	4063
RAD d.o.o., Drniš	Drniš	1022

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje	Naziv aglomeracije	ID aglomeracije	
SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak	Sisak	4071	
	Sunja	4074	
TEKIJA d.o.o., Požega	Kaptol	6040	
	Kutjevo	6045	
	Velika	6089	
	Požega	6064	
	Pleternica	6061	
USLUGA d.o.o., Gospić	Gospić	2186	
USLUGA ODVODNJA d.o.o., Pazin	Pazin	3099	
VARKOM d.d., Varaždin	Jalžabet	5018	
	Lepoglava	5024	
	Ludbreg	5025	
	Novi Marof	5029	
	Varaždinske Toplice	5036	
	Veliki Bukovec	101061	
	Varaždin	5035	
VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica	Mala Buna	101114	
	Velika Gorica	4010	
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci	Cerna	7021	
	Ivankovo	7029	
	Otok (Vinkovci)	7034	
	Nuštar	7071	
	Babina Greda	7016	
	Jarmina	7061	
	Nijemci	7031	
	Novi Jankovci	7032	
	Vođinci	7051	
	Vrbanja	7052	
	Vinkovci	7050	
	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski	Jadranovo	1031
		Klenovica	1038
Crikvenica		1018	
Novi Vinodolski		1075	
VIOP d.o.o., Pregrada	Pregrada	4068	
VIRKOM d.o.o., Virovitica	Suhopolje	5128	
	Gradina	5093	
	Virovitica	5132	
VODA d.o.o., Orahovica	Čačinci	5077	
	Orahovica	5113	
VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica	Garešnica	6025	
	Hercegovac	6032	
VODAKOM d.o.o., Pitomača	Pitomača	5118	
VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko	Jastrebarsko	4039	
VODE LIPIK d.o.o., Pakrac	Lipik-Pakrac	6047	
VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar	Rovišće	6069	
	Bjelovar	6008	
VODNE USLUGE d.o.o., Križevci	Križevci	4048	
VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres	Mali Lošinj	1060	
	Cres	1017	
	Martinšćica	1064	
	Nerezine	1072	
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb	Gudci	4005	
	Zagreb	4008	
	Glavničica	4007	
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb	Brckovljani	4018	
	Dubrava	4027	
	Gradec	101430	
	Križ-Novoselec	101127	
	Lipovec Lonjski	101441	

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje	Naziv aglomeracije	ID aglomeracije
	Paukovec	101437
	Polonje	101436
	Sveti Ivan Zelina	4075
	Ivanić Grad	4037
	Rugvica	4002
	Vrbovec	4089
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić	Zaprešić	4009
VODORAD d.o.o., Đurđenovac	Sušine-Đurđenovac	5006
VODOVOD - VIR d.o.o., Vir	Nin	1073
	Vir	1063
VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar	Sutivan	1044
	Bol	1008
	Milna	1068
	Postira	1097
	Supetar	1141
VODOVOD d.o.o., Blato	Vela Luka	101058
	Blato	1007
	Smokvica-Brna	1130
VODOVOD d.o.o., Makarska	Brela	1010
	Tučepi	1153
	Makarska	1058
	Baška Voda	1004
	Drvenik	1023
	Podgora	1092
	Promajna-Krvavica	101495
	Živogošće	1175
VODOVOD d.o.o., Omiš	Dugi Rat	101296
	Omiš	1079
	Mimice	101359
VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod	Slavonski Brod	6077
	Beravci	6006
	Brodski Stupnik	6009
	Donji Andrijevc	6016
	Garčin	6024
	Gundinci	6031
	Oriovac	6057
	Slavonski Šamac	6079
	Vrpolje	6099
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik	Zaton	1173
	Dubrovnik	1024
	Župa Dubrovačka	1178
VODOVOD GLINA d.o.o., Glina	Glina	4031
VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar	Vukovar	7081
VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje	Grubišno Polje	6029
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac	Karlovac-Duga Resa	4040
	Draganić	4026
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin	Ogulin	2003
	Josipdol	2002
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split	Kaštela-Trogir	1037
	Split-Solin	1131
	Čiovo	201118
	Marina	1063
	Muč	2078
	Vinišće	101396
VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj	Trilj	1150
	Dicmo	101358
	Sinj	1126
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac	Benkovac	2011
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić	Orebić	1084

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje	Naziv aglomeracije	ID aglomeracije
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj	Senj	1123
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik	Vodice	1165
	Rogoznica	1117
	Betina-Murter	1005
	Šibenik	1124
	Bilice	101471
	Pirovac-Tisno-Jezera	1088
VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža	Vis	1164
	Komiža	1042
VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski	Imotski	2052
VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina	Donja Zdenčina	4024
VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica	Plitvička jezera	2005
VODOVOD LABIN d.o.o., Labin	Rabac	1112
	Raša	1113
	Labin	3068
VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska	Novska	4060
VODOVOD POVLJANA d.o.o., Poveljana	Poveljana	1099
VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška	Batrina	6002
	Davor	6013
	Okučani	6055
	Staro Petrovo Selo	6081
	Nova Gradiška	6051
VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek	Ernestinovo	101031
	Dalj	7006
	Osijek	7012
VRELO d.o.o., Rab	Supetarska Draga	1142
	Rab	1111
ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok	Krapinske Toplice	4045
	Jakovlje	101060
	Zabok	4060
	Zlatar	4091

Uslužno područje	Popis aglomeracija manjih od 2.000 ES	Broj aglomeracija
1	Štrigova, Bogdanovec	2
2	Donji Martijanec, Struga, Leskovec Toplički, Hum Breznički, Slanje, Donja Višnjica, Gornja Voća, Visoko, Sveti Ilija, Donja Poljana, Bedenec, Čukovec, Pudevčevo, Hrastovsko, Breznica, Sveti Petar Ludbreški, Lovrečan, Selnik, Ključ, Završje Podbelsko, Donja Voća, Bednja, Žarovnica, Beletinec, Klenovnik, Kapela Kalnička, Oštrice - Novi Marof	27
3	Gornja Rijeka, Prkos, Sveti Petar Orehovac, Pustakovec, Selnica Podravska, Legrad, Ivanec Križevački, Sveti Ivan Žabno	8
4	Sveta Ana, Mičetinac, Sirova Katalena, Berek, Hrastovac, Ždala, Kaniška Iva, Zrinski Topolovac, Veliki Bastaji, Velika Trnovitica, Tomašica, Kapela, Šandrovac, Bedenik, Severin, Dežanovac, Ivanska, Velika Pisanica, Narta, Prespa, Đulovac, Nova Rača, Veliki Grđevac, Sirač, Molve, Kalinovac, Veliko Trojstvo, Končanica, Mali Zdenci-Veliki Zdenci, Ferdinandovac, Gola	31
5	Zvonimirovac, Dobrović, Donji Meljani, Novi Gradac, Crnac, Gornji Miholjac, Vukosavljevića, Sedlarica, Staro Petrovo Polje, Cabuna, Podravska Moslavina, Novi Senkovec, Orešac, Lukač, Terezino Polje, Nova Bukovica, Brezovica, Bušetina, Stari Gradac, Voćin, Mikleuš, Kapinci, Čađavica, Zdenci, Gornje Bazje	25
6	Trnava, Levanjska Varoš, Gašinci, Šaptinovci, Široko Polje, Poganovci, Drenje, Gorjani, Podgorač, Feričanci	10
7	Kozarac, Grabovac, Batina, Popovac, Čeminac, Zmajevac, Draž	7
8	Vinogradci, Nard, Aljmaš, Petrova Slatina, Vuka, Magadenovac, Sveti Đurađ, Marjančaci, Rakitovica, Petlovac, Viljevo, Vladislavci	12
9	Dol Klanječki, Belečka Selnica, Jurjevec, Tuheljske Toplice, Tuhelj, Desinić, Budinščina, Kumrovec, Radoboj, Klanjec, Đurmanec	11
10		0
11	Trpuci, Gudci Draganički, Horvati, Galgovo	4

Uslužno područje	Popis aglomeracija manjih od 2.000 ES	Broj aglomeracija
12	Lukinić Brdo, Pokupsko, Bratina, Donja Kupčina, Pisarovina, Veleševac	6
13	Mlaka, Sišćani, Pobjenik, Dubrovčak, Rakovec, Preseka, Poljanski Lug, Stara Marča, Markovac, Vagovina, Čemernica, Žabnica, Farkaševac, Bedenica, Deanovec, Lupoglav	16
14	Donji Velemerić, Barilović, Krnjak, Šišljavić, Saborsko, Mahićno, Kamanje, Tounj, Lasinja, Generalski Stol, Belajske Poljice, Jasenak, Rečica, Cerovac Vukmanički, Žakanje, Plaški, Vojnić, Ozalj, Krašić	19
15	Gornji Hrastovac, Donji Kukuruzari, Komogovina-Borojevići-Mečenčani, Majur-Stubalj-Graboštani, Topusko, Gvozd	6
16		0
17	Okoli, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Banova Jaruga, Rajić, Velika Ludina, Stara Subocka, Stružec	8
18	Vlatkovac, Kneževac, Venje, Bertelovci, Zarišć, Brezine, Hrnjevac, Stara Lipa, Marino Selo, Gaj, Alilovci, Ratkovića, Poreč, Nova Ljeskovića, Grabarje, Rajsavac, Bektež, Češljakovci-Golo Brdo, Badljevin, Poljana, Boričević, Eminovci, Čaglin, Vetovo, Brodski Drenovac	25
19	Gredani, Baničevac, Dolina, Mačkovac, Podvrško, Šagovina Cernička, Dragovci, Vrbovljani, Gorice, Dragalić, Medari, Orubica, Bačin Dol, Komarnica, Stara Gradiška, Ljupina, Siče, Vrbje	18
20	Dubočac, Krajačići, Šušnjevi, Vrhovina, Brodski Zdenci, Ravan, Pričac, Stupnički Kuti, Klokočevik, Jaruge, Kaniža, Zadubravlje, Zbjeg, Bebrina, Slavonski Kobaš, Klakar, Oprisavci, Novi Grad, Lužani	19
21	Podgrađe, Korog, Strošinci, Đeletovci, Banovci, Ostrovo, Ilača, Račinovci, Lipovac, Soljani, Tordinci, Markušica, Tovarnik	13
22	Mohovo, Vera, Pačetin, Sotin, Petrovci, Čakovci, Lovas, Negoslavci, Bapska, Bobota	10
23	Završje, Kloštar, Butoniga, Grimalda, Šćulci-Paladini, Oprtalj, Draguč, Lanišće, Marčenegla, Boljun, Vranja, Rudani, Grdoselo, Pagubice, Kršete, Vrh, Crklada, Kašćerga, Grožnjan, Lupoglav Istarski, Mandalenčići, Cerovlje, Pičan, Sveti Lovreč Pazenatički, Livade, Karojba, Vižinada, Tinjan, Roč-Stanica Roč, Gračišće, Motovun, Trviž, Sveti Petar u Šumi, Kaldanija-Plovanija-Kaštel, Bale, Višnjan, Žminj, Kaštelir-Labinci	38
24	Prhati, Topid, Tunarica, Kršan, Plomin, Barban, Svetvinčenat, Koromačno, Potpićan, Brijuni, Marčana	11
25	Kuželj, Severin na Kupi, Brod na Kupi, Crni Lug, Studena, Čabar, Brod Moravice, Moravice, Prezid, Skrad, Tršće, Gerovo, Lokve, Mrkopalj, Klana, Ravna Gora, Vrbovsko	17
26	Unije, Dobrinj, Ilovik, Susak, Valun, Vrbnik	6
27	Tribalj, Grižane, Bribir	3
28	Košljun, Dinjiška, Vlašići, Stinica, Sveti Juraj	5
29	Donji Babin Potok, Lovinac Lički, Perušić, Vrhovine, Udbina, Donji Lapac, Brinje, Lički Osik, Korenica	9
30	Dragove, Premuda, Rava, Jasenice, Molat, Brbinj, Olib, Sestrunj, Ist, Jovići, Mali Iž, Donji Srb, Veli Rat, Veli Iž, Žman, Silba, Božava, Novigrad Zadarski, Rovanska, Maslenica, Obrovac, Gornji Karin, Sali, Zemunik Donji, Kruševo (Novigrad Zadarski), Poličnik, Kukljica, Pridraga, Vinjerac	29
31	Gornje Biljane-Ograde, Miranje-Gaj, Benkovačko Selo-Kukalj, Buković-Gaj, Kakma, Pristeg, Korlat, Donji Karin, Rašević, Vukšić, Tinj, Islam Grčki, Lišane Ostrovičke, Polača, Ždrelec, Tkon	16
32	Ružić, Unešić, Banjevci, Oklaj, Rupe, Zaton (Šibenik), Lozovac, Primorski Dolac, Zlarin, Golubić, Stankovci, Skradin, Kistanje	13
33	Gizdovac-Prisike, Drvenik Veliki, Brstanovo, Crivac, Maslinica, Prugovo, Stomorska, Nečujam	8
34	Ježević, Civljane, Donji Bitelić, Gljev, Tijarica, Ugljane, Vinalić, Udovičić, Kijevo, Ruda, Potravlje, Turjaci, Vrljka, Obrovac Sinjski, Hrvace	15
35	Čelina, Marušići, Pisak, Šestanovac, Stanići	5
36	Murvica (Bol), Bobovišća - Ložišća, Nerežišća, Povolja, Splitska, Sućuraj, Milna (Hvar), Sumartin, Pučišća	9
37	Dobranje, Svib, Studenci, Cista Provo, Aržano, Cista, Zagvozd, Lovreć, Drašnice, Zaostrog, Igrane	11
38	Kula Norinska, Prud, Blace, Komin	4
39	Pupnat, Račišće, Lastovo, Mljet	4
40	Suđurađ, Zaton Doli, Trsteno, Koločep, Lopud	5
41	Molunat, Gruda	2
Ukupno		487

4.1.3 Ostali projekti i projekti koji se provode na nacionalnoj razini

	Projekt	
1N	Interventna mjera ugradnje klorinatora na vodozahvatima u zonama opskrbe lokalnih vodovoda	javna vodoopskrba
2N	Projekt ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe	javna vodoopskrba
3N	Projekt poticanja energetske učinkovitosti	javna vodoopskrba i javna odvodnja
4N	Projekt uspostave kibernetičke sigurnosti	javna vodoopskrba i javna odvodnja

4.2 Indikator: Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji po Projektima

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
1	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	109.191	109.451			109.191	99,8%
2	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	16.376	16.816			16.376	97,4%
2	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	141.022	147.527			141.022	95,6%
3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	45.448	47.604			45.448	95,5%
3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	22.470	27.754			22.470	81,0%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	17.406	18.738			17.406	92,9%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela	2.573	2.665			2.573	96,5%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	25.442	26.562			25.442	95,8%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	7.912	9.559			7.912	82,8%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	7.803	10.179			7.803	76,7%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	41.172	44.956			41.172	91,6%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac	3.164	3.700			3.164	85,5%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	5.174	5.418			5.174	95,5%
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina	20.985	21.186			20.985	99,1%
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica	35.375	35.375			35.375	100,0%
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica	8.420	9.110			8.420	92,4%
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača	9.145	9.204			9.145	99,4%
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	41.106	41.962			41.106	98,0%
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	19.753	20.703			19.753	95,4%
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac	5.677	5.770			5.677	98,4%
7	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	19.411	19.914			19.411	97,5%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo	20.421	20.529			20.421	99,5%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće	11.753	11.754			11.753	100,0%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	12.013	12.051			12.013	99,7%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDNOST d.o.o. Čepin	9.706	9.706			9.706	100,0%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda	12.374	12.471			12.374	99,2%

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblje	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	116.390	117.354			116.390	99,2%
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	3.899	4.434			3.899	87,9%
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	20.402	22.102			20.402	92,3%
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada	5.440	5.794			5.440	93,9%
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	73.799	89.821			73.799	82,2%
10	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	43.553	43.561			43.553	100,0%
10	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra	6.420	6.420			6.420	100,0%
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	15.105	15.142			15.105	99,8%
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac	444	602			444	73,8%
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	799.569	848.359			799.569	94,2%
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	5.204	5.204			5.204	100,0%
12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	64.969	68.513			64.969	94,8%
12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina	3.541	3.559			3.541	99,5%
13	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	6.852	7.173			6.852	95,5%
13	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	84.407	94.185			84.407	89,6%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj	4.435	5.138			4.435	86,3%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	17.470	18.586			17.470	94,0%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj	8.857	9.067			8.857	97,7%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić	1.973	2.098			1.973	94,0%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	53.889	54.863			53.889	98,2%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	17.859	18.779			17.859	95,1%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	3.404	4.259			3.404	79,9%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	1.034	1.224			1.034	84,5%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	3.439	3.810			3.439	90,3%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	1.621	2.694			1.621	60,2%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	20.438	22.668			20.438	90,2%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	2	1.276			2	0,2%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	3.251	3.729			3.251	87,2%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	4.798	5.931			4.798	80,9%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	0	81			0	0,0%

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblje	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
16	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	48.458	49.621			48.458	97,7%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	1.548	1.552			1.548	99,7%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	3.065	3.065			3.065	100,0%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	30.368	32.319			30.368	94,0%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	1.287	1.470			1.287	87,6%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	11.702	11.752			11.702	99,6%
18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKIJIA d.o.o. Požega	51.677	53.889			51.677	95,9%
18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	9.694	10.836			9.694	89,5%
19	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	29.029	34.853			29.029	83,3%
20	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	2.810	2.970			2.810	94,6%
20	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	89.998	95.700			89.998	94,0%
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci	4.109	4.109			4.109	100,0%
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja	16.824	16.824			16.824	100,0%
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja	2.882	2.882			2.882	100,0%
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	86.829	86.947			86.829	99,9%
22	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	6.374	6.374			6.374	100,0%
22	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	35.281	35.310			35.281	99,9%
23	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	97.249	99.858			97.249	97,4%
24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Pula	85.523	87.050			85.523	98,2%
24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	20.263	20.590			20.263	98,4%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	173.474	175.679			173.474	98,7%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	12.157	12.474			12.157	97,5%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o. Čabar	2.935	3.108			2.935	94,4%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	27.226	27.317			27.226	99,7%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko	4.133	4.163			4.133	99,3%
26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	19.270	20.452			19.270	94,2%
26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	10.359	10.639			10.359	97,4%
27	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski	18.810	18.868			18.810	99,7%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU CRNO VRILLO d.o.o. Karlobag	539	767			539	70,3%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	3.663	3.938			3.663	93,0%

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblje	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	4.495	4.762			4.495	94,4%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	5.393	5.938			5.393	90,8%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	739	739			739	100,0%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab	9.181	9.201			9.181	99,8%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac	639	659			639	97,0%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	9.300	9.782			9.300	95,1%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina	1.143	1.325			1.143	86,3%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica	2.053	2.123			2.053	96,7%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	13.026	13.588			13.026	95,9%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VISOČICA d.o.o. Donji Lapac	1.313	1.391			1.313	94,4%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje	2.233	2.566			2.233	87,0%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	3.324	3.483			3.324	95,4%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	2.815	3.099			2.815	90,8%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali	521	1.603			521	32,5%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko	3.479	3.859			3.479	90,2%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica	100	571			100	17,5%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	1.000	3.154			1.000	31,7%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	113.194	116.288			113.194	97,3%
31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	15.618	17.296			15.618	90,3%
31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	8.446	10.203			8.446	82,8%
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	12.055	12.624			12.055	95,5%
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš	6.408	6.512			6.408	98,4%
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	125	515			125	24,3%
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	80.193	82.135			80.193	97,6%
33	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	275.075	285.826			275.075	96,2%
33	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	184	300			184	61,3%
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo	272	272			272	100,0%
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrljika	1.898	1.916			1.898	99,1%
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	42.639	43.271			42.639	98,5%
35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	22.007	22.770			22.007	96,6%

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup vodi				
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblje	ukupno postignuta vrijednost indikatora
		broj	broj	broj	broj	broj %
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	10.599	11.204			10.599 94,6%
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	13.832	14.444			13.832 95,8%
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	3.339	3.483			3.339 95,9%
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	23.298	23.806			23.298 97,9%
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	0	245			0 0,0%
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	24.804	25.709			24.804 96,5%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	10.317	10.347			10.317 99,7%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	6.962	7.171			6.962 97,1%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković	16.550	16.553			16.550 100,0%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2.996	3.107			2.996 96,4%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen	3.135	3.135			3.135 100,0%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište	553	553			553 100,0%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	629	667			629 94,3%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	8.054	8.448			8.054 95,3%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje	0	301			0 0,0%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato	8.350	8.398			8.350 99,4%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1.296	1.826			1.296 71,0%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	3.560	4.031			3.560 88,3%
40	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	52.055	54.127			52.055 96,2%
41	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 41 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	8.036	8.324			8.036 96,5%
	Ukupno	3.808.525	3.996.101			3.808.525 95,3%

4.3 Indikator: Smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode prema Projektima

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
1	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	109.191	109.451			109.191	99,8%
2	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	16.083	16.816			16.083	95,6%
2	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	139.479	147.527			139.479	94,5%
3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	45.398	47.604			45.398	95,4%
3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	22.372	27.754			22.372	80,6%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	2.357	18.738			2.357	12,6%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela	2.573	2.665			2.573	96,5%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	25.442	26.562			25.442	95,8%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	4.677	9.559			4.677	48,9%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica		10.179			0	0,0%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	41.172	44.956			41.172	91,6%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac	3.164	3.700			3.164	85,5%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	5.174	5.418			5.174	95,5%
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina	20.985	21.186			20.985	99,1%
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica	35.375	35.375			35.375	100,0%
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica	8.338	9.110			8.338	91,5%
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača	9.145	9.204			9.145	99,4%
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	5.795	41.962			5.795	13,8%
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice		20.703			0	0,0%
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac	5.579	5.770			5.579	96,7%
7	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	9.112	19.914			9.112	45,8%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo		20.529			0	0,0%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće	11.753	11.754			11.753	100,0%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac		12.051			0	0,0%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDNOST d.o.o. Čepin	9.706	9.706			9.706	100,0%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda	12.374	12.471			12.374	99,2%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	5.817	117.354			5.817	5,0%
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	3.821	4.434			3.821	86,2%
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	16.875	22.102			16.875	76,4%

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada	5.440	5.794			5.440	93,9%
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	71.177	89.821			71.177	79,2%
10	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	43.553	43.561			43.553	100,0%
10	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra	6.420	6.420			6.420	100,0%
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	14.895	15.142			14.895	98,4%
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac	258	602			258	42,9%
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	509.279	848.359			509.279	60,0%
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	5.204	5.204			5.204	100,0%
12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	63.938	68.513			63.938	93,3%
12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina	3.541	3.559			3.541	99,5%
13	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma		7.173			0	0,0%
13	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	12.982	94.185			12.982	13,8%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj	3.518	5.138			3.518	68,5%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	12.378	18.586			12.378	66,6%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj	7.949	9.067			7.949	87,7%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić	1.875	2.098			1.875	89,4%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	53.889	54.863			53.889	98,2%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	6.353	18.779			6.353	33,8%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	3.050	4.259			3.050	71,6%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	1.034	1.224			1.034	84,5%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	3.354	3.810			3.354	88,0%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	1.600	2.694			1.600	59,4%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	20.438	22.668			20.438	90,2%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak		1.276			0	0,0%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	3.188	3.729			3.188	85,5%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	4.626	5.931			4.626	78,0%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja		81			0	0,0%
16	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	47.675	49.621			47.675	96,1%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	1.548	1.552			1.548	99,7%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	3.065	3.065			3.065	100,0%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	30.202	32.319			30.202	93,4%

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	1.287	1.470			1.287	87,6%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	11.702	11.752			11.702	99,6%
18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKLIJA d.o.o. Požega	49.810	53.889			49.810	92,4%
18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	9.691	10.836			9.691	89,4%
19	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška		34.853			0	0,0%
20	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	751	2.970			751	25,3%
20	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	18.091	95.700			18.091	18,9%
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci		4.109			0	0,0%
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja		16.824			0	0,0%
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja		2.882			0	0,0%
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	15.351	86.947			15.351	17,7%
22	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok		6.374			0	0,0%
22	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar		35.310			0	0,0%
23	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	97.249	99.858			97.249	97,4%
24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Pula	85.523	87.050			85.523	98,2%
24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	20.263	20.590			20.263	98,4%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	173.474	175.679			173.474	98,7%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	11.202	12.474			11.202	89,8%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o. Čabar	33	3.108			33	1,1%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	27.211	27.317			27.211	99,6%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko	4.126	4.163			4.126	99,1%
26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	2.942	20.452			2.942	14,4%
26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	10.359	10.639			10.359	97,4%
27	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski	18.810	18.868			18.810	99,7%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o. Karlobag		767			0	0,0%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja		3.938			0	0,0%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	3.351	4.762			3.351	70,4%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	5.393	5.938			5.393	90,8%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana		739			0	0,0%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab	9.181	9.201			9.181	99,8%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLIJA d.o.o. Lovinac	631	659			631	95,8%

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	9.300	9.782			9.300	95,1%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina	1.068	1.325			1.068	80,6%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica	2.053	2.123			2.053	96,7%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	12.767	13.588			12.767	94,0%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VISOČICA d.o.o. Donji Lapac	1.313	1.391			1.313	94,4%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje	2.233	2.566			2.233	87,0%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	3.183	3.483			3.183	91,4%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	183	3.099			183	5,9%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali		1.603			0	0,0%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko		3.859			0	0,0%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica		571			0	0,0%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir		3.154			0	0,0%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar		116.288			0	0,0%
31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru		17.296			0	0,0%
31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	3.051	10.203			3.051	29,9%
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	758	12.624			758	6,0%
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš	6.243	6.512			6.243	95,9%
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	125	515			125	24,3%
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	79.929	82.135			79.929	97,3%
33	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	8.285	285.826			8.285	2,9%
33	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	84	300			84	28,0%
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo	272	272			272	100,0%
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrljika	1.862	1.916			1.862	97,2%
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	40.969	43.271			40.969	94,7%
35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	22.007	22.770			22.007	96,6%
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	10.242	11.204			10.242	91,4%
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar		14.444			0	0,0%
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	3.339	3.483			3.339	95,9%
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	13.552	23.806			13.552	56,9%
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	0	245			0	0,0%
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	1.094	25.709			1.094	4,3%

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	2.143	10.347			2.143	20,7%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	6.962	7.171			6.962	97,1%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković		16.553			0	0,0%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula		3.107			0	0,0%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen		3.135			0	0,0%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište		553			0	0,0%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj		667			0	0,0%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	7.507	8.448			7.507	88,9%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje		301			0	0,0%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato		8.398			0	0,0%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1.077	1.826			1.077	59,0%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić		4.031			0	0,0%
40	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	8.331	54.127			8.331	15,4%
41	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 41 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	8.036	8.324			8.036	96,5%
	Ukupno	2.348.585	3.996.101			2.348.585	58,8%

4.4 Indikator: Smanjenje gubitaka iz sustava javne vodoopskrbe prema Projektima

№	Projekt (kratki naziv)	omjer između zahvaćene i isporučene količine vode				
		početna*	ciljana*	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješći	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora
		%	%			
1	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	31%	20%			31%
2	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	51%	20%			51%
2	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	37%	20%			37%
3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	12%	12%			12%
3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	34%	20%			34%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	40%	20%			40%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela	21%	20%			21%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	25%	20%			25%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	43%	20%			43%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	48%	20%			48%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	35%	20%			35%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac	9%	9%			9%
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	45%	20%			45%
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina	32%	20%			32%
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica	34%	20%			34%
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica	34%	20%			34%
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača	20%	20%			20%
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	36%	20%			36%
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	54%	20%			54%
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac	55%	20%			55%
7	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	48%	20%			48%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo	38%	20%			38%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće	17%	17%			17%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	32%	20%			32%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDNOST d.o.o. Čepin	32%	20%			32%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda	24%	20%			24%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	34%	20%			34%
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	29%	20%			29%
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	19%	19%			19%
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada	43%	20%			43%
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	39%	20%			39%

UP	Projekt (kratki naziv)	omjer između zahvaćene i isporučene količine vode				
		početna*	ciljana*	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješći	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora
		%	%			
10	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	34%	20%			34%
10	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra	45%	20%			45%
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	55%	20%			55%
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac	45%	20%			45%
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	48%	20%			48%
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	50%	20%			50%
12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	15%	15%			15%
12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina	31%	20%			31%
13	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	43%	20%			43%
13	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	26%	20%			26%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj	71%	20%			71%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	61%	20%			61%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj	43%	20%			43%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić	44%	20%			44%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	60%	20%			60%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	70%	20%			70%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	69%	20%			69%
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	65%	20%			65%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	81%	20%			81%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	73%	20%			73%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	70%	20%			70%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	52%	20%			52%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	49%	20%			49%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	61%	20%			61%
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	65%	20%			65%
16	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	52%	20%			52%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	68%	20%			68%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	15%	15%			15%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	22%	20%			22%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	1%	1%			1%
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	33%	20%			33%
18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKLIJA d.o.o. Požega	40%	20%			40%
18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	47%	20%			47%

UP	Projekt (kratki naziv)	omjer između zahvaćene i isporučene količine vode				
		početna*	ciljana*	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješći	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora
		%	%			
19	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	46%	20%			46%
20	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	36%	20%			36%
20	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	61%	20%			61%
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci	22%	20%			22%
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja	37%	20%			37%
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja	51%	20%			51%
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	43%	20%			43%
22	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	42%	20%			42%
22	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	26%	20%			26%
23	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	24%	20%			24%
24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Pula	20%	20%			20%
24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	26%	20%			26%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	44%	20%			44%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	42%	20%			42%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o. Čabar	69%	20%			69%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	23%	20%			23%
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko	56%	20%			56%
26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	23%	20%			23%
26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	23%	20%			23%
27	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski	45%	20%			45%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o. Karlobag	60%	20%			60%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	23%	20%			23%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	43%	20%			43%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	62%	20%			62%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Povljana	61%	20%			61%
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab	29%	20%			29%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac	26%	20%			26%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	80%	20%			80%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina	25%	20%			25%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica	48%	20%			48%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	71%	20%			71%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VIŠOČICA d.o.o. Donji Lapac	68%	20%			68%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje	87%	20%			87%

UP	Projekt (kratki naziv)	omjer između zahvaćene i isporučene količine vode				
		početna*	ciljana*	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješći	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora
		%	%			
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	90%	20%			90%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	89%	20%			89%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali	45%	20%			45%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko	45%	20%			45%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica	46%	20%			46%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	45%	20%			45%
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	63%	20%			63%
31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	45%	20%			45%
31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	73%	20%			73%
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	72%	20%			72%
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš	57%	20%			57%
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	60%	20%			60%
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	56%	20%			56%
33	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	60%	20%			60%
33	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	56%	20%			56%
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo	61%	20%			61%
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrljika	70%	20%			70%
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	43%	20%			43%
35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	15%	15%			15%
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	35%	20%			35%
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	17%	17%			17%
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	27%	20%			27%
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	45%	20%			45%
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	15%	15%			15%
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	75%	20%			75%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	63%	20%			63%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	81%	20%			81%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković	25%	20%			25%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	31%	20%			31%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen	59%	20%			59%
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište	64%	20%			64%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	27%	20%			27%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	31%	20%			31%

UP	Projekt (kratki naziv)	omjer između zahvaćene i isporučene količine vode				
		početna*	ciljana*	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješći	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora
		%	%			
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje	45%	20%			45%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato	59%	20%			59%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	22%	20%			22%
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	47%	20%			47%
40	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	22%	20%			22%
41	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 41 na VP JIVU KONAOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	28%	20%			28%
Ukupno						

*Indikativna vrijednost prema izvještajima javnih isporučitelja za 2019. godinu, preciznija početna vrijednost pokazatelja će se utvrditi pri izradi detaljne tehničke dokumentacije

4.5 Indikator: Priključenost opterećenja na sustav javne odvodnje prema javnim isporučiteljima

Isporučitelj usluge javne odvodnje	Početna vrijednost - priključeno opterećenje			Ciljano priključeno opterećenje			Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću			Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju			Ukupno postignuta vrijednost indikatora									
	usklađeno	neusklađeno	uvjetno	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	Es	%	Es	%	Es	%	
	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	Es	%	Es	%	Es	%	Es	%		
6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag			73.608		0	77.927																
ALBANEŽ d.o.o., Pomer		21.699			37.028	0																
BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir		10.907			16.873	0																
CRNO VRILO d.o.o., Karlobag		1.759			2.045	0																
DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar		14.882			16.972	0																
DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci		0			2.197	0																
DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Slano		2.487			3.172	0																
DVORAC d.o.o., Valpovo		0			9.972	0																
ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo		21.997			36.586	0																
GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac		2.619			3.002	0																
HIDROBEL d.o.o., Belišće		17.970			21.674	0																
HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli		1.439			2.083	0																
HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa		5.076			14.504	0																
IVKOM - VODE d.o.o., Ivanec		5.784			10.544	0																
IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj		0			4.033	0																
IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče		8.576			16.430	0																
JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica			2.027		0	2.084																
KANFANAR ODVODNJA d.o.o., Kanfanar		2.000			2.744	0																
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka		131.082			192.614	0																
KOMRAD d.o.o., Slatina		10.714			14.651	0																
KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor		930			2.206	0																
KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice		3.684			7.350	0																

Isporučitelj usluge javne odvodnje	Početna vrijednost - priključeno opterećenje			Ciljano priključeno opterećenje			Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću			Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju			Ukupno postignuta vrijednost indikatora					
	usklađeno	neusklađeno	uvjetno	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)		uvjetno (postaje usklađeno)		
	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	Es	%	Es	%	Es	%
KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru		26.540			52.464	0												
KOMUNALAC d.o.o., Otočac		4.075			5.996	0												
KOMUNALAC d.o.o., Slunj		1.342			1.984	0												
KOMUNALAC d.o.o., Županja		13.854			24.026	0												
KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac		7.032			17.972	0												
KOMUNALIJE d.o.o., Ilok			8.101		0	8.586												
KOMUNALIJE d.o.o., Novalja		23.081			28.345	0												
KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma		2.789			3.679	0												
KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac		2.586			3.483	0												
KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag		2.652			18.194	0												
KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin		10.165			12.487	0												
KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Gunja		0			6.084	0												
KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi		2.264			2.959	0												
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica		52.789			66.576	0												
KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina		6.702			10.251	0												
LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići		32.125			36.732	0												
LIP - KOM d.o.o., Lipovljani		1.508			2.391	0												
LOPARKO d.o.o., Lopar	11.750			11.750	0	0	11.750	-	-	-	-	-	11.750	100%	-	-	-	-
MEDIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec	3.087	65.983		3.087	140.716	0	3.087						3.087	100%				
METKOVIĆ d.o.o., Metković		9.617			15.659	0												
MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac	8.250			8.250	0	0	8.250						8.250	100%				
MOSLAVINA d.o.o., Kutina		21.618			33.442	0												
NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice		12.824			18.360	0												
NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula		5.584			13.318	0												
ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o., Bibinje		5.385			15.918	0												
ODVODNJA HVAR d.o.o., Hvar			13.033		0	13.496												

Isporučitelj usluge javne odvodnje	Početna vrijednost - priključeno opterećenje			Ciljano priključeno opterećenje			Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću			Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju			Ukupno postignuta vrijednost indikatora					
	usklađeno	neusklađeno	uvjetno	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)		neusklađeno (postaje usklađeno)		uvjetno (postaje usklađeno)	
	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	Es	%	Es	%	Es	%
ODVODNJA Kali d.o.o., Kali		460			2.851	0												
ODVODNJA Opuzen d.o.o., Opuzen		1.770			3.824	0												
ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreč	77.987		27.285	77.987	0	27.745	77.987						77.987	100%				
ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o., Rovinj	57.946			57.946	0	0	57.946						57.946	100%				
ODVODNJA SAMOBOR d.o.o., Samobor		24.621			31.256	0												
ODVODNJA SLIVNO d.o.o., Podgradina		12.000			14.662	0												
ODVODNJA, d.o.o., Zadar		68.877			120.860	0												
OTOK UGLJAN d.o.o., Preko		2.631			7.985	0												
PARK ODVODNJA d.o.o., Buzet		5.312			6.217	0												
PONIKVE VODA d.o.o., Krk		39.440	12.834		67.704	13.245												
PRAGRANDE d.o.o., Pula		31.950	78.042		48.751	84.644												
PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o., Primošten		3.281			8.984	0												
PRIVREDA d.o.o., Petrinja		10.602			24.868	0												
RAD d.o.o., Drniš		2.157			3.186	0												
SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak		31.084			53.827	0												
TEKIJA d.o.o., Požega		35.296			52.310	0												
USLUGA d.o.o., Gospić		4.256			7.959	0												
USLUGA ODVODNJA d.o.o., Pazin		4.332			6.449	0												
VARKOM d.d., Varaždin		119.271			176.133	0												
VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica		48.048			67.197	0												
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci		42.714			96.607	0												
VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski		40.371			53.561	0												
VIOP d.o.o., Pregrada		930			2.375	0												
VIRKOM d.o.o., Virovitica		25.441			33.335	0												
VODA d.o.o., Orahovica		0	4.875		2.068	4.963												
VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica		5.420			8.298	0												
VODAKOM d.o.o., Pitomača		1.938			8.300	0												
VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko		8.539			12.347	0												

Isporučitelj usluge javne odvodnje	Početna vrijednost - priključeno opterećenje			Ciljano priključeno opterećenje			Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću			Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju			Ukupno postignuta vrijednost indikatora					
	usklađeno	neusklađeno	uvjetno	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)		neusklađeno (postaje usklađeno)		uvjetno (postaje usklađeno)	
	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	Es	%	Es	%	Es	%
VODE LIPIK d.o.o., Pakrac		9.877			11.001	0												
VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar		44.256			51.461	0												
VODNE USLUGE d.o.o., Križevci		9.560			15.620	0												
VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres		29.318	9.452		35.199	9.986												
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb		838.698			950.775	0												
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb		43.238			85.874	0												
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić		30.726			52.530	0												
VODORAD d.o.o., Đurđenovac		2.820			4.694	0												
VODOVOD - VIR d.o.o., Vir		7.710			91.591	0												
VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar		14.319	7.712		20.618	8.206												
VODOVOD d.o.o., Blato		1.353			16.587	0												
VODOVOD d.o.o., Makarska	68.164	0	2.125	68.164	5.180	2.271	68.164						68.164	100%				
VODOVOD d.o.o., Omiš		11.745			24.466	0												
VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod		60.635			106.531	0												
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik		62.067			75.405	0												
VODOVOD GLINA d.o.o., Glina		5.555			6.987	0												
VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar		27.880			36.673	0												
VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje		1.959			3.797	0												
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac		40.088			66.086	0												
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin		4.910			11.541	0												
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split		205.004			337.956	0												
VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj		12.815			31.002	0												
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac		5.239			6.076	0												

Isporučitelj usluge javne odvodnje	Početna vrijednost - priključeno opterećenje			Ciljano priključeno opterećenje			Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću			Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju			Ukupno postignuta vrijednost indikatora					
	usklađeno	neusklađeno	uvjetno	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)		neusklađeno (postaje usklađeno)		uvjetno (postaje usklađeno)	
	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	Es	%	Es	%	Es	%
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić		1.000			8.673	0												
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj		6.450			8.413	0												
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik		56.598			126.291	0												
VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža	3.742		2.444	3.742	0	2.486	3.742						3.742	100%				
VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski		3.560			19.543	0												
VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina		852			3.974	0												
VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica		1.927			4.803	0												
VODOVOD LABIN d.o.o., Labin	11.843	9.527	1.832	11.843	13.718	1.983	11.843						11.843	100%				
VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska		8.120			10.419	0												
VODOVOD POVLJANA d.o.o., Poveljana			3.830		0	3.892												
VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška		16.578	2.294		32.563	2.346												
VODOVOD - OSIJEK d.o.o., Osijek		156.224			180.926	0												
VRELO d.o.o., Rab		19.802			28.097	0												
ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok		25.957			53.582	0												
REPUBLIKA HRVATSKA	242.769	2.921.228	249.494	242.769	4.408.283	263.857	242.769						242.769	100%				

4.6 Indikator: Usklađenost s obzirom na potrebnu razinu pročišćavanja prema javnim isporučiteljima

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtijevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija										
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Ciljana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora		
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%
1	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	3	30.000		1	3							1	33%
		3	59.000		1									
		2	8.000	1				1	100%					
2	ALBANEŽ d.o.o. Pomer	2	10.000		1	3								
		2	21.000		1									
		2	7.500		1									
3	BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	3	16.000		1	2							1	50%
		2	2.500	1				1	100%					
4	CRNO VRILO d.o.o. Karlobag	1	1.600		1	1								
5	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	3	50.000		1	1								
6	DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci	2	3.000		1	1								
7	DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o. Slano	P	5.000	1		1			1	100%			1	100%
8	DVORAC d.o.o. Valpovo	2	9.800		1	2								
		2	3.000		1									
9	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	3	33.000		1	3								
		2	2.600		1									
		2	4.800		1									
10	GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	2	5.000		1	1								
11	HIDROBEL d.o.o. Belišće	3	24.200		1	1								
12	HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	2	3.900	1		1			1	100%			1	100%
13	HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	P	9.000		1	2								
		P	6.000		1									
14	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	3	16.000		1	1								
15	IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	P	5.400		1	1								
16	IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	2	15.600		1	2								
		P	8.939		1									
17	JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	2	3.000		1	1								
18	KANFANAR ODVODNJA d.o.o. Kanfanar	3	8.000	1		1			1	100%			1	100%
19	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	41.600		1	3								
		1	14.200		1									
		2	200.000		1									

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtjevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija											
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Cijeljena vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora			
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%	
20	KOMRAD d.o.o. Slatina	3	34.500		1	1									
21	KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	2	3.000		1	1									
22	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	6.660	1		2			1	100%				1	50%
		2	2.400		1										
23	KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	2	54.000		1	2									
		1	11.500		1										
24	KOMUNALAC d.o.o. Otočac	2	8.000	1		1			1	100%				1	100%
25	KOMUNALAC d.o.o. Slunj	2	6.000		1	1									
26	KOMUNALAC D.O.O. Vela Luka	2	27.000		1	1									
27	KOMUNALAC d.o.o. Županja	2	5.000		1	3								1	33%
		2	3.800		1										
		3	17.000	1					1	100%					
28	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	3NP	9.000	1		3								1	22%
		2	5.900	1											
		2	7.900	1					1	100%					
29	KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	2	8.000	1		1			1	100%				1	100%
30	KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	2	39.000		1	1									
31	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	2	5.000		1	1									
32	KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	3	6.000	1		1									
33	KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	1	7.600		1	2									
		1	11.500		1										
34	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	3	20.000		1	1									
35	KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja	2	10.000		1	1									
36	KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	1	15.000		1	1									
37	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	3	100.000	1		1			1	100%				1	100%
38	KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	3	21.200		1	1									
39	LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	1	4.700		1	2									
		2	58.300		1										
40	LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	2	3.500		1	1									
41	LOPARKO d.o.o. Lopar	2	14.000		1	1									
42	MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	2	2.700		1	11								4	36%
		3	13.000		1										
		2	8.800		1										

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtjevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija											
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Cijeljena vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora			
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%	
		2	4.800		1										
		2	3.000	1					1	100%					
		3	12.000		1										
		2	5.000	1					1	100%					
		2	3.600		1										
		2	5.900	1					1	100%					
		2	4.200		1										
		3	75.000	1					1	100%					
43	METKOVIĆ d.o.o. Metković	3	18.400		1	1									
44	MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	2	8.000	1		1			1	100%			1	100%	
45	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	3	23.000		1	3									
		2	7.000		1										
		2	4.000		1										
46	NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	3	15.000	1		1			1	100%			1	100%	
47	NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2	5.000		1	3									
		2	18.800		1										
		P	8.600		1										
48	ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o. Bibinje	2	25.000		1	1									
49	ODVODNJA HVAR d.o.o. Hvar	2	25.000		1	1									
50	ODVODNJA Kali d.o.o. Kali	1	6.100		1	1									
51	ODVODNJA Opuzen d.o.o. Opuzen	2	9.500		1	1									
52	ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč	3	48.000		1	4									
		3	37.000		1										
		3	22.500		1										
		3	30.000		1										
53	ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. Rovinj	3	63.000		1	1									
54	ODVODNJA SAMOBOR d.o.o. Samobor	3	40.000		1	1									
55	ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina	2	41.000		1	1									
56	ODVODNJA d.o.o. Zadar	2	6.000		1	5							1	20%	
		P	7.500		1										
		2	11.000		1										
		2	100.000	1					1	100%					
		2	4.000		1										

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtjevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija											
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Cijeljena vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora			
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%	
57	OTOK UGLJAN d.o.o. Preko	2	14.500		1	2									
		P	6.370		1										
58	PARK ODVODNJA D.O.O. Buzet	2	7.200	1		1			1	100%			1	100%	
59	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	2	14.000		1	6									
		1	7.500		1										
		2	19.000		1										
		2	25.000		1										
		2	7.000		1										
		2	12.500		1										
60	PRAGRANDE d.o.o. Pula	2	98.000		1	2									
		2	42.000		1										
61	PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o. Primošten	1	15.000		1	1									
62	PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	3.500		1	2									
		3	24.000		1										
63	RAD d.o.o. Drniš	3	5.000	1		1			1	100%			1	100%	
64	SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	3	60.000	1		2			1	100%			1	50%	
		2	3.400		1										
65	TEKIJA d.o.o. Požega	2	2.700		1	5								1	20%
		2	4.800		1										
		3	15.300		1										
		3	33.500	1						1	100%				
		2	4.200		1										
66	USLUGA d.o.o. Gospić	2	8.000	1		1			1	100%			1	100%	
67	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	2	7.000	1		1			1	100%			1	100%	
68	VARKOM d.d. Varaždin	2	6.000		1	7									
		2	8.700		1										
		2	10.000		1										
		3	12.000		1										
		3	127.000		1										
		2	6.500		1										
		2	3.000		1										
69	VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	3	74.000		1	2									
		2	5.300		1										

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtjevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija											
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Cijeljena vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora			
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%	
70	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	2	5.000		1	11								3	27%
		2	6.000	1				1	100%						
		2	8.000	1				1	100%						
		2	3.000		1										
		2	7.000		1										
		2	8.500	1				1	100%						
		3	43.000		1										
		2	6.000		1										
		2	3.200		1										
		2	3.000		1										
2	6.000		1												
71	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	2	31.500		1	4							1	25%	
		1	2.500	1				1	100%						
		1	2.000		1										
		2	12.000		1										
72	VIOP d.o.o. Pregrada	2	2.200		1	1									
73	VIRKOM d.o.o. Virovitica	2	3.000		1	3							1	33%	
		2	9.900	1				1	100%						
		3	26.000		1										
74	VODA d.o.o. Orahovica	2	3.500		1	2									
		2	8.500		1										
75	VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	2	7.000	1		2				1	100%		1	50%	
		2	5.000		1										
76	VODAKOM d.o.o. Pitomača	2	15.000		1	1									
77	VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	3	14.965		1	1									
78	VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	3	13.500		1	1									
79	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	3	47.000		1	2									
		2	3.600		1										
80	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	3	25.000		1	1									
81	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	2	12.700		1	4									
		2	31.500		1										
		P	4.300		1										
		P	7.400		1										

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtijevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija											
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Cijeljena vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora			
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%	
82	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	2	1.700		1	3									
		3	12.000		1										
		3	1.500.000		1										
83	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	3NP	28.000		1	11								1	9%
		2	8.400	1				1	100%						
		2	2.800		1										
		3NP	20.000		1										
		2	9.000		1										
		3NP	12.200		1										
		2	5.000		1										
		2	2.500		1										
		2	3.400		1										
		2	3.000		1										
		2	2.500		1										
84	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	3	70.000		1	1									
85	VODORAD d.o.o. Đurđenovac	2	8.000		1	1									
86	VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	2	26.000		1	2									
		2	62.000		1										
87	VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1	18.100		1	5								1	20%
		P	5.000		1										
		P	5.500		1										
		2	20.000		1										
		P	5.200	1					1	100%					
88	VODOVOD d.o.o. Blato	P	8.000		1	2									
		P	3.000		1										
89	VODOVOD d.o.o. Makarska	2	20.000		1	8									
		1	14.500		1										
		P	7.500		1										
		2	40.000		1										
		P	9.000		1										
		1	15.000		1										
		P	2.000		1										
		P	7.000		1										

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtjevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija											
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Cijeljena vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora			
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%	
90	VODOVOD d.o.o. Omiš	2	22.000		1	3									
		1	11.000		1										
		P	6.000		1										
91	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	2	3.200		1	9								1	11%
		2	3.500		1										
		2	4.500		1										
		2	4.000		1										
		2	2.400		1										
		2	3.000		1										
		3	80.000	1						1	100%				
		2	5.000		1										
		2	7.500		1										
92	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	2	100.000		1	3									
		1	8.300		1										
		2	33.300		1										
93	VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2	9.000		1	1									
94	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	3	42.000		1	1									
95	VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	2	5.500	1		1			1	100%			1	100%	
96	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	2	3.000		1	2								1	50%
		3	98.500	1					1	100%					
97	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	2	2.800		1	2								1	50%
		3	12.000	1					1	100%					
98	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	2	100.000		1	6									
		3	11.500		1										
		2	275.000		1										
		3	5.400		1										
		P	4.600		1										
		2	25.000		1										
99	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	3	26.000		1	3								1	33%
		2	6.000	1					1	100%					
		3	4.600		1										
100	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	2	7.000	1		1									
101	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	2	17.000		1	1				1	100%			1	100%

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtijevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija											
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Cijeljena vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora			
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%	
102	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	2	9.900	1		1									
103	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	10.500		1	6								1	17%
		2	27.000		1										
		2	20.000		1										
		2	67.000		1										
		2	37.500	1				1	100%						
		2	3.000		1										
104	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	P	7.900		1	2									
		1	11.000		1										
105	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	3	19.100		1	1									
106	VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	2	4.000		1	1									
107	VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	3	15.000	1		1			1	100%			1	100%	
108	VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	2	18.000		1	3									
		2	2.400		1										
		3	15.000		1										
109	VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	3	11.700		1	1									
110	VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	1	9.000		1	1									
111	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	2	4.500		1	5									
		2	2.650		1										
		3	22.100		1										
		2	6.600		1										
		2	4.000		1										
112	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	2	6.000		1	3								1	33%
		3	170.000		1										
		2	2.700	1				1	100%						
113	VRELO d.o.o. Rab	2	22.000		1	2									
		1	9.900		1										
114	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	2	4.000		1	4									
		3	36.940		1										
		3	14.690		1										
		2	5.000		1										
Ukupno				45	215	260			45	17%			45	17%	
ukupni kapacitet uređaja usklađenih aglomeracija			858.060												

