



Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

Drugo izvješće o realizaciji programa u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine

srpanj 2023.

Sadržaj

1	UVOD	3
1.1	Pravna osnova	3
1.2	Pregled obveza izvješćivanja	4
1.3	Pregled objavljenih Izvješća o provedbi Programa 2021.	4
2	IZVJEŠĆE O PROVEDBI.....	4
2.1	Pregled realizacije projekata u provedbi.....	7
2.1.1	Pregled projekata vodoopskrbe	7
2.1.2	Pregled projekata odvodnje	74
2.1.3	Projekti potpore razvoju vodnocomunalnih usluga	93
2.2	Pregled stanja indikatora provedbe Programa 2021. (pokazatelji ishoda)	93
2.2.1	Ciljevi vezani uz reformu vodnocomunalnog sektora	94
2.2.2	Ciljevi postizanja standarda obavljanja usluge javne vodoopskrbe, odnosno opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju	94
2.2.3	Ciljevi postizanja standarda javne odvodnje	99
3	ZAKLJUČCI I PREPORUKE.....	105
4	PRILOZI.....	107
4.1	Popis Projekata prema Planu 2021.	108
4.1.1	Javna vodoopskrba	108
4.1.2	Javna odvodnja	116
4.1.3	Ostali projekti i projekti koji se provode na nacionalnoj razini	121
4.2	Indikator: Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji po Projektima	122
4.3	Indikator: Smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode prema Projektima	127
4.4	Indikator: Smanjenje gubitaka iz sustava javne vodoopskrbe prema Projektima	132
4.5	Indikator: Priključenost opterećenja na sustav javne odvodnje prema javnim isporučiteljima	137
4.6	Indikator: Usklađenost s obzirom na potrebnu razinu pročišćavanja prema javnim isporučiteljima	142

1 UVOD

1.1 Pravna osnova

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (dalje u tekstu: Program 2021.) je akt strateškog planiranja povezan s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Njegovo donošenje propisano je člankom 43. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19, 84/21 i 47/23), a odlukom Vlade Republike Hrvatske od listopada 2020. godine stavljen je na popis akata strateškog planiranja.

Program 2021. izradile su Hrvatske vode, a donijela ga je Vlada Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/21) nakon provedene strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17), uključujući i postupak glavne ocjene prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Ovim se dokumentom utvrđuje okvirni program ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na koja se Republika Hrvatska obvezala Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 2/12). Također se operacionalizira sustav za provedbu na način koji će doprinijeti učinkovitijem korištenju financijskih, kadrovskih i tehničkih resursa kojima raspolaže vodno gospodarstvo u području korištenja i zaštite voda, kao i sektor vodnih usluga. Programom 2021. se utvrđuju pojedinačni projekti (način i razdoblje provedbe, sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori sredstava, red prvenstva u provedbi), te definira okvir za praćenje njegove provedbe.

Zakonom o vodama određeno je da višegodišnji programi gradnje moraju biti sukladni drugim planskim dokumentima upravljanja vodama (Strategija upravljanja vodama, Plan upravljanja vodnim područjima). Time se osigurava usklađenost Programa 2021. sa strateškim opredjeljenjima i politikom upravljanja vodama, te preuzetim standardima Europske unije na području politike voda, osobito onima iz Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama) (SL L 327, 22.12.2000.), koja je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2014/101/EU od 30. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Tekst značajan za EGP) (SL L 311, 31. 10. 2014.) (dalje u tekstu: Okvirna direktiva o vodama), te iz vodnokomunalnih direktiva i to:

- Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991.), dopunjena Direktivom Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. s obzirom na određene zahtjeve utvrđene u Dodatku I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 67, 7. 3. 1998.) (dalje u tekstu: Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda),
- Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998.) koja je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2015/1787 od 6. listopada 2015. izmjeni priloga II. i III. Direktivi Vijeća 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 260, 7.10.2015.), odnosno njenom preinakom Direktiva (EU) 2020/2184 od 16. prosinca 2020. (dalje u tekstu: Direktiva o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju).

Značajan utjecaj na provedbu vodnokomunalnih direktiva ima Okvirna direktiva o vodama koja zahtijeva vođenje politike cijena vode prema načelu povrata troškova od vodnih usluga, što je osnova za provođenje politike odgovorne i učinkovite upotrebe vode prema načelu racionalnog korištenja uključujući i osiguranje sredstava za razvoj, redovito održavanje i obnavljanje vodnokomunalne infrastrukture. Načelo povrata troškova od vodnih usluga transponirano je u Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19).

Izješćivanje o provedbi Programa 2021. se obavlja u polugodišnjim ciklusima čime se ujedno i odgovara sljedećem zahtjevu Europske komisije iz svibnja 2022. godine:

„Semiannual reports on implementation of the multiannual construction programme, focusing on investments under R1-I1 and R1-I2, as of Q1 2022 onwards. Reports will include a schedule of environmental impact assessments for individual investments, including screening in line with the Habitats Directive and analysis regarding the Natura 2000 sites.“

1.2 Pregled obveza izvješćivanja

Obveze izvješćivanja, pripadajući izvještajni obrasci i propisani indikatori proizlaze iz više različitih dokumenata kako slijedi.

Obveza		Učestalost - rokovi
Izješća prema zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda	Europska komisija - Sustav WISE	2 godine
Izješća prema zahtjevima Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju	Europska komisija - Sustav WISE	3. godine
Izješće o Planu upravljanja vodnim područjima	Europska komisija - Sustav WISE	6 godina
Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking - Water (GLAAS)	UN - SDG 6 o vodi, sanitaciji i higijeni (WASH)	2 godine
Protokol o vodi i zdravlju	UN	3 godine
Izješćivanje o provedbi Programa 2021. (Izješće)		polugodišnje
Izješćivanje o provedbi Nacionalnog programa oporavka i otpornosti		polugodišnje
Izješćivanje prema obvezama Nacionalne razvojne strategije		godišnje
Izješćivanje za potrebe Državnog zavoda za statistiku	Državni zavod za statistiku	godišnje


1.3 Pregled objavljenih Izješća o provedbi Programa 2021.

Naziv	Izješćajno razdoblje	Datum objave
Prvo Izješće o provedbi Programa 2021. (dalje u tekstu 1. Izješće)	1. siječanj 2022. - 30. lipanj 2022. godine	srpanj 2022. godine
Drugo Izješće o provedbi Programa 2021. (dalje u tekstu 2. izješće)	1. siječanj 2022. - 31. prosinac 2022. godine	srpanj 2023. godine

2 IZVJEŠĆE O PROVEDBI

Pregled statusa, odnosno realizacije projekata, bilo da je riječ o javnoj vodoopskrbi, javnoj odvodnji (aglomeracije) ili ostalim, odnosno posebnim projektima koji se provode na nacionalnoj razini, određenih Programom 2021., se registrira na način da se prati realizacija pojedinačnih komponenti odnosno aktivnosti na realizaciji projekata (praćenih kroz status realizacije pojedinačnih ugovora). Naime ovisno o složenosti pojedinog projekta, te o financijskom paketu kome komponenta projekta pripada, broj komponenti, odnosno broj pripadajućih potkomponenti projekta značajno varira. U određenim slučajevima (Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026.) ubičajeno je riječ o

komponenti (bez potkomponenti), dok se u okviru Operativnih programa „Zaštita okoliša“ i „Konkurentnost i kohezija“ komponenta projekta prati kroz realizaciju niza potkomponenti, kroz veći broj tzv. sekundarnih ugovora (uz samo ulaganje u razvoj infrastrukture, nabavu opreme, primjerice realizira se i obavljanje usluge vidljivosti projekta i slično). Izvješća o realizaciji Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine pratiti će status realizacije komponenti projekta i pripadajućih potkomponenti na način na koji se to prati u okviru financijskog paketa kroz koji se financira određena komponenta projekta.

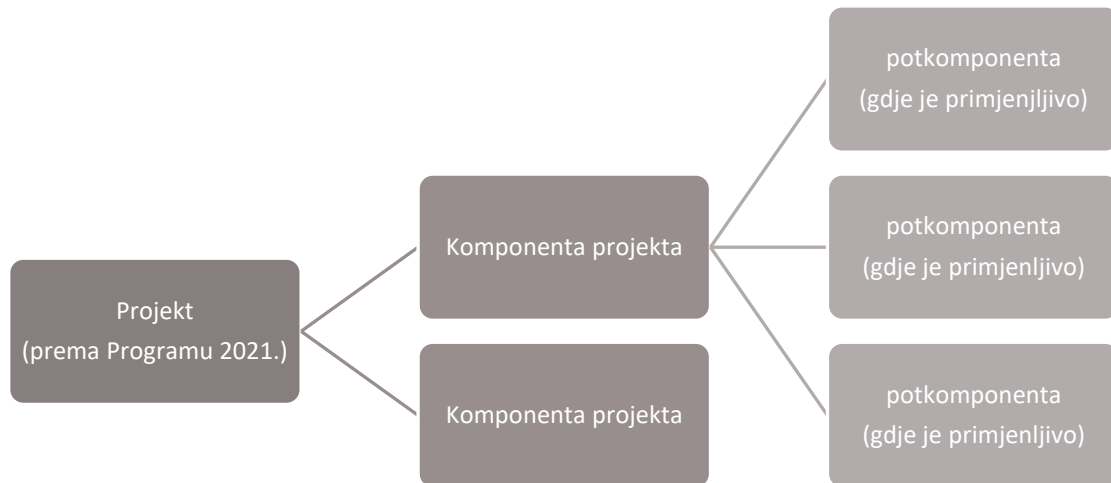

Slika 1 Shematski prikaz praćenja stanja realizacije projekata Programa 2021.

Popis projekata prema Programu 2021. je naveden u poglavlju 4.1. Pri tome treba naglasiti da Program 2021. sadrži projekte na različitim stupnjevima razrade¹, od projektnog prijedloga (tek treba razviti idejni koncept) preko projektnog prijedloga s pripremljenom tehničkom dokumentacijom i dozvolama, pa do projekata koji se već financiraju. U takvim slučajevima može se očekivati da će se detaljnijom razradom tehničke dokumentacije mijenjati obuhvat, pa čak i broj projekata. Takve promjene, razrađene u prihvaćenim tehničkim dokumentima posebno će biti naglašene, kako bi se osigurao konzistentnost i kontinuitet u praćenju indikatora uspješnosti Programa 2021.

Financijski paket	Skraćenica	Razdoblje financijskog paketa
Razvojni programi javnih isporučitelja	RPJI	-
Redoviti program Hrvatskih voda	RPHV	-
Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007. - 2013.	OPZO 2007-2013	2007. - 2016.
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020.	OPKK 2014-2020	2014. - 2023.
Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026.	NPOO	2021. - 2026.
Fond solidarnosti Europske unije	FSEU	do svibnja 2023.
Višegodišnji financijski okvir 2021. - 2027.	VFO 2021-2027	2022. - 2029.
Švicarska darovnica	SD	do kraja 2023
Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. dodatno proširen na 2021. i 2022. godinu	RR	do kraja 2025.
Predpristupni fondovi	ISPA	završeno

¹ Razine zrelosti projektnog prijedloga prema Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske Narodne novine br. 106/17

Pregled projekata, komponenti i potkomponenti se prati prema sljedećim fazama:

Faza provedbe projekta, Komponente projekta ili potkomponente projekta	Opis
U najavi	Predloženo za financiranje - projekt je na razini razrade projektne ideje, odnosno idejni koncept u izradi, financijski paket još uvijek nije odabran
U pripremi	U postupku pripreme tehničke dokumentacije i/ili u postupku ishođenja dozvola
Početak provedbe	Potpisom sporazuma ili drugog dokumenta projektu je utvrđen mehanizam financiranja (dodijeljen je jednom od naprijed identificiranih programa (mehanizama financiranja))
U nabavi	U nabavi
U izvođenju	U izvođenju
Završetak izgradnje	Obavljen tehnički pregled, u probnom radu
Završeno	U potpunosti završen projekt / komponenta / potkomponenta - ishođena uporabna dozvola
Ne provodi se	Prekinuta priprema ili realizacija projekta

U 2. izvješću uvedene su dodatne dvije faze u realizaciji:

- projekt / komponenta / podkomponenta u najavi (predloženo za financiranje - projekt je na razini razrade projektne ideje, odnosno idejni koncept u izradi, financijski paket još uvijek nije odabran),
- projekt / komponenta / podkomponenta se ne provodi (došlo je do prekida u pripremi ili realizaciji projekta).

2.1 Pregled realizacije projekata u provedbi

2.1.1 Pregled projekata vodoopskrbe

Preled realizacije projekata vodoopskrbe obuhvaća informacije o realizaciji projekata / komponenti / potkomponenti u okviru sljedećih financijskih paketa:

Financijski paket	Skraćenica	Razdoblje Financijskog paketa	Napomena
Razvojni programi javnih isporučitelja	RPJI	-	podaci nisu dostupni, nema obveze izvješćivanja (očekuje se u okviru 2. izvješća - godišnje izvješće)
Redoviti program Hrvaskih voda	RPHV	-	prikupljeni podaci o projektima čija je provedba započela u 2022. godini
Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007. - 2013.	OPZO 2007 - 2013	2007. - 2016.	korišteni podaci
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020.	OPKK 2014 - 2020	2014. - 2023.	korišteni podaci
Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026.	NPOO	2021. - 2026.	korišteni podaci
Fond solidarnosti Europske unije	FSEU	do svibnja 2023.	korišteni podaci
Višegodišnji financijski okvir 2021. - 2027.	VFO 2021 - 2027	2022. - 2029.	nema podataka (projekti u pripremi se mogu smatrati potencijalnim kandidatima za financiranje)
Švicarska darovnica	SD	do kraja 2023.	korišteni podaci
Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. dodatno proširen na 2021. i 2022. godinu	RR	do kraja 2025.	korišteni podaci, nema obveze izvješćivanja

Trenutačno je na području Republike Hrvatske u različitim fazama realizacije oko 1.060 aktivnosti (potkomponenti) na 140 projekata iz Programa 2021., što je značajno povećanje u odnosu na oko 670 aktivnosti iz 96 projekata iz 1. Izvješća. Kako podaci o financijskoj realizaciji projekata u prvih 6 mjeseci 2022. godine nisu dostavljeni, u tablici su naznačeni podaci o ukupnim vrijednostima projekata, odnosno njihovih komponenti / potkomponenti i ukupna realizacija do 31. prosinca 2022. godine. Pri tome, treba napomenuti da se u određenom dijelu projekata odvodnje kroz Operativne programe „Zaštita okoliša“ i „Konkurentnost i kohezija“ realiziraju i podkomponente vodoopskrbe (vrijednost projekta / komponente / podkomponente nije upisana i vodi se kroz projekte aglomeracija).

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili POU-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili POU-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
1		72	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEDIMURSKJE VODE d.o.o. Čakovec	2	NPOO	Rekonstrukcija vodovodne mreže od PS "Urban" do VT "Urban", radovi	1.318.205	23.03.2022.	08.11.2021.	09.09.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	1.315.083,02
1		72	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEDIMURSKJE VODE d.o.o. Čakovec	2	NPOO	Rekonstrukcija vodovodne mreže od PS "Urban" do VT "Urban", nadzor	1.318.205	23.03.2022.	08.11.2021.	09.09.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	18.200,00
1		72	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEDIMURSKJE VODE d.o.o. Čakovec	2	NPOO	Rekonstrukcija vodovodne mreže od PS "Urban" do VT "Urban", promidžba i vidljivost	1.318.205	23.03.2022.	08.11.2021.	09.09.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	5.630,00
1		72	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEDIMURSKJE VODE d.o.o. Čakovec	2	NPOO	Rekonstrukcija dijela vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Donja Dubrava, radovi	2.849.739	23.03.2022.	08.11.2021.	09.09.2022.	ima	ima	u izvođenju (aglomeracija) - retroaktivno	u izvođenju (aglomeracija) - retroaktivno	2.311.966,11
1		72	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEDIMURSKJE VODE d.o.o. Čakovec	2	NPOO	Rekonstrukcija dijela vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Donja Dubrava, nadzor	2.849.739	23.03.2022.	08.11.2021.	09.09.2022.	ima	ima	u izvođenju (aglomeracija) - retroaktivno	u izvođenju (aglomeracija) - retroaktivno	29.950,00
1		72	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEDIMURSKJE VODE d.o.o. Čakovec	2	NPOO	Rekonstrukcija dijela vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Donja Dubrava, promidžba i vidljivost	2.849.739	23.03.2022.	08.11.2021.	09.09.2022.	ima	ima	u izvođenju (aglomeracija) - retroaktivno	u izvođenju (aglomeracija) - retroaktivno	2.630,01
1		72	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEDIMURSKJE VODE d.o.o. Čakovec	2	NPOO	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ulici Matije Gupca u Murskom Središću(dionice VMS 11, VMS 11.1, VMS 11.2), radovi	1.540.450	23.03.2022.	08.11.2021.	09.09.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	1.422.169,04
1		72	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEDIMURSKJE VODE d.o.o. Čakovec	2	NPOO	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ulici Matije Gupca u Murskom Središću(dionice VMS 11, VMS 11.1, VMS 11.2), nadzor	1.540.450	23.03.2022.	08.11.2021.	09.09.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	34.200,00
1		72	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEDIMURSKJE VODE d.o.o. Čakovec	2	NPOO	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Ulici Matije Gupca u Murskom Središću(dionice VMS 11, VMS 11.1, VMS 11.2), promidžba i vidljivost	1.540.450	23.03.2022.	08.11.2021.	09.09.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.815,00
2		143	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Varaždin		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
2		143	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbne mreže dijela naselja Krč - zaselak Ključice	2.270.609	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju (aglomeracija)	2.267.731,56
2		143	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	1	RPHV	Izgradnja transportnog vodoopskrbnog cjevovoda Novakovac - Poljanec	8.031.481	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju (aglomeracija)	7.279.802,25
2		143	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	1	RPHV	Završetak vodoopskrbnog cjevovoda u gospodarskoj zoni Novi Marof	344.780	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju (aglomeracija)	264.208,06
2		143	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Donjoj Poljani	992.380	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju (aglomeracija)	968.883,33

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
2		74	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	2	RPHV	Izgradnja dobavnog cjevovoda od izvorišta Žgano vino - VS Pahinsko - do Malezove ulice u Ivancu, 2 faza	1.228.185	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju (aglomeracija)	1.317.568,68
2		74	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	2	RPHV	Izgradnja vodovoda od centra naselja Brezova Gora do županijske ceste ŽC 2258	561.791	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju (aglomeracija)	567.297,11
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Križevci		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	NPOO	Vodoopskrbna mreža sjeveroistočnog dijela grada Križevaca - cjelina 3, radovi	22.160.250	04.11.2022.	N/P	N/P	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	NPOO	Vodoopskrbna mreža sjeveroistočnog dijela grada Križevaca - cjelina 3, nadzor		04.11.2022.	N/P	N/P	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	NPOO	Vodoopskrbna mreža sjeveroistočnog dijela grada Križevaca - cjelina 3, promidžba i vidljivost		04.11.2022.	N/P	N/P	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	NPOO	Vodoopskrbna mreža sjeveroistočnog dijela grada Križevaca - cjelina 3, vođenje projekta		04.11.2022.	N/P	N/P	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	NPOO	Crpna stanica Fodrovec 2, radovi	2.157.750	04.11.2022.	N/P	N/P	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	NPOO	Crpna stanica Fodrovec 2, nadzor		04.11.2022.	N/P	N/P	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	NPOO	Crpna stanica Fodrovec 2, promidžba i vidljivost		04.11.2022.	N/P	N/P	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	NPOO	Crpna stanica Fodrovec 2, vođenje projekta		04.11.2022.	N/P	N/P	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	NPOO	Rekonstrukcija Magistralnog cjevovoda PS Vratno - VS Kalnik - VS Deklešanec, radovi	16.490.250	04.11.2022.	N/P	N/P	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	NPOO	Rekonstrukcija Magistralnog cjevovoda PS Vratno - VS Kalnik - VS Deklešanec, nadzor		04.11.2022.	N/P	N/P	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	NPOO	Rekonstrukcija Magistralnog cjevovoda PS Vratno - VS Kalnik - VS Deklešanec, promidžba i vidljivost		04.11.2022.	N/P	N/P	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	NPOO	Rekonstrukcija Magistralnog cjevovoda PS Vratno - VS Kalnik - VS Deklešanec, vođenje projekta		04.11.2022.	N/P	N/P	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	RPHV	Izgradnja magistralnog cjevovoda Carevdar-Glogovnica - Osijek Vojakovački	8.440.358	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	3.373.576,90
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	RPHV	Izgradnja magistralnog cjevovoda Đurđić - vodosprema Trema	1.907.445	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	1.907.386,20
3		35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbne mreže Ravenska i Kapela	2.034.395	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	1.060.446,36
3		75	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Koprivnica		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
3		75	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja V. Mučna (Sutare) i M. Poganac, radovi	1.076.250						-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		75	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja V. Mučna (Sutare) i M. Poganac, nadzor							-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		75	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja V. Mučna (Sutare) i M. Poganac, promidžba i vidljivost							-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		75	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže Općine Rasinja-jugoistočni dio, naselja Prkos, V. Grabičani, V. Poganac, Ludbreški Ivanac, Radeljevo Selo, Ribnjak i D. Rijeka, radovi	22.497.563						-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		75	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže Općine Rasinja-jugoistočni dio, naselja Prkos, V. Grabičani, V. Poganac, Ludbreški Ivanac, Radeljevo Selo, Ribnjak i D. Rijeka, nadzor							-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		75	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže Općine Rasinja-jugoistočni dio, naselja Prkos, V. Grabičani, V. Poganac, Ludbreški Ivanac, Radeljevo Selo, Ribnjak i D. Rijeka, promidžba i vidljivost							-	u izvođenju (aglomeracija)	
3		75	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Hudovljani i Rovištanci	1.826.885	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	1.000.000,00

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili POU-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili POU-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
3		75	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VOĐE d.o.o. Koprivnica	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Vrbovac Sokolovečki i Jankovac sa izgradnjom crpne stanice Jankovac	0	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	0,00
4		39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	1	u pripremi	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Daruvar		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
4		39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	1	RPHV	Izgradnja vodovoda za naselje Vrbovac	490.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	0,00
4		39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	1	RPHV	Nastavak izgradnje distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda općine Dežanovac u naseljima Kaštel Dežanovački, Trojeglava, Drlež, Goveđe Polje, Donji Sredani i Gornji Sredani	3.923.672	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	1.093.439,52
4		39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	1	RPHV	Izgradnja spojnog cjevovoda od Daruvara do magistralnog cjevovoda Končanica - D. Daruvar	2.521.428	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	2.224.006,02
4		39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	1	RPHV	Rekonstrukcija i proširenje vodovoda Gornja Vrijeska	2.829.453	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	2.788.923,74
4		40	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALNIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	1	NPOO	Gradilište - Vodovod Gornja Šušnjara i Donja Šušnjara		23.03.2022.	N/P	06.09.2018.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju (aglomeracija)	4.413.005,60
4		40	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALNIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	1	NPOO	Gradilište - Vodovod Gornja Šušnjara i Donja Šušnjara	4.861.903	23.03.2022.	N/P	06.09.2018.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju (aglomeracija)	89.000,00
4		40	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALNIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	1	NPOO	Gradilište - Vodovod Gornja Šušnjara i Donja Šušnjara		23.03.2022.	N/P	06.09.2018.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju (aglomeracija)	1.635,00
4		45	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	1	u pripremi	Razvoj vodoopskrbe u projektu Garešnica - Hercegovac		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u pripremi	u izvođenju (aglomeracija)	
4		45	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Dišnik	4.025.277	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	2.579.413,80
4		45	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	1	RPHV	Izgradnja crpne stanice Dišnik	400.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	0,00
4		45	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	1	RPHV	Izgradnja magistralnog cjevovoda Velika Trnovitica - Garešnica	9.118.627	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	7.458.686,74

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
4		45	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	1	RPHV	Izgradnja crpne stanice Pašijan	480.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	0,00
4		45	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	1	RPHV	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda Garešnica - Zdenčac (I. faza)	2.040.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	0,00
4		45	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	1	RPHV	Radovi na postrojenju za preradu vode na sanaciji problematičnih parametara u vodi koji prelaze MDK	100.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju (aglomeracija)	0,00
4		34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Bjelovar		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
4		36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	2	-	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Grubišno polje		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	nije započela priprema (aglomeracija)	u najavi (aglomeracija)	
4		36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	2	RPHV	Izgradnja crpne stanice između vodotornjeva Grubišno Polje i Veliki Zdenci	495.839	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	477.488,84
4		36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	2	RPHV	Sanacija vodotornja u Grubišnom Polju	1.900.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
4		73	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Đurđevac		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
4		73	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Rakitnica i Donje Zdjelice, radovi		23.03.2022.	10.11.2021.	23.12.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	1.561.090,09
4		73	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Rakitnica i Donje Zdjelice, nadzor	1.707.282	23.03.2022.	10.11.2021.	23.12.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	43.555,60
4		73	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Rakitnica i Donje Zdjelice, promidžba i vidljivost		23.03.2022.	10.11.2021.	23.12.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.200,00
4		16	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela	3	RPHV	Nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže Jabučeta s precrpnom stanicom	1.658.520	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	1.373.662,60
4		16	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela	3	RPHV	Izgradnja dijela vodoopskrbne mreže naselja Stanići, Kobasičari, Visovi	964.178	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	664.688,07
4		139	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac	3	RPHV	Izgradnja crpne stanice Pavlovac u Velikom Grđevcu	1.200.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili POU-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili POU-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
5		77	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Virovitica faza 2		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
5		77	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Sv. Đurađ u Virovitici - ribnjaci	999.959	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	999.418,49
5		78	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Slatina		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
5		78	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina	2	NPOO	Izgradnja glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Mačkovac-Hum i distributivne vodovodna mreže naselja Hum i Hum Varoš	2.962.773	23.03.2022.	29.11.2021.	23.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.282.384,07
5		79	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica	2	NPOO	Radovili/izgradnja, nadzor i promidžba i vidljivost-vodoopskrbna mreža u Orahovici (ulice A. Starčevića i Dalmatinska)	3.936.805	23.03.2022.	19.11.2021.	22.01.2019.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.921.319,57
5		76	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača	3	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Pitomača		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
6		12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Đakovo		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
6		12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Semeljci		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
6		12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	1	RPHV	Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Đurdanci s izgradnjom stanice za podizanje tlaka	1.209.905	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	završeno	1.209.813,10
6		12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	1	RPHV	Izgradnja vodovodne mreže u ulici K. Pavića u Đakovu	800.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
6		80	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	1	NPOO	Izgradnja spojnog vodovoda Donja Motičina – Gornja Motičina	3.183.365	03.02.2022.	06.11.2021.	03.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	3.026.776,33
6		80	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Našice		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
6		81	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac	2	RPHV	Rekonstrukcija dijela vodoopskrbnih cjevovoda na području Đurđenovca - 4. faza izgradnje	458.896	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	412.495,20
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Beli Manastir		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Baranjsko Petrovo Selo	3.647.709	03.02.2022.	16.11.2021.	27.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	3.243.714,51
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Spojini cjevovod crpilište Livade- vodosprema Beli Manastir, radovi	7.344.750			27.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Spojini cjevovod crpilište Livade- vodosprema Beli Manastir, nadzor				27.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Spojini cjevovod crpilište Livade- vodosprema Beli Manastir, promidžba i vidljivost				27.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Glavni vodoopskrbni cjevovod naselja Podolje, radovi	7.029.750	22.12.2022.		27.06.2022.	ima	ima	-	u izvođenju	
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Glavni vodoopskrbni cjevovod naselja Podolje, nadzor		22.12.2022.		27.06.2022.	ima	ima	-	u izvođenju	
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Glavni vodoopskrbni cjevovod naselja Podolje, promidžba i vidljivost		22.12.2022.		27.06.2022.	ima	ima	-	u izvođenju	
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Vodoopskrbna mreža naselja Novi Bezdan, radovi	9.129.750			27.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Vodoopskrbna mreža naselja Novi Bezdan, nadzor				27.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Vodoopskrbna mreža naselja Novi Bezdan, promidžba i vidljivost				27.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Vodoopskrbni cjevovod Branjin Vrh-Šećerana, radovi	3.281.250			27.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Vodoopskrbni cjevovod Branjin Vrh-Šećerana, nadzor				27.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Vodoopskrbni cjevovod Branjin Vrh-Šećerana, promidžba i vidljivost				27.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Vodoopskrba naselja Puškaš, radovi	3.281.250			27.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
7		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Vodoopskrba naselja Puškaš, nadzor				27.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
		84	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	1	NPOO	Vodoopskrba naselja Puškaš, promidžba i vidljivost				27.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
		82	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	1	-								-	-	
		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, RVS OSIJEK 1. faza projekta	1	OPZO 2007-2013	Izgradnja i rekonstrukcija magistralnih i distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda te objekata sustava javne vodoopskrbe regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek	12.351.012	6.10.2015	N/P	ima	N/P	N/P	završeno	završeno	10.106.514,91
		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, RVS OSIJEK 1. faza projekta	1	OPZO 2007-2013	Dogradnja postrojenja pitke vode Dalj		6.10.2015	N/P	ima	N/P	N/P	završeno	završeno	4.998.623,20
		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, RVS OSIJEK 2. faza projekta	1	OPKK 2014-2020	Izgradnja i rekonstrukcija magistralnih i distributivnih vodoopskrbnih cjevovoda te objekata sustava javne vodoopskrbe regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek		25.07.2017.	N/P	ima	u tijeku	u tijeku	u provedbi	u provedbi	45.758.590,08
		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, RVS OSIJEK 2. faza projekta	1	OPKK 2014-2020	Uspostava GIS sustava vodoopskrbe na uslužnom području Vodovod - Osijek d.o.o. te program upravljanja gubicima		25.07.2017.	N/P	ima	u tijeku	u tijeku	u provedbi	u provedbi	10.173.585,00
		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, RVS OSIJEK 2. faza projekta	1	OPKK 2014-2020	Usluge nadzora nad provedbom projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek	74.647.987	25.07.2017.	N/P	ima	u tijeku	u tijeku	u provedbi	u provedbi	2.526.157,99
		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, RVS OSIJEK 2. faza projekta	1	OPKK 2014-2020	Promidžba i vidljivost		25.07.2017.	N/P	ima	u tijeku	u tijeku	u provedbi	u provedbi	763.700,00
		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, RVS OSIJEK 2. faza projekta	1	OPKK 2014-2020	Usluge upravljanja projektom i administracija projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek		25.07.2017.	N/P	ima	u tijeku	u tijeku	u provedbi	u provedbi	3.120.000,00
		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Osijek faza 2		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija postrojenja za dezinfekciju vode u pogonu za proizvodnju vode, radovi	5.643.075	23.03.2022.	03.02.2022.	17.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	5.372.533,88
		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u produžetku Kanižlićeve ulice - voda	932.767	23.03.2022.	03.02.2022.	17.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	947.110,72
		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže u Tvrdi	7.251.108	23.03.2022.	03.02.2022.	17.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	5.071.817,79
		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija NUS-a pogona za proizvodnju vode	506.310	23.03.2022.	03.02.2022.	17.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	480.376,66

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. izvješće	Status provedbe 2. izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)	
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku - od Rokove do Županijske; radovi	6.183.975	04.11.2022.		12.04.2022.			-	u pripremi		
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku - od Rokove do Županijske; nadzor		04.11.2022.		12.04.2022.				-	u pripremi	
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku - od Rokove do Županijske; promidžba i vidljivost		04.11.2022.		12.04.2022.				-	u pripremi	
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku od Županijske do Radićeve; radovi	5.757.675	04.11.2022.		12.04.2022.				-	u pripremi	
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku od Županijske do Radićeve; nadzor		04.11.2022.		12.04.2022.				-	u pripremi	
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku od Ulice Stjepana Radića do Vukovarske ulice te dio Vukovarske ulice i Ulice kardinala A. Stepinca; radovi		04.11.2022.		12.04.2022.				-	u pripremi	
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku - od Ulice Stjepana Radića do Vukovarske ulice te dio Vukovarske ulice i Ulice kardinala A. Stepinca; nadzor	6.823.425	04.11.2022.		12.04.2022.				-	u pripremi	
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku - od Ulice Stjepana Radića do Vukovarske ulice te dio Vukovarske ulice i Ulice kardinala A. Stepinca; promidžba i vidljivost		04.11.2022.		12.04.2022.				-	u pripremi	
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Sljemenskoj, Kolodvorskoj i Kapelskoj ulici u Osijeku; radovi	15.349.425	04.11.2022.		12.04.2022.				-	u pripremi	
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Sljemenskoj, Kolodvorskoj i Kapelskoj ulici u Osijeku; nadzor		04.11.2022.		12.04.2022.				-	u pripremi	
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Sljemenskoj, Kolodvorskoj i Kapelskoj ulici u Osijeku; promidžba i vidljivost		04.11.2022.		12.04.2022.				-	u pripremi	

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili POU-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili POU-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda u Višnjevcu; radovi		04.11.2022.		12.04.2022.			-	u pripremi	
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda u Višnjevcu; nadzor	40.503.750	04.11.2022.		12.04.2022.			-	u pripremi	
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda u Višnjevcu; promidžba i vidljivost		04.11.2022.		12.04.2022.			-	u pripremi	
8		87	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	1	RPHV	Rekonstrukcija vodoopskrbe u dijelu Čvrstničke ulice u Osijeku	1.057.822	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	931.511,39
8		89	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Valpovo - Belišće		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju	u izvođenju	
8		89	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo	1	RPHV	Rekonstrukcijski radovi na vodocrpilištu Jarčevac - nabava i izmjena dizel agregatskog postrojenja za napajanje energijom vodocrpilišta	180.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	143.800,00
8		89	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo	1	RPHV	Rekonstrukcijski radovi na vodocrpilištu Jarčevac - nabava i izmjena ventila u postrojenju za preradu vode	70.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	42.517,70
8		144	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Majške Mede	806.591	23.12.2021.	13.10.2021.	06.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	785.281,68
8		83	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće	3	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Valpovo - Belišće		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju	u izvođenju	
8		83	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće	3	NPOO	Izvođenje radova, stručni i obračunski nadzor te promidžba nad Rekonstrukcijom i dogradnjom vodoopskrbnih cjevovoda naselja Belišće – II. dio	2.844.235	23.03.2022.	05.11.2021.	14.02.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	2.447.413,50
8		135	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDNOST d.o.o. Čepin	3	NPOO	Vodoopskrbna mreža naselja Mala Branjevina	423.429	23.03.2022.	28.10.2021.	03.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	48.441,58
8		135	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDNOST d.o.o. Čepin	3	NPOO	Spojini cjevovod Ulica Franje Račkog i Eugena Kvaternika u Čepinu	514.516	23.03.2022.	28.10.2021.	03.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	514.516,10
9		1	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Zabok - Zlatar		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
9		1	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	1	RPHV	Opskrba vodom visoke zone naselja Krapinske Toplice - cjevovodi i hidrostanica	2.093.824	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	1.679.645,30
9		1	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općine Gornja Stubica - naselja Brezje i Volavec	2.797.294	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	1.017.052,86
9		1	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	1	RPHV	Uređenje izvorišta Oštri Hum u Mariji Bistrici	1.229.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	536.109,41

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
		1	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	1	FSEU	Sanacija infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama	7.246.654	1.12.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	-	u izvođenju	1.609.116,80
		3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	1	NPOO	Opskrba vodom posdručja Lukovčak - visoka zona zaselka Grki, radovi	538.944	23.03.2022.	05.11.2021.	03.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	481.315,03
		3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	1	NPOO	Opskrba vodom posdručja Lukovčak - visoka zona zaselka Grki, nadzor		23.03.2022.	05.11.2021.	03.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	17.300,00
		3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog sustava dijela naselja Šabac u Krapini	3.698.763	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	završeno	3.697.782,63
		2	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	2	-								-	-	
		136	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada	2	RPHV	Rekonstrukcija izvorišta B1 u Pregradi	2.853.874	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	završeno	2.853.621,93
10		4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Zaprešić		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
10		4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	2	NPOO	Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Dubravičkoj ulici - Faza 2 - Marija Gorica, radovi	1.965.241	03.02.2022.	20.10.2021.	26.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	1.773.111,58
10		4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	2	NPOO	Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Dubravičkoj ulici - Faza 2 - Marija Gorica, nadzor		03.02.2022.	20.10.2021.	26.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	93.500,00
10		4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	2	NPOO	Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Dubravičkoj ulici - Faza 2 - Marija Gorica, promidžba i vidljivost		03.02.2022.	20.10.2021.	26.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	500,00
10		4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	2	NPOO	Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Veliki Vrh do Općine Luka	13.081.065	04.11.2022.		26.05.2022.			-	u pripremi	
10		4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	2	NPOO	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda od VS Sveti Križ-Celine, Faza 1, Općina Marija Gorica	10.973.130	04.11.2022.		26.05.2022.			-	u pripremi	
10		4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	2	NPOO	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Krajskoj i Vadinskoj ulici od VS Vadina do odvojka u Krajskoj ulici	2.651.815	04.11.2022.		26.05.2022.			-	u pripremi	
10		4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	2	FSEU	Rekonstrukcija vodovoda na području aglomeracije Zaprešić te sanacija zida hale UPOV Zajarki	8.705.270	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	110.700,00
10		137	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra	3	-								-	-	

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	u pripremi	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Zagreb							u pripremi (aglomeracija)	u pripremi (aglomeracija)	
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Gornja Dubrava - Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Kamešćica, radovi	722.081	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	693.281,47
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Gornja Dubrava - Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Kamešćica, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	28.800,00
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Ugovor o izgradnji PS Jalševac, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki breg, Jalševac i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara, radovi		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	2.301.519,07
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Ugovor o izgradnji PS Jalševac, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki breg, Jalševac i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara, nadzor	3.513.838	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	16.544,81
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Ugovor o izgradnji PS Jalševac, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki breg, Jalševac i Sveta Barbara, vođenje projekta		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	11.340,50
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sesvete - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odvoju ulice Vinka Kindera i ulici Put Loza u Sesvetama, radovi	397.847	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	334.782,99
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sesvete - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odvoju ulice Vinka Kindera i ulici Put Loza u Sesvetama, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	22.000,00
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za VS Šimunčevac i izgradnja vodospremnika Šimunčevac, radovi	4.615.240	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	3.380.515,20
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za VS Šimunčevac i izgradnja vodospremnika Šimunčevac, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	26.706,00
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija zasunske komore br. 4296 na Slavenskoj aveniji kod precrpne stanice Pile, radovi		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.083.449,67
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija zasunske komore br. 4296 na Slavenskoj aveniji kod precrpne stanice Pile, nadzor	2.121.940	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	16.340,00
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija zasunske komore br. 4296 na Slavenskoj aveniji kod precrpne stanice Pile, nadzor elektro		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	5.000,00
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Brezovica - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Horvati, radovi	860.671	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	734.393,23

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili POU-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili POU-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Brezovica - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Horvati, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	22.000,00
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Gornja Dubrava - izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 4, radovi	1.698.694	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	1.090.756,70
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Gornja Dubrava - izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 4, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	33.600,00
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Gornja Dubrava - izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 5, radovi	1.730.207	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	1.183.571,56
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Gornja Dubrava - izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 5, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	35.600,00
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Novi Zagreb - zapad - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Keseri kod k.br. 4a-30b, 4d-4r/2, 4s/1-4z/1 i 4s/2-4z/3, radovi	926.908	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	863.870,66
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Novi Zagreb - zapad - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Keseri kod k.br. 4a-30b, 4d-4r/2, 4s/1-4z/1 i 4s/2-4z/3, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	30.720,00
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Peščenica - Žitnjak - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulicama Kozari bok I., II., III. Odvojak, radovi	1.358.622	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	1.226.292,69
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Peščenica - Žitnjak - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulicama Kozari bok I., II., III. Odvojak, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	8.792,00
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Podsljeme - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu odvojka Ulice Štefanovec i dijelu Ulice Vincekov breg, radovi	429.074	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	411.500,41
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Podsljeme - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu odvojka Ulice Štefanovec i dijelu Ulice Vincekov breg, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	10.000,00
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sesvete - izgradnja HS Adamovec, radovi	1.186.587	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	1.171.023,89
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sesvete - izgradnja HS Adamovec, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	10.700,00
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Hrastova, radovi	162.098	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	151.458,55
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Hrastova, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	4.400,00

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili POU-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili POU-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Širokoj ulici, radovi	165.854	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	158.608,50
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Širokoj ulici, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	5.000,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja (produženja) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Podsused-Vrapče, radovi	2.880.168	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	3.097.058,37
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja (produženja) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Podsused-Vrapče, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	28.750,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja (produženja) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Novi Zagreb Zapad, radovi	2.787.954	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	1.769.685,17
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja (produženja) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Novi Zagreb Zapad, nadzor	42.880	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	42.880,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Čučerskoj cesti od ulice Oporovečki Omajek do Jaiševečke ceste, radovi	2.866.558	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.515.029,16
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Čučerskoj cesti od ulice Oporovečki Omajek do Jaiševečke ceste, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	49.900,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Gornji Dragonožec, radovi	2.167.797	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	1.457.845,60
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Gornji Dragonožec, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	0,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Donji Trpuci, radovi	1.219.062	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	660.727,54
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Donji Trpuci, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	20.784,40
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Kanalskoj ulici, radovi	1.125.621	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	968.178,39
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Kanalskoj ulici, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	30.600,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Albrechtovoj ulici (od Hondlove do III. Maksimirovog naselja), radovi	646.453	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	578.980,89

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili POU-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili POU-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Albrechtovoj ulici (od Hondlove do III. Maksimirskog naselja), nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	10.146,08
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Burićevom odvoju, radovi	1.149.033	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	1.017.833,08
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Burićevom odvoju, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	31.200,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Rackoj ulici od k.br. 32 do Vojkovičke ulice i kod k.br. 75 - 95, radovi	600.637	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	564.637,08
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Rackoj ulici od k.br. 32 do Vojkovičke ulice i kod k.br. 75 - 95, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	36.000,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Samobor - izgradnja vodoopskrbnog sustava Noršić selo - Jarušje, radovi	7.611.553	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	7.555.243,35
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Samobor - izgradnja vodoopskrbnog sustava Noršić selo - Jarušje, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	56.000,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 6, radovi	1.814.148	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	1.279.961,17
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 6, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	0,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sveta Nedelja - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Stublov zdenac u naselju Mala Gorica, radovi	930.759	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	819.078,33
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sveta Nedelja - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Stublov zdenac u naselju Mala Gorica, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	14.130,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Fra. Filipa Grabovca, radovi	810.294	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	633.943,98
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Fra. Filipa Grabovca, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	10.000,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Banovičkoj ulici, radovi	675.305	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	649.877,82
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Banovičkoj ulici, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	14.000,00

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. izvješće	Status provedbe 2. izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Samobor - izgradnja sanitarnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Stojdraga do k.č.br. 226/1 k.o. Poklek, radovi	1.179.568	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	1.063.057,86
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Samobor - izgradnja sanitarnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Stojdraga do k.č.br. 226/1 k.o. Poklek, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	29.700,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Korenovoj ulici, radovi	506.725	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	492.024,73
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Korenovoj ulici, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	14.700,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Šestinjak za k.č.br. 1545 k.o. Mikulići, radovi	493.447	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	431.442,58
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Šestinjak za k.č.br. 1545 k.o. Mikulići, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	14.900,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Polanjšćak do k.br. 17	385.462	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	349.855,22
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Polanjšćak do k.br. 17		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	8.640,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Samobor - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici	417.202	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	398.291,14
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Samobor - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	18.800,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Istočnoj ulici	408.683	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	381.668,40
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Istočnoj ulici		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	18.980,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Dražice	280.823	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	269.304,79
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Dražice		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	7.200,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	ZAGREB - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Novačkoj ulici do k.č. 2034/1 k.o. Dubrava, radovi	294.117	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	262.617,29

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Novačkoj ulici do k.č. 2034/1 k.o. Dubrava, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	19.500,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sveta Nedelja - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Topolje, radovi	244.108	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	219.608,10
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sveta Nedelja - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Topolje, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	15.500,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Veliki Potok za k.br. 32, radovi	207.292	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	195.691,59
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Veliki Potok za k.br. 32, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	11.600,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Samobor - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda DN50 mm u ulici E. Kumičića, radovi	250.274	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	209.662,39
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Samobor - rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda DN50 mm u ulici E. Kumičića, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	12.980,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Starjak, radovi	219.005	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	192.566,63
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Starjak, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	6.720,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sveta Nedelja - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Dugi put u naselju Bestovje, radovi	220.203	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	210.128,93
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Sveta Nedelja - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Dugi put u naselju Bestovje, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	7.600,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Općina Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odvojcima ulice Japejci, radovi	159.410	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	153.652,48
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Općina Stupnik - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u odvojcima ulice Japejci, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	4.000,00
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Markulinska draga II. odvojak do kbr 2, radovi	122.361	23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	102.804,24
11		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	NPOO	Zagreb - izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Markulinska draga II. odvojak do kbr 2, nadzor		23.12.2021.	10.11.2021.	25.11.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	5.184,00

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUC-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUC-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
		145	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	U okviru projekta RVS Zagreb - istok		17.05.2018.	N/P	ima	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	
		33	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac	2	-								-	-	
		46	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Jastrebarsko		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju	u izvođenju	
		46	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	2	FSEU	Hitne sanacije komunalnih vodnih građevina	87.219	1.12.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	-	u izvođenju	0,00
		46	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	2	FSEU	Vraćanje u ispravno stanje sustava vodoopskrbe	765.000	1.12.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	-	u izvođenju	0,00
		17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	3	-								-	-	
		6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Velika Gorica		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju	u izvođenju	
		6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Dubranec	3.707.458	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	završeno	3.436.781,07
		6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	1	FSEU	Sanacija šteta i vraćanje u tehnički ispravno stanje infrastrukture i pogona vodoopskrbnog sustava Velika Gorica nakon potresa	1.567.730	1.12.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	-	u izvođenju	0,00
		6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	1	FSEU	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture na sustavima javne vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području VG Vodoopskrba d.o.o.	7.712.000	1.12.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	-	u izvođenju	0,00
		32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina	3	RPHV	Izgradnja spojnog cjevovoda Škoci, naselje Selsko Brdo	534.334	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u pripremi	u izvođenju	375.000,00
		32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina	3	RPHV	Izgradnja spojnog cjevovoda Kramarići, naselje Bratina	505.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u pripremi	u pripremi	0,00
		5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	Izgradnja vodociplišta Kosnica		17.05.2018.	N/P	ima	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	36.117.702,06
		5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	Izgradnja osnovnog dobavnog sustava	707.108.262	17.05.2018.	N/P	ima	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	114.167.237,24

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili POU-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili POU-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
13		5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	Izgradnja i rekonstrukcija Vrbovec		17.05.2018.	N/P	ima	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	126.122.163,06
13		5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	Izgradnja i rekonstrukcija Sv. Ivan Zelina		17.05.2018.	N/P	ima	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	37.647.399,92
13		5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	Izgradnja i rekonstrukcija Dugo Selo		17.05.2018.	N/P	ima	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	64.390.753,50
13		5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	Izgradnja i rekonstrukcija Ivanić Grad		17.05.2018.	N/P	ima	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	79.442.451,63
13		5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	Nadzorni upravljački centar		17.05.2018.	N/P	ima	ima	ima	u pripremi	u pripremi	0,00
13		5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	Nabava opreme za održavanje		17.05.2018.	N/P	ima	ima	ima	u pripremi	u pripremi	0,00
13		5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	Usluge nadzora		17.05.2018.	N/P	ima	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	7.812.625,00
13		5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	Imovinsko pravni odnosi		17.05.2018.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	u izvođenju	5.553.679,33
13		5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	Usluge upravljanja projektom		17.05.2018.	N/P	ima	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	7.088.377,87
13		5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	1	OPKK 2014-2020	Promidžba i vidljivost		17.05.2018.	N/P	ima	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	281.401,00
13		5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	1	RPHV	Vodoopskrbna mreža u dijelu naselja Starog Grada Ivanić-Grada	1.700.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u pripremi	u pripremi	0,00

Uslužno područje	JVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili POU-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili POU-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
13		149	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALNIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Križić	1.242.954	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	898.480,47
13		149	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALNIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Utiskani	1.806.636	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	253.761,62
13		149	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALNIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Blatnica	1.830.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u pripremi	0,00
14		9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Furjan - Bogovolja - Kruškovača - Komesarac, 1.faza: Furjan - Bogovolja	5.865.719	03.02.2022.	25.08.2021.	24.10.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	5.315.700,60
14		9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Božić Brdo - Dobrenica	2.730.336	03.02.2022.	25.08.2021.	24.10.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.569.842,40
14		11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	1	RPHV	Završetak izgradnje vodovoda Gornje i Donje Bukovje (Generalski Stol)	4.929.993	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	4.926.990,71
14		11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	1	RPHV	Završetak rekonstrukcije vodocrpilišta Novigrad na Dobri	3.013.288	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	2.715.185,69
14		11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	1	RPHV	Uključivanje u sustav javne vodoopskrbe novih bunarai 1 i 2 na vodocrpilištu Novigrad na Dobri	2.139.067	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	1.184.468,06
14		11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	1	RPHV	Vodoopskrba u općini Krnjak	0	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u pripremi	u pripremi	0,00
14		22	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	1	RPHV	Izgradnja vodovoda naselja Popovo Selo	2.000.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u pripremi	u pripremi	0,00
14		24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj	1	RPHV	Rekonstrukcija cjevovoda Vuksani-Mali Erjavec	1.184.540	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u pripremi	u pripremi	0,00
14		24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj	1	RPHV	Rekonstrukcija cjevovoda u naselju Mali Erjavec	561.659	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u pripremi	u pripremi	0,00
14		29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Karlovac		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju	u izvođenju	
14		29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	2	NPOO	Izgradnja sanitarne kanalizacije, rekonstrukcija mješovite kanalizacije i vodoopskrbe – državna cesta D6, dionica Stative-Borlin (dio koji se odnosi na vodoopskrbu procijenjeno na 50%)	9.361.798	03.02.2022.	08.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju	
14		29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	2	RPHV	Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih objekata vodoopskrbnog podsustava Draganić (CS Ilovac, prijelaz preko kanala Kupa-Kupa)	23.404.495	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	16.690.348,69

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. izvješće	Status provedbe 2. izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
14		44	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	2	NPOO	Izgradnja vodovoda Ključar, radovi	2.061.892	23.03.2022.	02.11.2021.	18.03.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	1.879.701,87
14		44	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	2	NPOO	Izgradnja vodovoda Ključar, nadzor		23.03.2022.	02.11.2021.	18.03.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	38.500,00
14		44	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	2	NPOO	Izgradnja vodovoda Ključar, promidžba i vidljivost	0	23.03.2022.	02.11.2021.	18.03.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	0,00
14		44	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	2	RPHV	Proširenje vodovodne mreže Široka Rijeka u općini Vojnić	5.115.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u pripremi	u pripremi	0,00
14		44	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	2	FSEU	Sanacija puknuća na vodoopskrbnim sustavima općine Vojnić	159.720	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	završeno	159.719,89
14		146	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić	3	RPHV	Vodoopskrba na području općine Krašić	100.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u pripremi	u pripremi	0,00
14		151	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	3	-								-	-	
15		18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	2	FSEU	Izrada idejnog i glavnog projekta magistralnog vodovoda Pašino Vrelo - vodospremnik Panjani	985.000	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	u izvođenju	0,00
15		18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	2	FSEU	Priključenje zdenca SPBPV-1/06 na sustav javne vodoopskrbe	1.834.978	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	u izvođenju	0,00
15		18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	2	FSEU	Sanacija zdenaca PVB 1, PVB 2, PVB 3	4.825.000	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	u izvođenju	0,00
15		18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	2	FSEU	Sanacija od potresa dijela vodovodne i kanalizacijske infrastrukture Grada Hrvatska Kostajnica	9.695.000	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	u izvođenju	0,00
15		18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	2	FSEU	Sanacija kvarova na vodoopskrbnom području Hrvatska Kostajnica	8.410.989	1.12.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	-	u izvođenju	0,00
15		18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	2	RPHV	Završetak uključanja novog zdenca na crpilištu Pašino vrelo u vodoopskrbni sustav	1.497.504	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	1.372.595,30
15		42	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	NPOO	Rekonstrukcija dobavnog cjevovoda od izvorišta Pecki do VS Popova šuma, nadzor	198.000	23.12.2021.	27.10.2021.	19.01.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	198.000,00
15		42	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	NPOO	Rekonstrukcija dobavnog cjevovoda od izvorišta Pecki do VS Popova šuma, vođenje projekta	189.500	23.12.2021.	27.10.2021.	19.01.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	189.500,00

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
15		42	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	NPOO	Rekonstrukcija dobavnog cjevovoda od izvorišta Pecki do VS Popova šuma, promidžba i vidljivost	18.525.406	23.12.2021.	27.10.2021.	19.01.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	0,00
15		42	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Brest Pokupski i Mala Gorica, radovi	9.597.679	23.12.2021.	27.10.2021.	19.01.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	3.909.977,51
15		42	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Brest Pokupski i Mala Gorica, nadzor		23.12.2021.	27.10.2021.	19.01.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	186.310,15
15		42	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Brest Pokupski i Mala Gorica, promidžba i vidljivost		23.12.2021.	27.10.2021.	19.01.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	0,00
15		42	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	NPOO	Rekonstrukcija dobavnog cjevovoda Hrastovica - VS Zebinac	15.464.938	04.11.2022.	N/P	6.6.2022	u pripremi	u pripremi	-	u pripremi	0,00
15		42	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Taborište, Hratovica i Donja Budičina	19.681.890	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	14.626.945,91
15		42	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	FSEU	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama Privrede d.o.o., Petrinja	161.405.269	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	u izvođenju	28.736.800,32
15		42	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	FSEU	Saniranje nakon potresa i vraćanje u funkcionalno stanje vodovodne mreže u naseljima Bačuga, Donja Bačuga, Pecki, Banski Grabovac i Luščani	29.965.000	1.12.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	-	u izvođenju	0,00
15		47	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2	NPOO	Magistralni cjevovod Glina - Maja - Dragotina	16.031.071	23.03.2022.	05.11.2021.	20.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	12.519.103,09
15		47	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2	FSEU	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline - Sanacija vodospreme Pogledič 1	342.150	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	završeno	342.150,00
15		47	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2	FSEU	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline - Sanacija vodospreme Pogledič 2	412.500	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	u izvođenju	36.500,00
15		47	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2	FSEU	Tehničko rješenje sanacije odrona na padini ispod vodospreme Pogledič u Glini	716.500	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	u izvođenju	93.500,00
15		47	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2	FSEU	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama – hitne mjere sanacije na području Grada Gline	1.087.282	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	u izvođenju	1.076.282,36
15		47	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2	FSEU	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama na području Grada Gline - Sanacija sustava odvodnje	28.095.800	1.12.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	-	u izvođenju	0,00

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
15		47	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Trg.dr. Franje Tuđmana u Glini	450.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
15		50	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	2	FSEU	Vodovodna mreža u Ulici Zrinskih i Frankopana u Dvoru - Građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b skupine	4.006.681	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	u izvođenju	3.887.633,38
15		50	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	2	FSEU	Saniranje nakon potresa i vraćanje u funkcionalno stanje, vodovodne mreže u ulici Kralja Tomislava - Općina Dvor	2.301.433	20.07.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	-	u izvođenju	113.800,00
15		50	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	2	FSEU	Saniranje nakon potresa i vraćanje u funkcionalno stanje, vodovodne mreže Trg bana Josipa Jelačića - Općina Dvor	819.458	20.07.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	-	u izvođenju	55.700,00
15		50	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	2	FSEU	Saniranje nakon potresa i vraćanje u funkcionalno stanje, vodovodne mreže u ulici Alojzija Stepinca - Općina Dvor	2.684.061	20.07.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	-	u izvođenju	69.560,00
15		50	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	2	FSEU	Saniranje nakon potresa, vodovodne mreže u naselju Matijevići - Općina Dvor i vraćanje u funkcionalno stanje	5.051.667	1.12.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	-	u izvođenju	0,00
15		50	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	2	FSEU	Saniranje nakon potresa i vraćanje u funkcionalno stanje vodoccrplišta – Unsko polje – Općina Dvor	3.931.100	1.12.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	-	u izvođenju	0,00
15		50	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbne mreže za naselja Vanići, Grmušani, Gage, Stupnica i Rujevac	8.500.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
15		50	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	2	RPHV	Izgradnja crpne stanice Struga Banska	1.235.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
15		50	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	2	RPHV	Izvedba radova na uvođenju u funkciju vodoopskrbnog cjevovoda Dvor - Kozibrod sa izvedbom kućnih priključaka.	5.120.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	500.000,00
15		43	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	3	FSEU	Sanacija šteta nastalih potresom na vodoopskrbnom sustavu općina Topusko i Gvozd	492.628	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	završeno	492.627,84
15		43	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	3	RPHV	vodoopskrbni cjevovodi na distributivnom području Topusko i Gvozd	0	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
15		148	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	3	-								-	-	
15		138	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISACKI VODOVOD d.o.o. Sisak	3	-								-	-	
16		25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISACKI VODOVOD d.o.o. Sisak	1	FSEU	Sanacije šteta neposredno poslije potresa u postrojenju za kondicioniranje vode Novo Selište, vodoopskrbnom sustavu i sustavu	14.943.259	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	u izvođenju	4.896.862,59

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
						odvodnje područja pod ingerencijom Sisačkog vodovoda (Sisak I)									
16		25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	1	FSEU	Sanacije šteta i vraćanje u tehnički ispravno stanje postrojenja za kondicioniranje vode Novo Selište i vodoopskrbnog sustava pod ingerencijom Sisačkog vodovoda nakon potresa (Sisak II)	56.122.842	17.01.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u izvođenju	u izvođenju	73.400,00
16		25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	1	RPHV	Izgradnja sifonskog vodoopskrbnog cjevovoda uzvodno od Starog mosta	1.371.561	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	završeno	1.371.560,95
16		25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	1	RPHV	Sanacija građevinske konstrukcije zgrade taložnice T2 i zasunske komore, te nadzemnog dijela građevinske konstrukcije taložnice T1	4.514.635	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	završeno	4.514.635,07
16		25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	1	RPHV	Sanacija i rekonstrukcija strojarске opreme u taložnici vode T2	1.526.450	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	završeno	1.526.450,00
16		25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	1	RPHV	Sanacija strojarске opreme u zgradi ozona	203.187	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	završeno	203.186,91
16		25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	1	RPHV	Sanacija električnih instalacija u zgradi taložnice T1, T2 i zasunske komore	561.071	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	završeno	561.071,00
16		25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	1	RPHV	Sanacija instalacije grijanja, ventilacije i odvlaživanja u taložnici 1 i taložnici 2	319.263	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	završeno	319.263,00
16		25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	1	RPHV	Vodoopskrbni cjevovod u ulici Ivana Mažuranića	652.722	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u pripremi	u pripremi	0,00
17		41	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Kutina		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
17		41	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	2	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže Ulici Sokolovec u Kutini, radovi		23.12.2021.	17.03.2022.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	424.618,70
17		41	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	2	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže Ulici Sokolovec u Kutini, nadzor	445.119	23.12.2021.	17.03.2022.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	15.500,00
17		41	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	2	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže Ulici Sokolovec u Kutini, promidžba i vidljivost		23.12.2021.	17.03.2022.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	0,00
17		41	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	2	FSEU	Projekt obnove konstrukcije građevine - sanacija Vodospremnika Kutina	3.119.500	1.12.2022.	N/P	N/P	N/P	N/P	u pripremi	u izvođenju	0,00
17		41	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	2	NPOO	Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u južnom dijelu Ulice Stjepana Radića u Kutini	5.509.154	-	-	-	-	-	-	u najavi	

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
17		21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Novska		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
17		21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	2	RPHV	Rekonstrukcija strojarne opreme na postrojenju prerade vode (ugradnja frekventnog regulatora i hidrostatske sonde)	57.429	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	završeno	57.428,80
17		21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	2	RPHV	Sanacija bazena aerirane vode (vodosprema)	251.760	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	završeno	251.760,00
17		14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	3	-								-	-	
17		15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	3	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Jasenovac i Uštica, radovi	11.610.850	23.03.2022.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	7.487.440,03
17		15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	3	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Jasenovac i Uštica, nadzor		23.03.2022.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	115.050,29
17		15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	3	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Jasenovac i Uštica, vođenje projekta		23.03.2022.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	110.700,00
17		15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	3	NPOO	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Jasenovac i Uštica, promidžba i vidljivost		23.03.2022.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u pripremi	u pripremi	0,00
17		20	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	3	-								-	-	
18		28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKIJIA d.o.o. Požega	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Požega		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
18		28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKIJIA d.o.o. Požega	1	RPHV	Izgradnja vodovodne mreže u Požeškoj ulici u Brestovcu	1.335.913	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	1.270.904,13
18		31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Lipik - Pakrac		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
18		31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbne mreže Psunjaska-Sv.Rok u Pakracu s rekonstrukcijom CS	1.968.319	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	1.736.826,92
18		31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	2	RPHV	Izgradnja mreže naselja Omanovac	1.300.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
19		37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Nova Gradiška faza 2		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
19		37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	1	NPOO	Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Godinjak - Tisovac i opskrbnih cjevovoda naselja Tisovac, radovi	2.271.364	03.02.2022.	02.11.2021.	09.12.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	1.559.708,25
19		37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	1	NPOO	Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Godinjak - Tisovac i opskrbnih cjevovoda naselja Tisovac, nadzor		03.02.2022.	02.11.2021.	09.12.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	78.000,00
19		37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	1	RPHV	Izgradnja CS u Novoj Gradiški u ulici Mala, Izgradnja CS u Novoj Gradiški u ulici Sv. Roka, Izgradnja vodoopskrbe naselja Stara Kapela	2.883.652	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
19		37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbne mreže Adžamovci - Staro Petrovo Selo - Billi Brig	4.499.991	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	3.219.876,62
19		37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	1	RPHV	Izgradnja vodovodnih kućnih priključaka u naseljima Staro Petrovo Selo, Godinjak, Vrbova, Štivilica, Komarnica na području općine Staro Petrovo Selo	4.497.559	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	2.895.435,75
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Izgradnja cjevovoda Dionica 1 Trnjani - Šušnjevc, radovi	1.543.610	23.12.2021.	04.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	499.703,34
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Izgradnja cjevovoda Dionica 1 Trnjani - Šušnjevc, nadzor		23.12.2021.	04.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Izgradnja cjevovoda Dionica 1 Trnjani - Šušnjevc, arheologija		23.12.2021.	04.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Dionica D3.3 Velika i Mala Kopanica, radovi	6.541.852	04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Dionica D3.3 Velika i Mala Kopanica, nadzor		04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Dionica D3.3 Velika i Mala Kopanica, promidžba i vidljivost		04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Dionica D3.3 Velika i Mala Kopanica, vođenje projekta		04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Dionica D3.4. Divoševci, radovi	10.174.468	04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Dionica D3.4. Divoševci, nadzor		04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Dionica D3.4. Divoševci, rpromidžba i vidljivost		04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Dionica D3.4. Divoševci, vođenje projekta		04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Dionica D3.5. Sredanci, radovi		04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Dionica D3.5. Sredanci, nadzor		04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Dionica D3.5. Sredanci, promidžba i vidljivost	11.468.231	04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Dionica D3.5. Sredanci, arheologija		04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Dionica D3.5. Sredanci, vođenje projekta		04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Mala Kopanica, radovi		04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Mala Kopanica, nadzor		04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Mala Kopanica, promidžba i vidljivost	1.910.391	04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Mala Kopanica, arheologija		04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Mala Kopanica, vođenje projekta		04.11.2022.		18.05.2020.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Divoševci, radovi							-	u najavi	
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Divoševci, nadzor	4.148.253						-	u najavi	
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Divoševci, promidžba i vidljivost							-	u najavi	

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)	
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Divoševci, arheologija	3.650.676						-	u najavi		
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Divoševci, vođenje projekta								-	u najavi	
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Sredanci, radovi								-	u najavi	
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Sredanci, nadzor								-	u najavi	
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Sredanci, promidžba i vidljivost								-	u najavi	
20		26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	1	NPOO	Vodoopskrbna distribucijska mreža naselja Sredanci, vođenje projekta								-	u najavi	
20		131	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Đakovo		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)		
21		38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Županja faza 2		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju	u izvođenju		
21		49	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	1	NPOO	REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA GRADA VINKOVACA, radovi	24.395.085	23.03.2022.	N/P	24.08.2016.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	9.643.378,23	
21		49	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	1	NPOO	REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA GRADA VINKOVACA, nadzor		23.03.2022.	N/P	24.08.2016.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	82.550,00	
21		49	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	1	NPOO	REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA GRADA VINKOVACA, promidžba i vidljivost		23.03.2022.	N/P	24.08.2016.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	3.400,00	
21		49	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	1	RPHV	Vodosprema i crna stanica Županja	47.100.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi		
21		49	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	1	RPHV	Vodosprema i crna stanica Slakovci	27.820.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi		
21		49	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	1	RPHV	Vodosprema i crna stanica Drenovci	32.100.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi		
21		10	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci	2	-								-	-		

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili POU-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili POU-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
21		13	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja	2	-								-	-	
22		88	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Vukovar faza 2		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
22		88	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	1	NPOO	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Borovu naselju u Vukovaru	2.340.303	23.03.2022.	06.11.2021.	23.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.224.310,24
22		90	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU KOMUNALNIJE d.o.o. Ilok	1	NPOO	Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda Grada Iloka u ulicama Dr.Franje Tuđmana, Fruškogorska, T. Bošnjaka, K. Branimira i V. Nazora	1.934.114	04.11.2022.	12.10.2021.	06.06.2022.	ima	ima	-	u izvođenju	223.955,37
23		57	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	2	NPOO	VO VS Sv. Petar-Sv. Petar u šumi Sv.Petar u Šumi, radovi	3.038.084	23.12.2021.	13.10.2021.	15.11.2018.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	851.388,60
23		57	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	2	NPOO	VO VS Sv. Petar-Sv. Petar u šumi Sv.Petar u Šumi, radovi		23.12.2021.	13.10.2021.	15.11.2018.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	1.966.405,92
23		57	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	2	NPOO	VO VS Sv. Petar-Sv. Petar u šumi Sv.Petar u Šumi, nadzor		23.12.2021.	13.10.2021.	15.11.2018.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	25.560,00
23		57	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	2	NPOO	VO VS Sv. Petar-Sv. Petar u šumi Sv.Petar u Šumi, nadzor		23.12.2021.	13.10.2021.	15.11.2018.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	51.950,00
23		57	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	2	NPOO	VO Rimanići - Tominčići - Medigi - Čopi - Maršani -3.dionica, radovi	2.788.047	23.12.2021.	13.10.2021.	15.11.2018.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.573.202,97
23		57	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	2	NPOO	VO Rimanići - Tominčići - Medigi - Čopi - Maršani -3.dionica, nadzor		23.12.2021.	13.10.2021.	15.11.2018.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	63.500,00
23		57	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Mošćeničkoj Dragi - dionica rotor D 66 - Sv. Ivan	2.184.245	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	
23		57	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	2	RPHV	izgradnja vodovodnog ogranka za naselja Gorenja Vas - Sveti Stjepan - Dajčići II faza	1.800.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
23		57	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	2	RPHV	izgradnja VS Farini 600 m3	2.628.463	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	1.940.000,00
23		57	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	2	RPHV	izgradnja vodovodnog ogranka Fratrija - Plovanija	3.000.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. izvješće	Status provedbe 2. izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
		57	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	2	RPHV	Izgradnja vodovodnih ogranaka u Sv.Petru u šumi - Grgani	3.500.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
		67	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone grada Labina, te izgradnja crpnih stanica, radovi	10.072.463	23.03.2022.	05.11.2021.	06.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	3.738.015,73
		67	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone grada Labina, te izgradnja crpnih stanica, nadzor		23.03.2022.	05.11.2021.	06.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	83.312,85
		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Prvi Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže Prodol - Taškerovi dvori Anex Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji vodovodne mreže Prodol-Taškerovi dvori	1.268.384	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	1.268.384,10
		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Prvi Ugovor za usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator 2) nad izvođenjem radova rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Taškerovi dvori na području Općine Marčana	29.248	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	29.247,67
		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Narudžbenica za radove Promidžbe i vidljivosti tijekom Rekonstrukcije vodovodne mreže Prodol-Taškerovi dvori	5.996	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	5.996,00
		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Drugi Ugovortemeljem Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže Prodol - Taškerovi dvori	4.611.408	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju	3.712.234,95
		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Drugi Ugovor za usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator 2) nad izvođenjem radova rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Taškerovi dvori na području Općine Marčana		16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju	94.661,86
		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Prvi Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma za izvođenjem radova rekonstrukcije tlačnog cjevovoda CS Rakonek Dodatak Prvom Ugovoru temeljem Okvirnog sporazuma za izvođenjem radova rekonstrukcije tlačnog cjevovoda CS Rakonek II. Dodatak Prvom Ugovoru temeljem Okvirnog sporazuma za izvođenjem radova rekonstrukcije tlačnog cjevovoda CS Rakonek	4.210.725,93	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	4.210.725,93

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Ugovor za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova I koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator 2) nad izvođenjem radova rekonstrukcije tlačnog cjevovoda CS Rakonek - Zasunska komora VS Prnjani, dionica 3, dio 1 i dio 2"bypas i zaštitna ograda - na području Općine Barban	103.163	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	103.162,61
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Narudžbenica za radove Promidbe i vidljivosti tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji tlačnog cjevovoda CS Rakonek - Zasunska komora Prnjani	5.966	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	5.966,00
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Drugi Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma o izvođenju radova rekonstrukcije tlačnog cjevovoda CS Rakonek Dodatak II Ugovoru o izvođenju radova rekonstrukcije tlačnog cjevovoda CS Rakonek	18.303.911	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju	5.813.219,11
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Ugovor po Okvirnom sporazumu za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova I koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator 2) nad izvođenjem radova rekonstrukcije tlačnog cjevovoda CS Rakonek - zasunska komora VS Prnjani		16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju	170.800,00
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Prvi Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda Štokovci - Gilešići sa izgradnjom RS Boškari	312.242	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	312.241,63
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Drugi Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda Štokovci - Gilešići sa izgradnjom RS Boškari	38.173	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	38.172,90
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Prvi Ugovor za usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator 2) nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda Štokovci - Gilešići i izgradnji RS Štokovci na području Općine Svetvinčenat	6.089	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	6.088,70
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Drugi Ugovor za usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator 2) nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda Štokovci - Gilešići i izgradnji RS Štokovci na području Općine Svetvinčenat	784	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	783,54

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izviješće	Status provedbe 2. Izviješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Narudžbenica za radove Promidbe i vidljivosti tijekom rekonstrukcijevodoopskrbnog cjevovoda Štokovci – Gilešići sa izgradnjom redukcijskim stanicama Boškari i Režanci	5.966	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	5.966,00
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Treći Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda Štokovci-Gilešići sa izgradnjom RS Boškari		16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju	2.496.409,73
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	NPOO	Treći Ugovor za usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja (koordinator 2) nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda Štokovci — Gilešići i izgradnji RS Štokovci na području Općine Svetvinčenat	6.693.792	16.12.2021.	12.10.2021.	04.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju	49.698,02
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	RPHV	Nastavak izgradnje vodovodne mreže Šišan	1.665.102	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	100.000,00
24		68	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	2	RPHV	Zamjene dijela postojećeg glavnog cjevovoda DN 200 mm na otočju Brijuni	7.000.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
25		56	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar	1	RPHV	Izgradnja zaštitne ograde oko VS Sokoli u Čabru	58.670	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	završeno	58.670,00
25		56	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar	1	RPHV	Ugradnja opreme i mjernih uređaja i uređaja za dezinfekciju vode na vodospremi Gerovski Kraj	56.330	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
25		56	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar	1	RPHV	Izgradnja zaštitne ograde oko VS Gerovski Kraj	10.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
25		56	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar	1	RPHV	Dobava i ugradnja nove crpke na CVS Tropeti i u mjestu Plešće	250.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
25		61	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Rijeka		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju	u izvođenju	
25		61	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	NPOO	Građenje u naselju Melnice II B dio građevine - vodoopskrba	3.997.703,38	23.12.2021.	08.11.2021.	04.08.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	3.997.703,38
25		61	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	NPOO	Građenje u naselju Melnice II B dio građevine - vodoopskrba (II. ugovor)	2.748.544	23.12.2021.	08.11.2021.	04.08.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.748.543,72
25		61	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	NPOO	Građenje u naselju Melnice II B dio građevine - vodoopskrba (III. ugovor)	8.154.677	23.12.2021.	08.11.2021.	04.08.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	5.745.408,27

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
25		61	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	NPOO	Usluga stručnog i obračunskog nadzora te usluga koordinatora II zaštite na radu na građenju u naselju Melnice II B dio građevine - vodoopskrba (ugovor I.)	90.000	23.12.2021.	08.11.2021.	04.08.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	90.000,00
25		61	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	NPOO	Usluga stručnog i obračunskog nadzora te usluga koordinatora II zaštite na radu na građenju u naselju Melnice II B dio građevine - vodoopskrba (ugovor II.)	59.000	23.12.2021.	08.11.2021.	04.08.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	59.000,00
25		61	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	NPOO	Usluga stručnog i obračunskog nadzora te usluga koordinatora II zaštite na radu na građenju u naselju Melnice II B dio građevine - vodoopskrba (ugovor III.)	132.000	23.12.2021.	08.11.2021.	04.08.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	132.000,00
25		61	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	NPOO	Upravljanje projektom na građenju u naselju Melnice IIB dio građevine - vodoopskrba	113.000	23.12.2021.	08.11.2021.	04.08.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	113.000,00
25		61	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	NPOO	Promidžba i vidljivost- vodoopskrba naselja Melnice II B dio građevine	6.800	23.12.2021.	08.11.2021.	04.08.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	6.800,00
25		61	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	RPHV	Izgradnja vodovodnog ogranka Kalužica na području općine Klana	550.164	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	100.000,00
25		61	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u sklopu izgradnje kanalizacijskog kolektora u Bakru	29.859.884	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	RPHV	Nastavak rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda u sklopu izgradnje kanalizacijske mreže kolektora u Mrkoplju	6.380.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	1.663.628,15
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	RPHV	Završetak sanacije cjevovoda Planina Skradaska	1.042.587	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	816.073,40
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	RPHV	Izgradnja HS Brod na Kupi	1.100.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbe u naselju Velika Voda	1.000.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Delnice faza 1	43.348.300	27.03.2018.	12.01.2017.	29.05.2017.	ima	ima	završeno	završeno	47.866.872,71
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Delnice faza 2	2.210.314	27.03.2018.	12.01.2017.	29.05.2017.	ima	ima	završeno	završeno	1.823.373,17
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Delnice faza 3	14.979.753	27.03.2018.	12.01.2017.	29.05.2017.	ima	ima	završeno	završeno	12.973.484,81

Uslužno područje	JVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili POU-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili POU-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Delnice faza 4B - gravitacijski energetski kanal	6.498.000	27.03.2018.	12.01.2017.	29.05.2017.	ima	ima	u izvođenju	završeno	6.498.000,00
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Faza 4 C - sanacija objekata vodoopskrbe - dio koji se odnosi na Delnice	3.296.528	27.03.2018.	12.01.2017.	29.05.2017.	ima	ima	u izvođenju	završeno	3.427.574,64
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Delnice - NUS - Faza 4A (Delnice, Fužine, Brod Moravice)	7.387.707	10.02.2022.	n/p	n/p	n/p	n/p	u pripremi	u izvođenju	383.100,00
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Fužine - faza 2	2.793.726	27.03.2018.	16.1.2017.	22.08.2017.	ima	ima	završeno	završeno	2.788.547,57
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Fužine - grupa 1 - Fužine i Vrata	11.293.504	27.03.2018.	16.1.2017.	22.08.2017.	ima	ima	u izvođenju	završeno	11.475.190,44
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Fužine - grupa 2 - Lič	13.023.768	27.03.2018.	16.1.2017.	22.08.2017.	ima	ima	u izvođenju	završeno	13.505.071,04
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Faza 4 C- sanacija objekata vodoopskrbe - dio koji se odnosi na Fužine	2.636.619	27.03.2018.	16.1.2017.	22.08.2017.	ima	ima	u izvođenju	završeno	2.408.373,80
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Brod Moravice faza 2	11.330.593	27.03.2018.	13.01.2017.	21.09.2017.	ima	ima	završeno	završeno	11.330.592,68
25		53	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	SD	Faza 4 C- sanacija objekata vodoopskrbe - dio koji se odnosi na Brod Moravice	1.950.011	27.03.2018.	13.01.2017.	21.09.2017.	ima	ima	u izvođenju	završeno	1.909.594,06
25		58	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Mošćeničkoj Dragi - dionica rotor D 66 - Sv. Ivan	2.184.245	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	617.262,29
25		65	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko	2	RPHV	Rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda u sklopu izgradnje kanalizacijske mreže kolektora u Vrbovskom	2.960.608	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	720.114,66
26		59	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Krk		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju	u izvođenju	
26		59	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1	RPHV	Izgradnja vodovoda na predlu Kimpi - Krk	3.800.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	847.602,27
26		59	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1	RPHV	Spojni vodovod naselja Strličići - Malinska - Dubašnica	2.000.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	257.034,85
26		59	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1	RPHV	Visoka zona u naselju Šilo - Dobrinj	1.791.883	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	439.693,20
26		59	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	1	RPHV	Vodovodni ogranak do kraja naselja batomalj do Svetišta Majke Božice Goričke u Batomlju i hidrostanica Batomalj - Baška	1.300.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	854.881,69

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
26		62	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Cres - Lošinj		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju	u izvođenju	
26		62	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	2	RPHV	Izgradnja vodopokrbrne mreže na Unijama II faza	500.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	100.000,00
26		62	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	2	RPHV	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda U Malom Lošinj na dionici AC Poljana do Privlake	7.000.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
26		62	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	2	RPHV	Izgradnja vodoopkrbnog sustava u naselju Beli	10.000.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
26		62	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	2	RPHV	Izgradnja vodoopkrbnog sustava Pržiči - Cres	7.100.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
26		62	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	2	RPHV	Izgradnja vodoopkrbnog sustava Porozina	10.000.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
27		70	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
28		54	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Novalja		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
28		51	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o. Karlobag	2	RPHV	Izgradnja vodovodnog ogranka Dražica na području Lopara; izgradnja HS Andreškići na području Lopara	475.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	664.801,48
28		63	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	2	RPHV	Izgradnja vodovodnog cjevovoda u Ulici Damira Tomljanovića Gavrana	9.059.923	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	1.422.659,61
28		69	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab	2	-								-	-	
28		110	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	2	NPOO	Izgradnja VS Smokvina u vodoopkrbnom sustavu općine Poveljana, radovi		23.12.2021.	20.10.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	2.321.308,39
28		110	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	2	NPOO	Izgradnja VS Smokvina u vodoopkrbnom sustavu općine Poveljana, nadzor	6.395.717	23.12.2021.	20.10.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	61.000,00
28		110	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	2	NPOO	Izgradnja VS Smokvina u vodoopkrbnom sustavu općine Poveljana, promidžba i vidljivost		23.12.2021.	20.10.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	665,00
28		110	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	2	NPOO	Rekonstrukcija spojnog cjevovoda C-1, radovi	1.477.554	04.11.2022.		11.05.2022.	ima	ima	-	u izvođenju	

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
28		110	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	2	NPOO	Rekonstrukcija spojnog cjevovoda C-1, nadzor		04.11.2022.		11.05.2022.	ima	ima	-	u izvođenju	
28		110	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	2	NPOO	Rekonstrukcija spojnog cjevovoda C-1, promidžba i vidljivost		04.11.2022.		11.05.2022.	ima	ima	-	u izvođenju	
28		110	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	2	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže u dijelu naselja Poveljana i fekalnog priključka radne zone od stacionaže 0+441.39 do 0+836.52 te dobava i ugradnja opreme za nadzorno - upravljački sustav te opreme za daljinsko očitavanje vodomjera, radovi							-	u pripremi	
28		110	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	2	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže u dijelu naselja Poveljana i fekalnog priključka radne zone od stacionaže 0+441.39 do 0+836.52 te dobava i ugradnja opreme za nadzorno - upravljački sustav te opreme za daljinsko očitavanje vodomjera, nadzor	5.730.451						-	u pripremi	
28		110	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	2	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže u dijelu naselja Poveljana i fekalnog priključka radne zone od stacionaže 0+441.39 do 0+836.52 te dobava i ugradnja opreme za nadzorno - upravljački sustav te opreme za daljinsko očitavanje vodomjera, promidžba i vidljivost							-	u pripremi	
28		112	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	2	NPOO	Izgradnja procrpne stanice Gorica (Vrčići), radovi		03.02.2022.	20.10.2021.	12.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	1.308.360,43
28		112	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	2	NPOO	Izgradnja procrpne stanice Gorica (Vrčići), nadzor	1.467.811	03.02.2022.	20.10.2021.	12.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	67.500,00
28		112	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	2	NPOO	Izgradnja procrpne stanice Gorica (Vrčići), promidžba i vidljivost		03.02.2022.	20.10.2021.	12.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	708,75
28	VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. Senj	63	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj	2	RPHV	Program za održavanje izvorišta Gusić jezero	598.500	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	675.000,00
28	VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. Senj	63	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj	2	RPHV	Unaprjeđenje praćenja kvalitete vode i unaprjeđenje sustava upravljanja objektom	290.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u pripremi	u izvođenju	73.050,56

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izviješće	Status provedbe 2. Izviješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
28	VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. Senj	63	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj	2	RPHV	Rekonstrukcija i dogradnja uređaja za preradu Hrmatine	450.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u pripremi	u izvođenju	177.949,44
28	VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. Senj	1 dodatni	Razvoj alternativnog sustava opskrbe regionalnog vodovoda za UP 28 (VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. Senj)	N/P	u pripremi		1.500.000.000		u pripremi		u pripremi	u pripremi	u pripremi	u pripremi	
29		48	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	2	NPOO	Izvođenje radova na vodoopskrbnom cjevovodu u naselju Smoljanac	2.206.819	23.12.2021.	27.09.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.096.501,18
29		48	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	2	NPOO	Vodoopskrbna mreža naselja Vrelo Koreničko - radovi	2.799.484	04.11.2022.	08.07.2022.	12.11.2021.	ima	ima	-	završeno	2.384.807,37
29		48	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	2	NPOO	Vodoopskrbna mreža naselja Vrelo Koreničko - nadzor i koordinator ZNR		04.11.2022.	07.07.2022.	12.11.2021.	ima	ima	-	završeno	61.750,00
29		48	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Vrelo Koreničko	2.661.715	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	2.161.554,93
29		60	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbe naselja Široka Kula, radovi		23.03.2022.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	2.209.233,84
29		60	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbe naselja Široka Kula, nadzor	7.175.556	23.03.2022.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	44.184,72
29		60	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbe naselja Široka Kula, promidžba i vidljivost		23.03.2022.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	0,00
29		60	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	2	NPOO	Rekonstrukcija i dogradnja NUS-a, radovi		22.12.2022.		20.07.2021.	ima	ima	-	u pripremi	
29		60	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	2	NPOO	Rekonstrukcija i dogradnja NUS-a, nadzor	4.208.964	22.12.2022.		20.07.2021.	ima	ima	-	u pripremi	
29		60	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	2	NPOO	Rekonstrukcija i dogradnja NUS-a, promidžba i vidljivost		22.12.2022.		20.07.2021.	ima	ima	-	u pripremi	
29		60	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	2	NPOO	Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića, radovi	17.333.352	22.12.2022.		20.07.2021.	ima	ima	-	u pripremi	
29		60	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	2	NPOO	Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića, nadzor		22.12.2022.		20.07.2021.	ima	ima	-	u pripremi	

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
		60	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	2	NPOO	Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića, promidžba i vidljivost		22.12.2022.		20.07.2021.	ima	ima	-	u pripremi	
		60	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	2	NPOO	Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića, vođenje projekta		22.12.2022.		20.07.2021.	ima	ima	-	u pripremi	
		60	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Zavode	938.729	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	178.379,00
Vreline d.o.o. Vrhovine		140	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	2	RPHV	Dobava opreme za traženje gubitaka	40.800	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	
Vreline d.o.o. Vrhovine		140	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	2	RPHV	Ugradnja hirauličnog regulatora tlaka i hvatača nečistoće i izgradnja okna	33.615	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	
		27	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica	3	RPHV	Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Jelov Klanac, izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Lađevac - Broćanac	7.250.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	
		52	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac	3	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Vranik, radovi	3.271.817	03.02.2022.	05.11.2021.	08.07.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.942.214,17
		52	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac	3	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Vranik, nadzor		03.02.2022.	05.11.2021.	08.07.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	95.000,00
		52	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac	3	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Vranik, promidžba i vidljivost		03.02.2022.	05.11.2021.	08.07.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	0,00
		52	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac	3	RPHV	Uređenje izvorišta Vrilina i Blatni Jarak	126.440	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	99.952,00
		52	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac	3	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Lovinac - Gornja Ploča	9.615.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00
		55	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina	3	RPHV	Sanacija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Udbina	5.320.287	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	2.120.441,07
		64	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VISOČICA d.o.o. Donji Lapac	3	RPHV	Rekonstrukcije i sanacije vodoopskrbnog cjevovoda u Donjem Lapcu	206.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	98.782,08
		66	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje	3	NPOO	Izgradnja objekata za zahvaćanje dodatnih količina vode na izvoru Žižić, radovi	5.840.038	23.12.2021.	N/P	5.12.2019.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	2.701.526,81
		66	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje	3	NPOO	Izgradnja objekata za zahvaćanje dodatnih količina vode na izvoru Žižić, stručni nadzor		23.12.2021.	N/P	5.12.2019.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	102.780,00
		66	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje	3	NPOO	Izgradnja objekata za zahvaćanje dodatnih količina vode na izvoru Žižić, promidžba i vidljivost	4.780	23.12.2021.	N/P	5.12.2019.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	4.780,00
		66	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje	3	RPHV	Rekonstrukcija glavnog vodoopskrbnog cjevovoda u Frankopanskoj ulici u Brinju	2.856.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u pripremi	0,00

Uslužno područje	JVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUC-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUC-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
29	Vreline d.o.o. Vrhovine	140	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	3	RPHV	Rekonstrukcija i sanacija tlačnog cjevovoda u Vrhovinama	2.410.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	0,00
29	Vreline d.o.o. Vrhovine	140	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	3	RPHV	Sanacija cjevovoda u naselju Zalužnica	470.611	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	417.318,27
29	Vreline d.o.o. Vrhovine	140	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	3	RPHV	Dobava opreme za traženje gubitaka	40.800	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	32.640,00
29	Vreline d.o.o. Vrhovine	140	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	3	RPHV	Ugradnja hirauličnog regulatora tlaka i hvatača nečistoće i izgradnja okna	33.615	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	33.615,22
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Kruševo, radovi	8.443.359	23.12.2021.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	8.194.118,22
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Kruševo, nadzor		23.12.2021.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	89.000,00
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Kruševo, arheologija	65.550	23.12.2021.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	65.550,00
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Kruševo, promidžba i vidljivost	380	23.12.2021.	05.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	380,00
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području Bokanjcau gradu Zadru, radovi	4.224.171	04.11.2022.		31.08.2021.	ima	ima	-	u izvođenju	0,00
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području Bokanjcau gradu Zadru, promidžba i vidljivost		04.11.2022.		31.08.2021.	ima	ima	-	u pripremi	0,00
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u zapadnom dijelu stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru, radovi	853.176			u tijeku	u tijeku	u tijeku	-	u izvođenju	
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u zapadnom dijelu stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru, promidžba i vidljivost				u tijeku	u tijeku	u tijeku	-	u pripremi	
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naselju Bili brig u gradu Zadru, radovi	600.353			u tijeku	u tijeku	u tijeku	-	u izvođenju	
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naselju Bili brig u gradu Zadru, promidžba i vidljivost				u tijeku	u tijeku	u tijeku	-	u pripremi	
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Rekonstrukcija CS „Dolac“, radovi	23.912.385			u tijeku	u tijeku	u tijeku	-	u izvođenju	
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Rekonstrukcija CS „Dolac“, nadzor				u tijeku	u tijeku	u tijeku	-	u pripremi	
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Rekonstrukcija CS „Dolac“, promidžba i vidljivost				u tijeku	u tijeku	u tijeku	-	u pripremi	
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Izgradnja - rekonstrukcija cjevovoda Grad Nin - VS Straža, radovi	12.494.839						-	u pripremi	

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Izgradnja- rekonstrukcija cjevovoda Grad Nin - VS Straža, nadzor							-	u pripremi	
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Izgradnja- rekonstrukcija cjevovoda Grad Nin - VS Straža, arheološki nadzor							-	u pripremi	
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	NPOO	Izgradnja- rekonstrukcija cjevovoda Grad Nin - VS Straža, promidžba i vidljivost							-	u pripremi	
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Nin - Privlaka - Vrši		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Zadar		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	RPHV	Dogradnja vodoopskrbne mreže Pridraga	3.028.717	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	2.496.866,31
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbe naselja Slivnica Gornja	7.650.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	0,00
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	RPHV	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda od Maslenice do Starigrada	34.187.170	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	3.293.275,42
30		123	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1	u pripremi	Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar	1.752.349.350	sekundarni ugovori za pripremu dokumentacije	u pripremi	u pripremi	u pripremi	u pripremi	u pripremi	u pripremi	
30		125	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	1	-								-	-	
30		105	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali	2	-								-	-	
30		111	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	2	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže i fekalnih kanala (dio vodoopskrbe procijenjen sna 50 %)	22.686.108	23.03.2022.	N/p	18.05.2018.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	
30		129	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica	2	-								-	-	
30		142	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Petrinja		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbe za naselja Vukšić i Prović, radovi	21.964.617	23.12.2021.	19.10.2021.	06.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	7.533.981,78
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbe za naselja Vukšić i Prović, nadzor		23.12.2021.	19.10.2021.	06.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	64.170,80

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbe za naselja Vukšić i Prović, vođenje projekta		23.12.2021.	19.10.2021.	06.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	67.921,08
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbe za naselja Vukšić i Prović, promidžba i vidljivost	2.400	23.12.2021.	19.10.2021.	06.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.400,00
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda za Islam Grčki-glavna trasa, radovi	10.388.819	23.12.2021.	19.10.2021.	06.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	5.966.186,31
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda za Islam Grčki-glavna trasa, nadzor		23.12.2021.	19.10.2021.	06.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	115.048,00
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda za Islam Grčki-glavna trasa, koordinator ZNR		23.12.2021.	19.10.2021.	06.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	10.000,00
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda za Islam Grčki-glavna trasa, promidžba i vidljivost	2.400	23.12.2021.	19.10.2021.	06.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.400,00
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda Lepuri, radovi	8.111.248	04.11.2022.		04.04.2022.			-	u pripremi	
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda Lepuri, nadzor		04.11.2022.		04.04.2022.			-	u pripremi	
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda Lepuri, koordinator ZNR		04.11.2022.		04.04.2022.			-	u pripremi	
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda Lepuri, promidžba i vidljivost		04.11.2022.		04.04.2022.			-	u pripremi	
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda Bulić, radovi	3.559.809						-	u izvođenju	
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda Bulić, nadzor							-	u izvođenju	
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda Bulić, promidžba i vidljivost							-	u pripremi	
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda za Islam Grčki, mjesna mreža - Islam Grčki, radovi	7.004.025						-	u izvođenju	
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda za Islam Grčki, mjesna mreža - Islam Grčki, nadzor							-	u izvođenju	

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda za Islam Grčki, mjesna mreža - Islam Grčki, koordinator ZNR							-	u izvođenju	
31		116	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	1	NPOO	Izgradnja vodovoda za Islam Grčki, mjesna mreža - Islam Grčki, promidžba i vidljivost							-	u pripremi	
31		141	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	1	NPOO	Vodoopskrba na području općine Sveti Filip i Jakov, radovi	28.384.491	22.12.2022.		28.10.2019.	ima	ima	-	u pripremi	
31		141	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	1	NPOO	Vodoopskrba na području općine Sveti Filip i Jakov, nadzor	28.384.491	22.12.2022.		28.10.2019.	ima	ima	-	u pripremi	
31		141	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	1	NPOO	Vodoopskrba na području općine Sveti Filip i Jakov, vođenje projekta	28.384.491	22.12.2022.		28.10.2019.	ima	ima	-	u pripremi	
31		141	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	1	NPOO	Vodoopskrba na području općine Pakoštane, radovi	11.602.756						-	u pripremi	
31		141	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	1	NPOO	Vodoopskrba na području općine Pakoštane, nadzor	11.602.756						-	u pripremi	
31		141	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	1	NPOO	Vodoopskrba na području općine Pakoštane, vođenje projekta	11.602.756						-	u pripremi	
32		91	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	1	RPHV	Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže - prespajanje korisnika na novoizgrađenu vodovodnu mrežu	6.654.515	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	1.850.062,99
32		96	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog sustav Biočić - Tepljuh, radovi	1.622.728	23.03.2022.	10.11.2021.	16.10.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	1.478.455,63
32		96	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog sustav Biočić - Tepljuh, nadzor	1.622.728	23.03.2022.	10.11.2021.	16.10.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	62.000,00
32		96	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog sustav Biočić - Tepljuh, promidžba i vidljivost	1.622.728	23.03.2022.	10.11.2021.	16.10.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	750,00
32		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	NPOO	Rekonstrukcija dijela tlačnog cjevovoda CS Miljacka - VS Radučka glava, radovi	2.477.079	23.03.2022.	25.10.2021.	21.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.457.579,11
32		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	NPOO	Rekonstrukcija dijela tlačnog cjevovoda CS Miljacka - VS Radučka glava, nadzor	2.477.079	23.03.2022.	25.10.2021.	21.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	19.500,00
32		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	NPOO	Podmorski vodoopskrbni cjevovod Srma - Prvić - VS Obonjan	23.157.750						-	u pripremi	

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	NPOO	Dovod Obonjan sa ogrankom za Kaprije	19.850.250						-	u pripremi	
		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	NPOO	Dovod Kaprije Žirje	17.645.250						-	u pripremi	
		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	NPOO	Vodovodna mreža naselja Lepenica	3.234.000						-	u pripremi	
		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	NPOO	Vodoopskrbni sustav zagorskog dijela općine Marina, Mitlo, Blizna donja i Blizna Gornja	15.440.250						-	u pripremi	
		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Vodice faza 2		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Šibenik		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Betina - Murter		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	RPHV	Izgradnja cjevovoda u Vodicama u sklopu rekonstrukcije državne ceste	720.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	0,00
		98	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Dvornice	6.982.114	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	980.299,11
	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	104	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	3	NPOO	Vodoopskrbni podsustav naselja Mitlo, Blizna donja i Blizna gornja i Vodoopskrbna mreža naselja Mitlo, Blizna donja i Blizna gornja, radovi	5.781.826	23.03.2022.	25.10.2021.	21.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	3.918.933,59
	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	104	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	3	NPOO	Vodoopskrbni podsustav naselja Mitlo, Blizna donja i Blizna gornja i Vodoopskrbna mreža naselja Mitlo, Blizna donja i Blizna gornja, nadzor	5.781.826	23.03.2022.	25.10.2021.	21.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	71.748,56
		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodosprema Rudine II s pripadajućim cjevovodom, radovi	6.400.735	03.02.2022.	09.11.2021.	06.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	6.200.393,32
		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodosprema Rudine II s pripadajućim cjevovodom, nadzor	6.400.735	03.02.2022.	09.11.2021.	06.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	185.575,60
		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodosprema Rudine II s pripadajućim cjevovodom, promidžba i vidljivost	6.400.735	03.02.2022.	09.11.2021.	06.06.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.610,00

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. izvješće	Status provedbe 2. izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodoopskrbni cjevovod do ŽCGO, dionica Taraši - Barani, radovi	5.890.708	03.02.2022.	09.11.2021.	06.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	5.530.285,64
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodoopskrbni cjevovod do ŽCGO, dionica Taraši - Barani, nadzor	5.890.708	03.02.2022.	09.11.2021.	06.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	72.000,00
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodoopskrbni cjevovod do ŽCGO, dionica Taraši - Barani, promidžba i vidljivost	5.890.708	03.02.2022.	09.11.2021.	06.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.610,00
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodoopskrbna mreža u zagorskom dijelu općine Seget	15.364.257	03.02.2022.	09.11.2021.	13.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	12.467.530,86
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodoopskrbna mreža u zagorskom dijelu općine Seget	15.364.257	03.02.2022.	09.11.2021.	13.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	283.635,10
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodoopskrbna mreža u zagorskom dijelu općine Seget	2.610	03.02.2022.	09.11.2021.	13.04.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	2.610,00
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodoopskrbni cjevovodi i kanalizacijski kolektori u Dugopolju (dio koji se odnosi na vodoopskrbu procijenjen na 50 %)	3.047.006	03.02.2022.	09.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Vodoopskrbni i kanalizacijski sustav naselja Rupotina i Put stare Salone u Solinu (dio koji se odnosi na vodoopskrbu procijenjen na 50 %)	4.407.181	03.02.2022.	09.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	NPOO	Dio kanalizacijskog sustava na području Čiova (dio koji se odnosi na vodoopskrbu procijenjen na 50 %)	3.663.836	03.02.2022.	09.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	RPHV	Izgradnja sekundarne mreže naselja Prgomet na području općine Prgomet	4.380.268	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	2.524.689,32
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog podsustava naselja Vučevica	10.448.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	386.688,00
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog podsustava naselja Kurušće - Uble - Radošić	1.208.033	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	55.534,84
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Kaštela - Trogir		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
33		150	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Split - Solin		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
33		99	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	3	-								-	-	

Uslužno područje	JVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. izvješće	Status provedbe 2. izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
34		108	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Kamensko, zaseoci Krolo, Tabak, Matiči i Žaperi, nadzor	3.819.062	23.12.2021.	21.06.2022.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	169.500,00
34		108	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Kamensko, zaseoci Krolo, Tabak, Matiči i Žaperi, koordinator ZNR	3.819.062	23.12.2021.	21.06.2022.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	9.000,00
34		108	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Kamensko, zaseoci Krolo, Tabak, Matiči i Žaperi, promidžba i vidljivost	3.819.062	23.12.2021.	21.06.2022.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	1.830,00
34		108	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1	NPOO	Rekonstrukcija cjevovoda VS Ruda - VS Vratnice, radovi	9.539.250	22.12.2022.		21.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
34		108	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1	NPOO	Rekonstrukcija cjevovoda VS Ruda - VS Vratnice, nadzor	9.539.250	22.12.2022.		21.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
34		108	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1	NPOO	Rekonstrukcija cjevovoda VS Ruda - VS Vratnice, promidžba i vidljivost	9.539.250	22.12.2022.		21.06.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
34		108	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1	RPHV	Izvođenje radova na vodoopskrbnim objektima (ugradnja vodomjera Tomislavgrad)	4.618.350	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	3.153.190,11
34		108	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Sinj		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju	u izvođenju	
34		108	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Trilj - Otok - Dicmo		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju	u izvođenju	
34		97	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrljika	3	-								-	-	
34		106	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo	3	-								-	-	
35		124	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	2	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnih građevina na području srednjeg toka Cetine	24.440.959	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	20.566.560,74
36		126	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Pučišća prema rotoru, radovi	838.454,28	03.02.2022.	10.11.2021.	18.07.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	838.454,28
36		126	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Pučišća prema rotoru, nadzor	40.000	03.02.2022.	10.11.2021.	18.07.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	40.000,00
36		126	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Pučišća prema rotoru, promidžba i vidljivost	56.548	03.02.2022.	10.11.2021.	18.07.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	1.957,31

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
		126	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbe u uvali Makarac	2.769.867	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	253.603,49
		121	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	2	NPOO	Izgradnja cjevovoda Jelsa - Sućuraj, poddionica Jelsa - Poljica, radovi	22.132.615	03.02.2022.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	21.012.897,56
		121	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	2	NPOO	Izgradnja cjevovoda Jelsa-Sućuraj, poddionica Jelsa - Poljica, nadzor	252.800	03.02.2022.	10.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	252.799,71
		121	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	2	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Jelsa - Vrbovska - Stari Grad		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju	u izvođenju	
		117	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	3	-								-	-	
		102	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	1	NPOO	Element 1 - Izvođenje radova na izgradnji CS Kotišina 2, VS Kotišina 2, HS Kotišina, dovodnog, tlačnog i opskrbnog cjevovoda		16.12.2021.	26.02.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	7.291.844,57
		102	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	1	NPOO	Element 1 - Stručni nadzor nad radovima izgradnje CS Kotišina 2, VS Kotišina 2, HS Kotišina, dovodnog, tlačnog i opskrbnog cjevovoda	10.060.501	16.12.2021.	09.03.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	125.000,00
		102	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	1	NPOO	Element 1 - promidžba i vidljivost nad radovima izgradnje CS Kotišina 2, VS Kotišina 2, HS Kotišina, dovodnog, tlačnog i opskrbnog cjevovoda		16.12.2021.	29.03.2022.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	2.420,00
		102	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbe Tučepskih zaselaka-etapa II - radovi		22.12.2022.		24.05.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
		102	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbe Tučepskih zaselaka-etapa II - nadzor	4.929.750	22.12.2022.		24.05.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
		102	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	1	NPOO	Izgradnja vodoopskrbe Tučepskih zaselaka-etapa II - promidžba i vidljivost		22.12.2022.		24.05.2022.	ima	ima	-	u pripremi	
		102	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	1	NPOO	Izgradnja tlačnog cjevovoda i hidrostanice vodospreme Zaostrog - radovi							-	u pripremi	
		102	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	1	NPOO	Izgradnja tlačnog cjevovoda i hidrostanice vodospreme Zaostrog - nadzor	4.404.750						-	u pripremi	
		102	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	1	NPOO	Izgradnja tlačnog cjevovoda i hidrostanice vodospreme Zaostrog - promidžba i vidljivost							-	u pripremi	



Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili POU-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili POU-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
37		102	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Tučepskih zaselaka	8.899.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	0,00
37		102	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	1	RPHV	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Gornji Zaostrog	2.670.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	0,00
37		122	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	1	RPHV	Dovršetak izgradnje mreže Grabovac - Centar	528.187	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	489.802,38
37		122	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	1	RPHV	Dovršetak izgradnje mreže Grabovac - Goričaj	565.845	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	453.512,57
37		122	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	1	RPHV	Izgradnja mjesne vodovodne mreže na području Općine Zagvozd	1.252.896	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	1.250.000,00
37		122	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Imotski		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju	u izvođenju	
37		147	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	3	-								-	-	
38		92	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Ploče		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
38		92	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	1	RPHV	Vodoopskrba naselja Vodice općina Gradac	5.150.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	0,00
38		94	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković	1	NPOO	Izgradnja vodospreme Vid s dovodnim i odvodnim cjevovodom, radovi	4.873.803	16.12.2021.	12.10.2021.	23.02.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	1.568.926,57
38		94	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković	1	NPOO	Izgradnja vodospreme Vid s dovodnim i odvodnim cjevovodom, nadzor		16.12.2021.	12.10.2021.	23.02.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	90.750,00
38		94	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković	1	NPOO	Izgradnje vodoopskrbne mreže u Dubrovačkoj ulici, radovi	3.192.000	13.12.2022.		23.02.2022.	ima	ima	-	u izvođenju	
38		94	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković	1	NPOO	Izgradnje vodoopskrbne mreže u Dubrovačkoj ulici, nadzor		13.12.2022.		23.02.2022.	ima	ima	-	u izvođenju	
38		94	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Metković		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija)	
38		109	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen	2	NPOO	Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Opuzen - dio uz kanal Mala Neretva (dio koji se odnosi na vodoopskrbu procijenjen na 50 %)	11.163.839	02.03.2022.	27.10.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju (aglomeracija) - retroaktivno	u izvođenju (aglomeracija) - retroaktivno	
38		114	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2	NPOO	Izgradnja cjevovoda Borovci	22.889.768	23.03.2022.	11.11.2021.	29.08.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	12.908.427,73

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
38		114	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2	NPOO	Izgradnja cjevovoda Borovci		23.03.2022.	11.11.2021.	29.08.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	196.000,00
38		114	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2	NPOO	Izgradnja cjevovoda Borovci	1.250	23.03.2022.	11.11.2021.	29.08.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	1.250,00
38		128	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	2	RPHV	Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih objekata na području sustava Vrgorac (VS Butina)	4.874.913	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	5.073.614,28
38		120	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište	3	-								-	-	
39		100	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato	1	-								-	-	
39		113	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2	NPOO	Izgradnja CS Trstenik, radovi	8.235.558	23.03.2022.	11.11.2021.	29.08.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	3.658.998,45
39		113	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2	NPOO	Izgradnja CS Trstenik, nadzor		23.03.2022.	11.11.2021.	29.08.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	69.500,04
39		113	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2	NPOO	Izgradnja CS Trstenik, promidžba i vidljivost	1.250	23.03.2022.	11.11.2021.	29.08.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	1.250,00
39		113	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2	RPHV	Dovršetak sustava vodoopskrbe u naseljima Pomena i Polače	1.750.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	1.723.729,38
39		113	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2	RPHV	Izgradnja magistralnog cjevovoda središnjeg dijela poluotoka Pelješca od Žuljane do Dančanja	19.072.460	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	u izvođenju	u izvođenju	13.362.246,93
39		119	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Zamaslina, Marinica i naselja Broce	18.350.907	23.12.2021.	09.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	9.352.441,69
39		119	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	2	NPOO	Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Zamaslina, Marinica i naselja Broce		23.12.2021.	09.11.2021.	u tijeku	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	136.280,56
39		127	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	2	-								-	-	
39		130	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	2	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže Podgorje, radovi	12.872.540	23.03.2022.	27.09.2021.	27.09.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	9.994.361,28
39		130	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	2	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže Podgorje, nadzor		23.03.2022.	27.09.2021.	27.09.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	198.000,00

Uslužno područje	JIVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili POU-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili POU-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. izvješće	Status provedbe 2. izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
39		130	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	2	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže Podgorje, vođenje projekta		23.03.2022.	27.09.2021.	27.09.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	106.312,50
39		130	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	2	NPOO	Izgradnja vodovodne mreže Podgorje, promidžba i vidljivost	4.800	23.03.2022.	27.09.2021.	27.09.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	4.800,00
39		130	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	2	NPOO	Radovi na rekonstrukciji i uvezivanju crpne stanice Dingač u postojeći sustav daljinskog nadzora i upravljanja, radovi	8.741.696	23.03.2022.	27.09.2021.	27.09.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	8.559.696,37
39		130	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	2	NPOO	Radovi na rekonstrukciji i uvezivanju crpne stanice Dingač u postojeći sustav daljinskog nadzora i upravljanja, nadzor		23.03.2022.	27.09.2021.	27.09.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	završeno	182.000,00
39		115	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje	3	-								-	-	
40		118	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1	OPKK 2014-2020	Razvoj vodoopskrbe u projektu aglomeracije Dubrovnik		projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	projekt aglom.	u izvođenju	u izvođenju	
40		118	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1	RPHV	Rekonstrukcija cjevovoda u Stolačkoj ulici u Dubrovniku, L = 90 m	208.026	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	208.279,64
40		118	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1	RPHV	Rekonstrukcija cjevovoda u Bogišićevom parku u Dubrovniku	359.944	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	359.730,36
40		118	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1	RPHV	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Put za Petraču u Župi dubrovačkoj u dužini od 130 m	220.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	0,00
40		118	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1	RPHV	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Crijevičevoj ulici i Ulici Ivana Rabljanina u Dubrovniku	340.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	0,00
40		118	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1	RPHV	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Uz posat u Dubrovniku	248.714	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	169.253,98
40		118	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1	RPHV	Rekonstrukcija cjevovoda u Zavrelju u Župi Dubrovačkoj	240.000	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	0,00
40		118	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1	RPHV	Izvođenje građevinskih i elektro-strojarskih radova na vodoopskrbnim objektima sustava Gabela - Neum i uvezivanje u postojeći nadzorno upravljački sustav	27.386.305	Plan HV 2022	PNP*	PNP*	ima	ima	-	u izvođenju	5.000.000,00
41		93	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 41 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	2	NPOO	Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Molunat (procijenjeni dio koji se odnosi na vodoopskrbu 50%), radovi	7.937.833	23.12.2021.	19.10.2021.	25.05.2022.	ima	ima	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju - retroaktivno	

Uslužno područje	JVU (ukoliko postoji razlika u odnosu na Program 2021.)	ID projekta	Projekt (Program 2021)	Prioritetna grupa	Financijski paket	Komponenta / potkomponenta	Vrijednost bez PDV (kune)	Ugovor ili drugi dokument o dodjeli sredstava (datum) ili Plan upravljanja vodama	Dokumentacija za provođenje OPOU-a ili PUO-a	Rješenje / Mišljenje o okončanju postupka OPOU-a ili PUO-a	Dozvole	Tehnička dokumentacija	Status provedbe 1. Izvješće	Status provedbe 2. Izvješće	Fakturirano do 31.12.2022. (kune)
RH		nacionalni 1	Interventna mjera ugradnje klorinatora na vodozahvatima u zonama opskrbe lokalnih vodovoda	N/P	-		5.000.000						-	u najavi	
RH		nacionalni 2	Projekt ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe	N/P	u pripremi		100.000.000	N/P	N/P	N/P	N/P	u pripremi	u pripremi	u pripremi	
RH		nacionalni 3	Projekti potpore smanjenju gubitaka	N/P	RPHV		120.000.000	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	u provedbi	u provedbi	
PNP*		prema nacionalnom postupku													
**		procjena iz Programa 2021.													

Ukupna vrijednost svih navedenih aktivnosti iznosi oko 853 milijuna eura, što je povećanje od oko 21 % (ili oko 147 milijuna eura) u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (oko 706 milijuna eura). Od toga se oko 76 milijuna eura odnosi na projekte prve prioritetne skupine (povećanje od oko 20 %) i oko 67 milijuna eura se odnosi na projekte druge prioritetne skupine (povećanje za 74 %). 27 % (u odnosu na 32 % iz prethodnog izvješća) od ukupnog iznosa se ulaže u nacionalne i dodatne projekte, pri čemu se treba naglasiti da još uvijek nije započeto s pripremom i realizacijom projekta: Interventna mjera ugradnje klorinatora na vodozahvatima u zonama opskrbe lokalnih vodovoda.

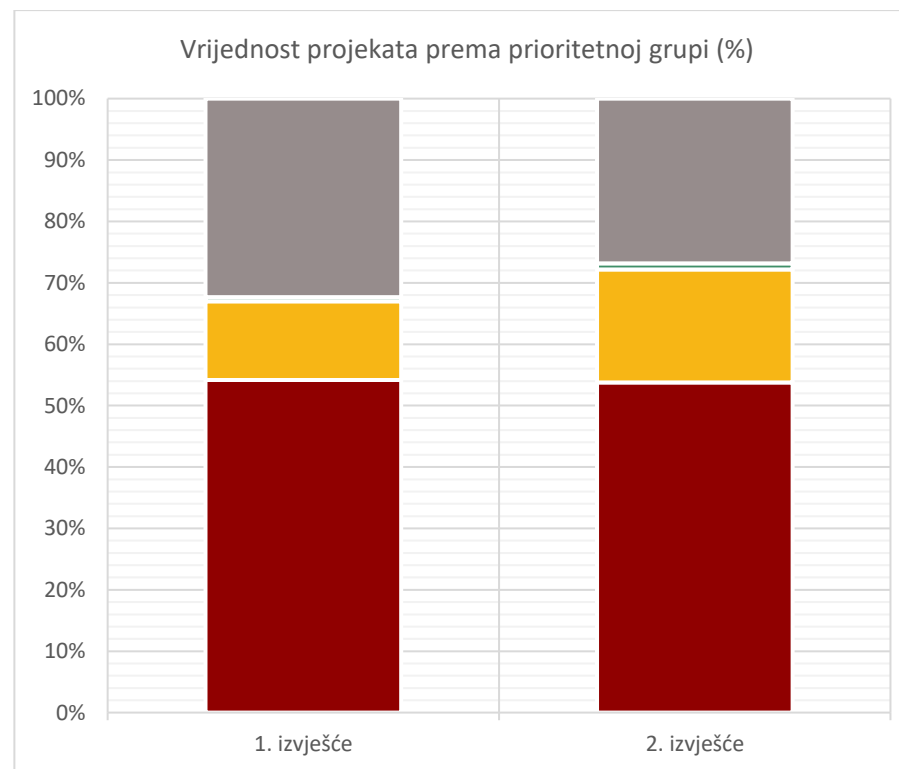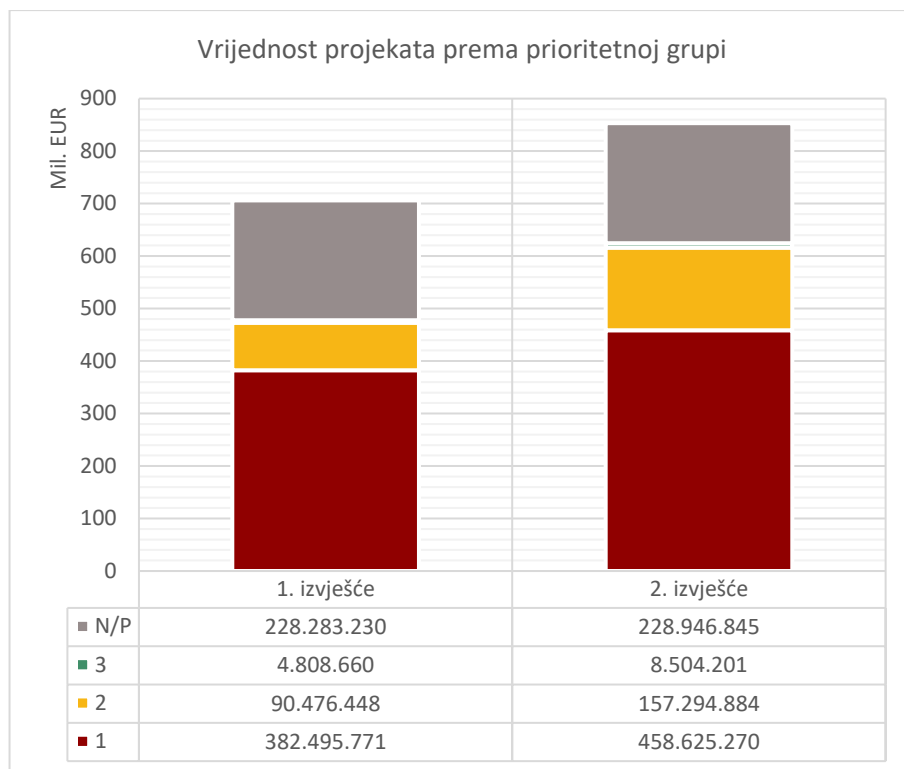


Od ukupno 670 zabilježenih komponenti / potkomponenti projekata u različitim fazama realizacije u prethodnom izvješću je bilo završeno njih samo 7. Broj završenih komponenti projekata do kraja 2022. godine je značajno porastao na 188. Ukupno je završeno 109 komponenti 17 projekata iz prve i 74 komponente 24 projekata iz druge prioritetne grupe projekata.

Značajno je porastao i broj komponenti / potkomponenti projekata koji su u pripremi na 138, a uvedena je i nova kategorija statusa provedbe, te tako 11 komponenti / podkomponenti projekata ima status „u najavi“.

		Stanje provedbe komponenti / potkomponenti projekata vodoopskrbe nakon 2. izvještajnog razdoblja (broj komponenti / potkomponenti)								Ukupno 1. Izvješće
		u najavi	u pripremi	u izvođenju	u izvođenju - retroaktivno	u izvođenju (aglomeracija)	u izvođenju (aglomeracija) - retroaktivno	u provedbi	završeno	
Stanje provedbe komponenti/podkomponenti projekata vodoopskrbe nakon 1. izvještajnog razdoblja (broj komponenti/podkomponenti)	nije započela priprema (aglomeracija) ili ne provodi se	11	123	74	0	33	0	0	5	246
	u pripremi	0	14	5	0	1	0	0	0	20
	u izvođenju		1	72		6			19	98
	u izvođenju - retroaktivno		0	7	87	3			157	254
	u izvođenju (aglomeracija)		0			36				36
	u izvođenju (aglomeracija) - retroaktivno		0				4			4
	u provedbi		0					5		5
	završeno		0						7	7
Ukupno 2. Izvješće		11	138	158	87	79	4	5	188	670


Stanje provedbe komponenti projekta u realizaciji

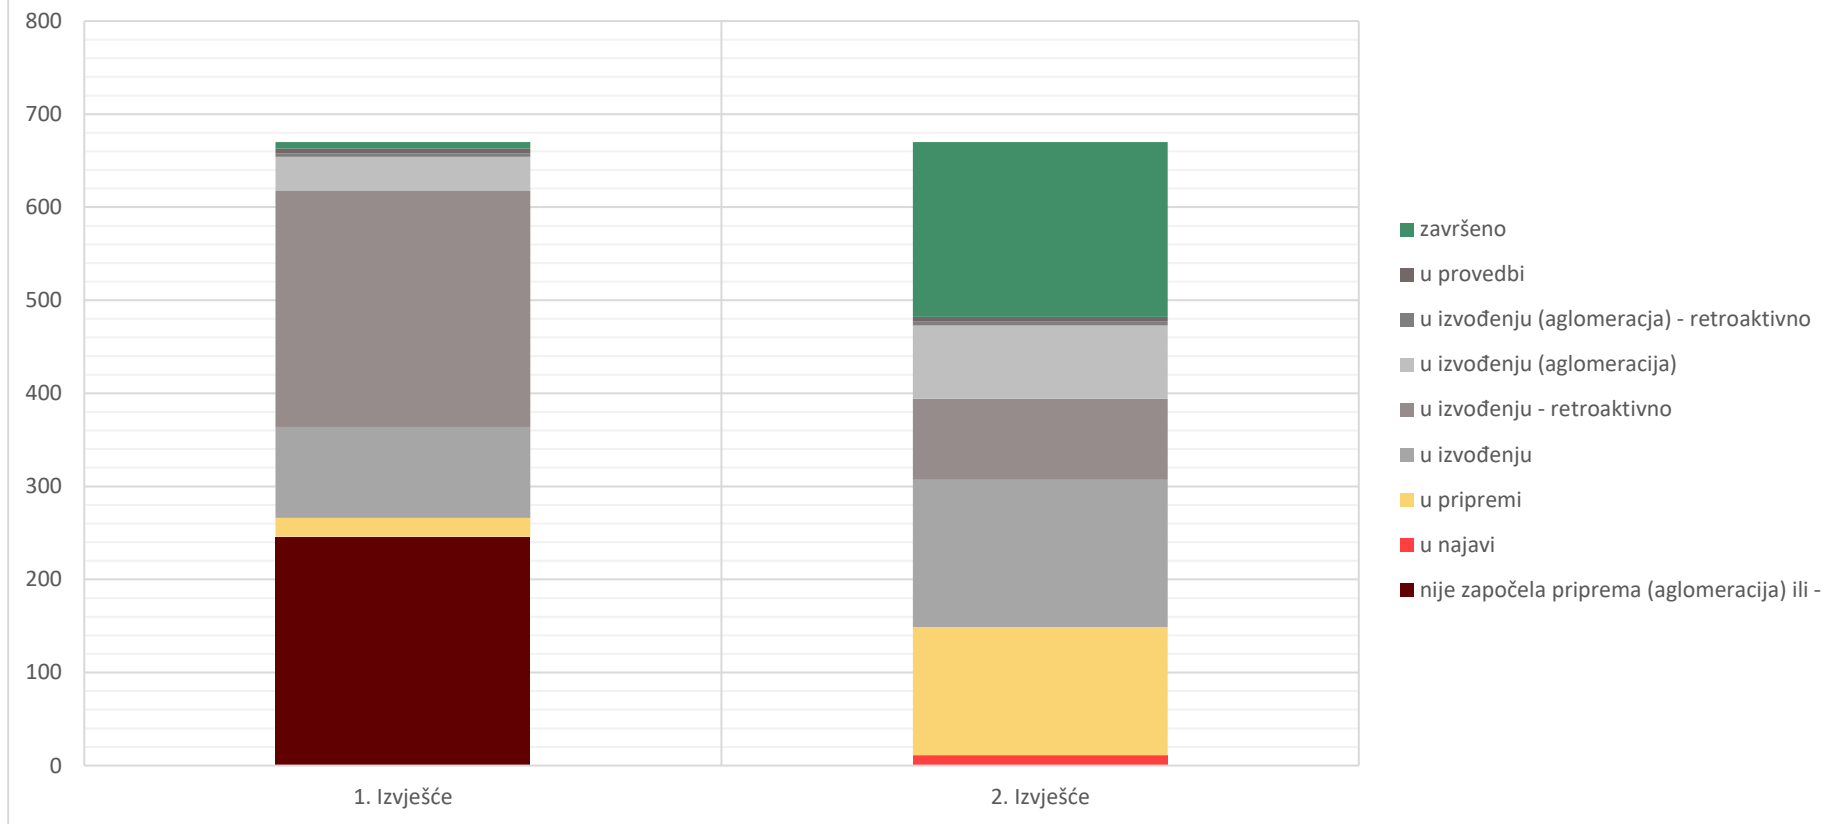

Trenutačno se projekti javne vodoopskrbe realiziraju na svim uslužnim područjima uz napomenu da se na uslužnom području 27 u projekte javne vodoopskrbe ulaže u okviru projekata aglomeracije.

Uslužno područje	1. Izvješće								2. Izvješće								
	FSEU	OPZO 2007-2013	OPKK 2014-2020	NPOO	RPHV	SD	u pripremi	Ukupno	-	FSEU	OPZO 2007-2013	OPKK 2014-2020	NPOO	RPHV	SD	u pripremi	Ukupno
	EUR																
1				757.634				757.634					757.634	0			757.634
2					1.782.365			1.782.365						1.782.365			1.782.365
3								(aglomer.)					8.544.968	1.885.869			10.430.838
4				871.881				871.881					871.881	4.266.639			5.138.520
5				915.731				915.731					915.731	132.717			1.048.449
6				422.505	60.906			483.411					422.505	327.666			750.171
7				484.134				484.134					4.474.678				4.474.678
8		1.639.261	10.172.936	2.511.385				14.323.582			1.639.261	9.907.490	12.414.929	173.578			24.135.258
9				71.530	1.681.964			1.753.494		961.796			71.530	1.681.964			2.715.290
10	1.155.388			260.832				1.416.220		1.155.388			3.805.329				4.960.717
11				6.982.090				6.982.090		113.109			6.982.090				7.095.199
12					492.064			492.064		1.231.632				630.008			1.861.639
13			93.849.394					93.849.394				93.849.394		873.262			94.722.656
14	21.198			2.657.077				2.678.275		21.198			2.657.077	5.633.823			8.312.099
15	24.660.295			5.911.694				30.571.988		35.445.284			7.964.244	4.842.311			48.251.839
16	9.432.093							9.432.093		9.432.093				1.214.266			10.646.359
17				1.609.913				1.609.913		414.029			2.331.292	41.036			2.786.358
18								(aglomer.)						611.087			611.087
19				301.462				301.462					301.462	1.576.907			1.878.368
20				204.872				204.872					5.234.253				5.234.253
21				3.237.784				3.237.784					3.237.784	14.203.995			17.441.779
22				310.612				310.612					567.313				567.313
23				773.260	289.899			1.063.159					773.260	1.740.355			2.513.616
24				6.061.226				6.061.226					6.061.226	1.150.057			7.211.283
25				2.030.888	1.385.874	15.045.605		18.462.367					2.030.888	6.032.582	16.026.123		24.089.592
26								(aglomer.)						5.772.365			5.772.365
27								(aglomer.)									(aglomer.)
28				1.043.670	1.281.893		199.084.213	201.409.775					2.000.336	1.443.151		199.084.213	202.527.700
29				2.455.241	857.372			3.312.613					5.685.953	4.247.609			9.933.562
30				4.140.341			232.576.727	236.717.068					9.725.970	5.954.727		232.576.727	248.257.424
31				4.294.676				4.294.676					12.080.505				12.080.505

Uslužno područje	1. Izvješće								2. Izvješće								
	FSEU	OPZO 2007-2013	OPKK 2014-2020	NPOO	RPHV	SD	u pripremi	Ukupno	-	FSEU	OPZO 2007-2013	OPKK 2014-2020	NPOO	RPHV	SD	u pripremi	Ukupno
	EUR																
32				1.311.518	883.206			2.194.724					11.840.087	1.905.452			13.745.539
33				5.146.504	581.361			5.727.865					5.146.504	2.128.383			7.274.887
34				506.877	612.960			1.119.837					1.772.953	612.960			2.385.913
35					3.243.873			3.243.873						3.243.873			3.243.873
36				3.095.151	367.625			3.462.776					3.095.151	367.625			3.462.776
37				1.335.258	145.203			1.480.461					2.574.159	1.846.961			4.421.120
38				5.166.721	647.012			5.813.733					5.590.372	1.330.535			6.920.907
39				6.398.135	2.763.615			9.161.751					6.398.135	2.763.615			9.161.751
40								(aglomer.)						3.849.358			3.849.358
41				880.188				880.188					1.053.531				1.053.531
RH					15.926.737		13.272.281	29.199.018	663.614					15.926.737		13.272.281	29.862.632
Σ	35.268.973	1.639.261	104.022.330	72.150.790	33.003.929	15.045.605	444.933.221	706.064.109	663.614	48.774.529	1.639.261	103.756.885	137.383.731	100.193.837	16.026.123	444.933.221	853.371.200
	Uslužna područja na kojim su povećana ulaganja u razvoj vodoopskrbe u izvještajnom razdoblju																
	Uslužna područja na kojim nisu povećana ulaganja u razvoj vodoopskrbe u izvještajnom razdoblju																
	(aglomer.) Uslužna područja na kojima se ulaže u razvoj vodoopskrbe kroz projekte aglomeracija																
	RH - projekti koji se provode na cjelokupnom području Republike Hrvatske																



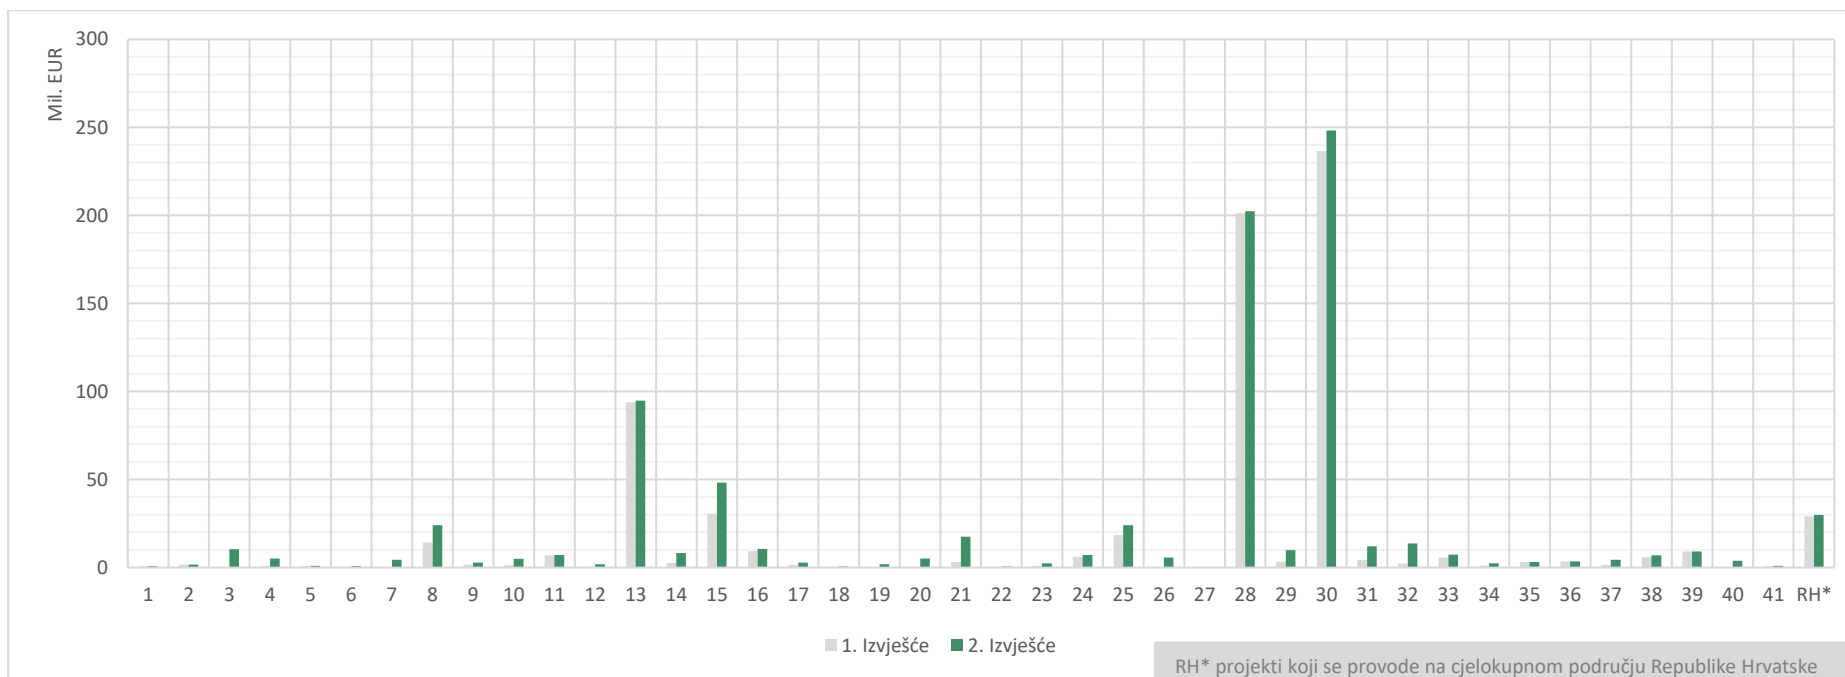


U izvještajnom razdoblju na 4 uslužna područja (15, 21, 30 i 32) ulaganja u vodoopskrbu su povećana za preko 10 milijuna eura. U relativnom odnosu na 14 uslužnih područja (osobito 20, 7, 32 i 23) ulaganja u vodoopskrbu su značajna porasla (dvostruko i više), dok se na 5 uslužnih područja (1, 2, 35, 36 i 39) u izvještajnom razdoblju nisu povećala ulaganja u vodoopskrbu.

U izvještajnom razdoblju se u određenoj mjeri promijenila i raspodjela ulaganja u projekte prema izvorima / mehanizmima financiranja. Prije svega, udio ulaganja u projekte u pripremi su značajno smanjena sa 63 % na 52 %; dok su ulaganja u projekte vodoopskrbe kroz:

- NPOO značajno porasla (s 10 % na 16 %) i
- Redoviti program Hrvatskih voda (s 5 % na 12 %)


značajno porasla.

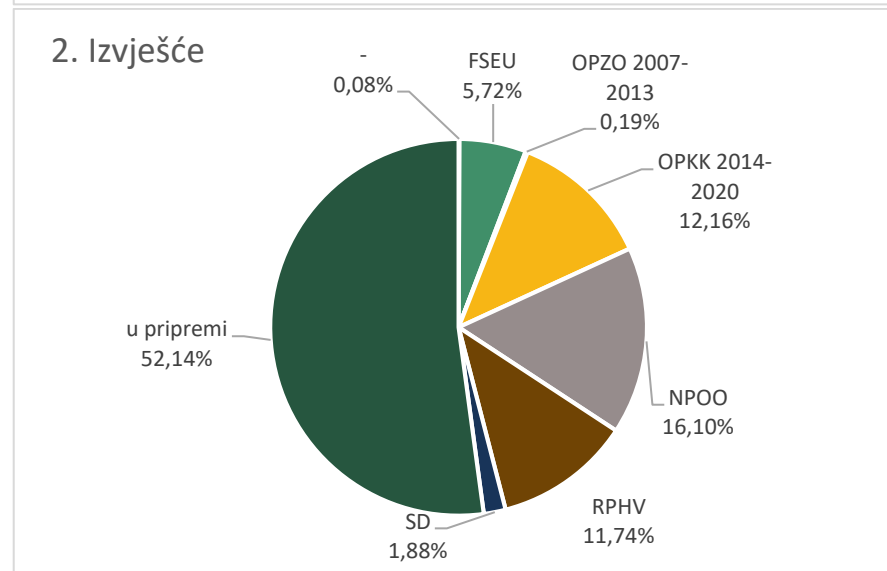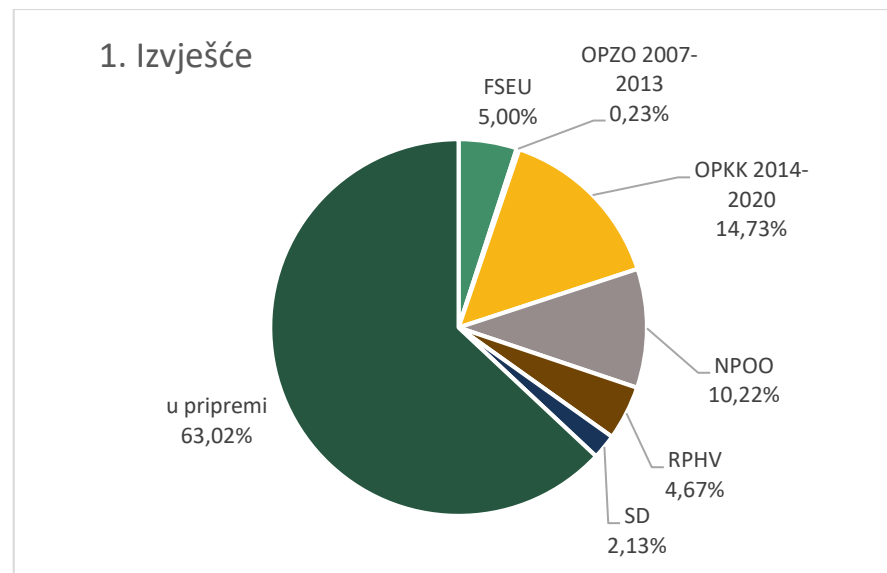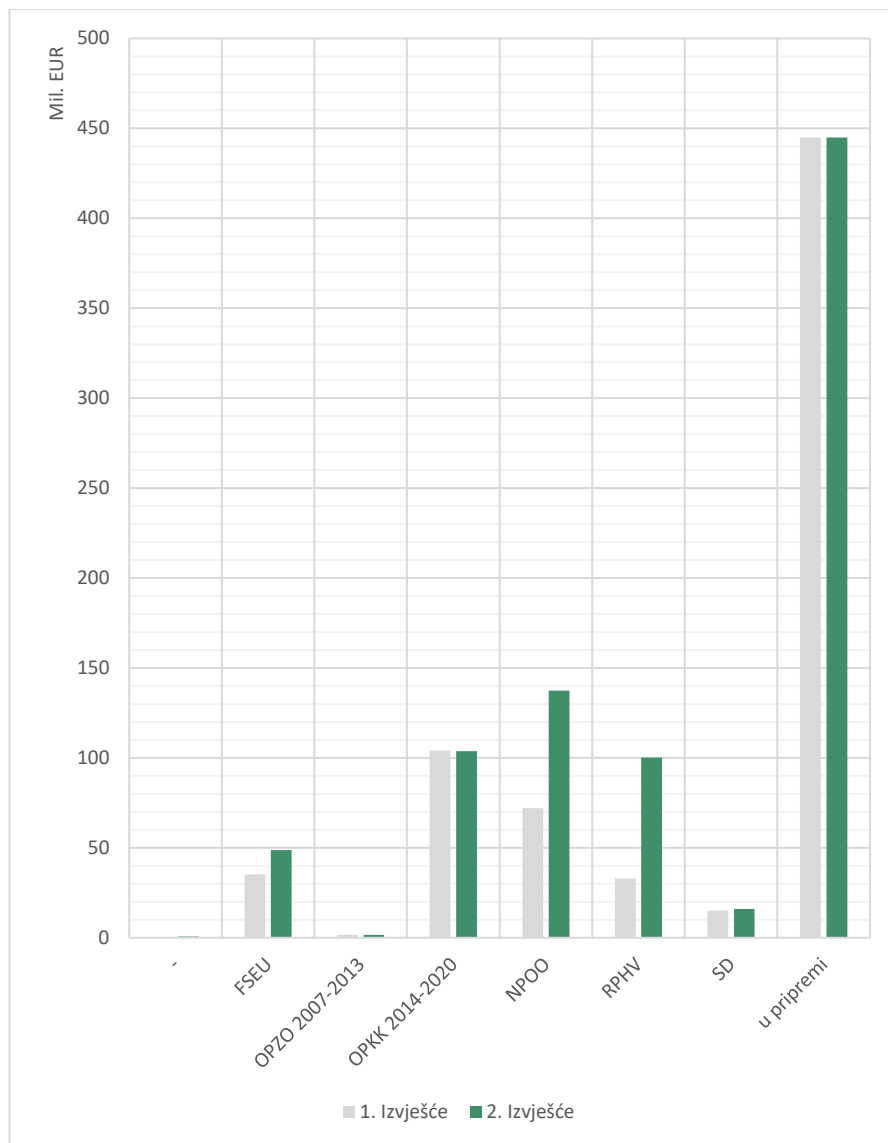


U načelu se primjećuje značajan napredak u pripremi i provedbi projekata 1. i 2. prioritetne skupine, a osobito na uslužnim područjima 4 i 14. Potrebno je naglasiti da je na uslužnom području:

- 4 (VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE D.O.O. Grubišno Polje 1 komponenta / potkomponenta (druga prioritetna skupina)
- 17 (VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina) 1 komponenta / potkomponenta (druga prioritetna skupina)
- 20 (VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod) identificirano 9 komponenti / potkomponenti projekta (prva prioritetna skupina)

čiji početak pripreme se očekuje u narednom izvještajnom razdoblju (u najavi).

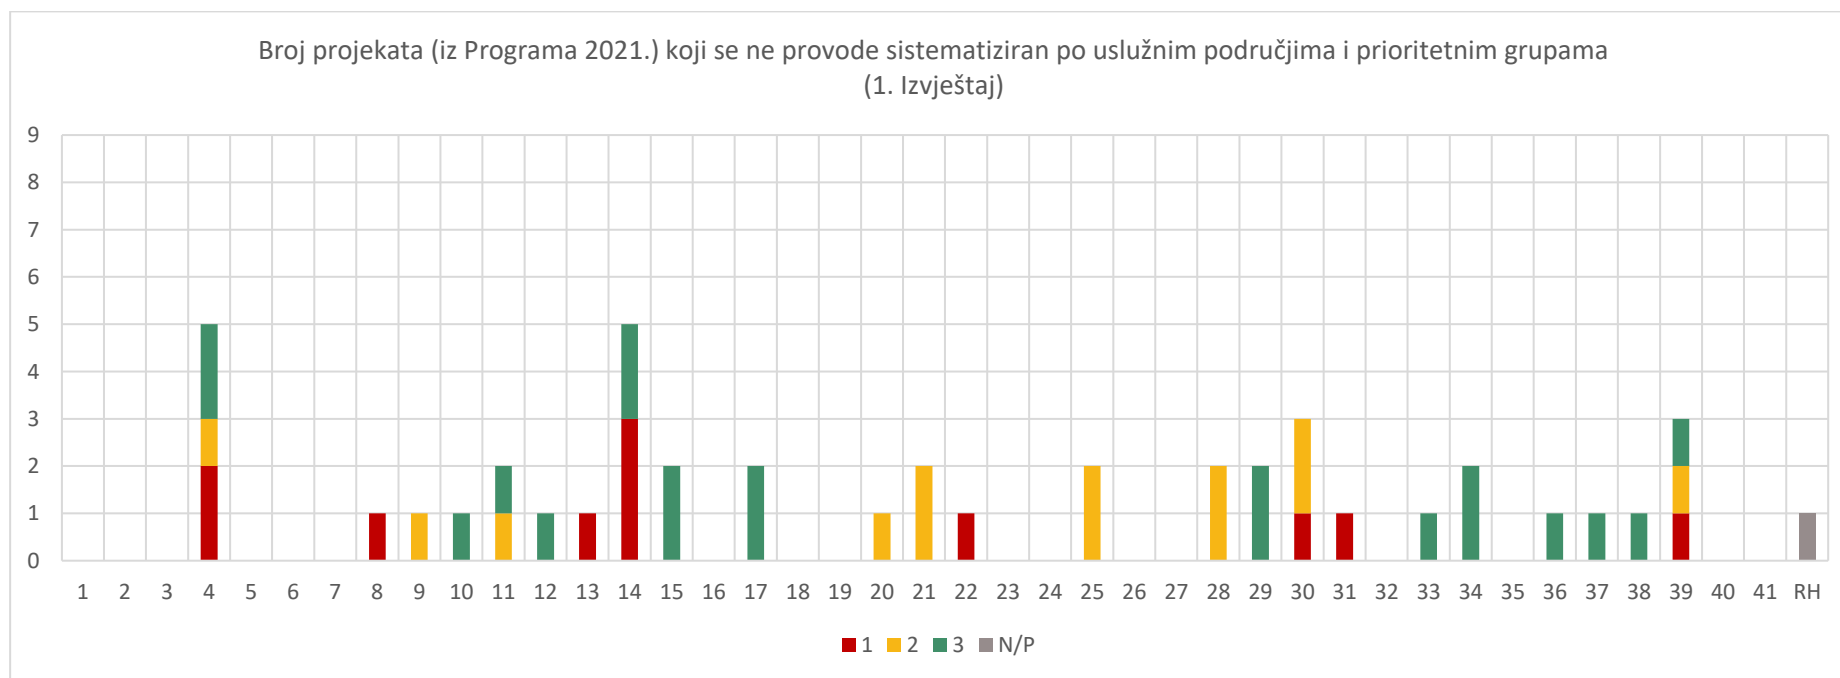

Broj projekata (iz Programa 2021.) koji se ne provode sistematiziran po uslužnim područjima i prioritarnim grupama
(2. Izvještaj)

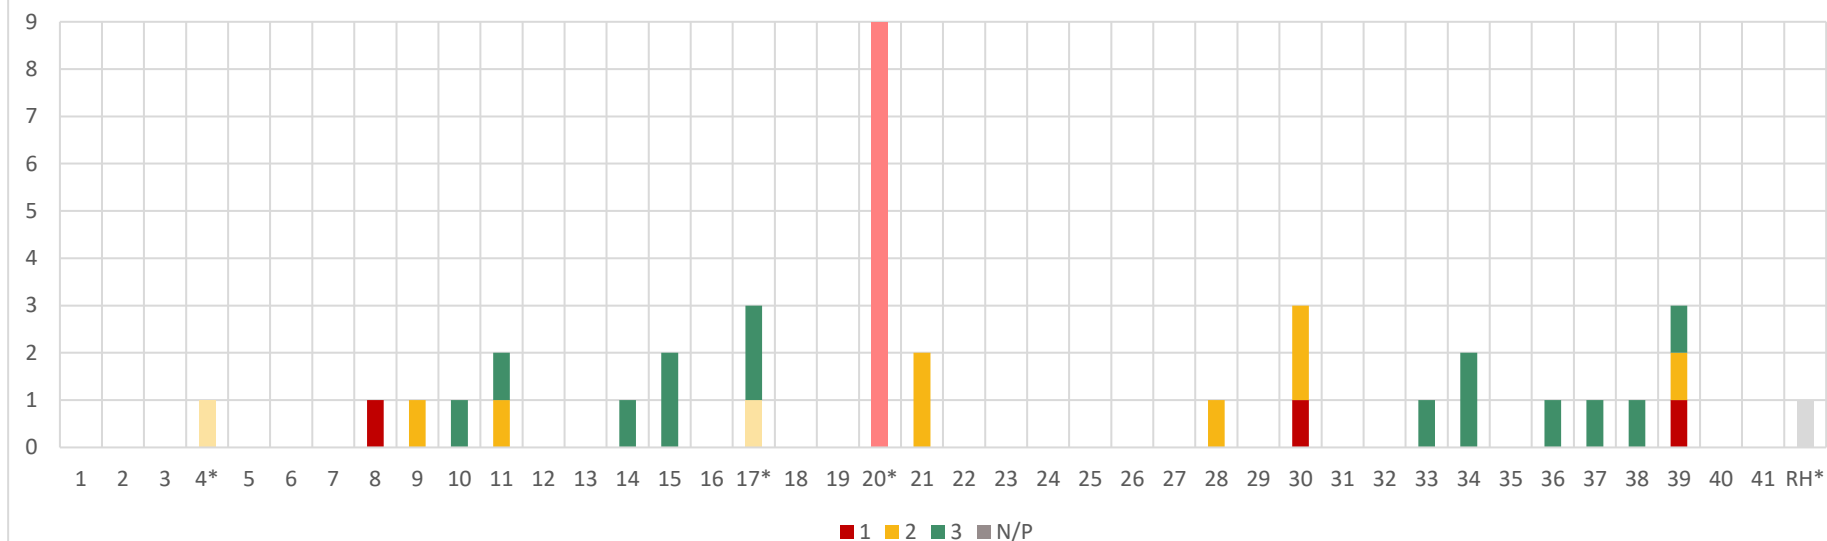

Rješavanje problema javne vodoopskrbe se zbog posljedica potresa s početka 2021. godine na području Banovine (uslužna područja 16 i 17) smatra prioritarnim bez obzira na rezultate provedene prioritizacije planiranih projekata razvoja javne vodoopskrbe. Riječ je o 7 projekata iz Programa 2021. koje provodi 6 javnih isporučitelja vodne usluge vodoopskrbe. Financiranje dijela aktivnosti na ovom području se provodi kroz Fond solidarnosti Europske unije.

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	Prioritetna grupa Projekta prema osnovnoj prioritizaciji planiranih projekata razvoja javne vodoopskrbe u Programu 2021.
16	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	1
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	2
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	2
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	3
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	3

Iz Fonda solidarnosti Europske unije je za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko - zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko - moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko - posavske županije i Bjelovarsko - bilogorske županije za operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama potpisano 29 ugovora ukupnog iznosa od 48.774.529 eura što je značajno povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (15 ugovora ukupnog iznosa od 35.268.973 eura (265.734.080 kuna). Svi ugovori su navedeni kao posebne komponente u tablici pregleda realizacije projekata javne vodoopskrbe.

Od ukupno programiranih ulaganja u vodoopskrbu od oko 3.389 milijuna eura (25.534 milijuna kuna), do sada se realiziraju projekti u vrijednosti od oko 25 % (853 milijuna eura, odnosno 6.485.599.228 kuna - iznosi bez PDV). Od ukupne vrijednosti projekata do sada je realizirano (fakturirano na osnovu ovjerenih situacija od strane nadzornih inženjera) oko 19 % (1.236,6 milijuna kuna, odnosno oko 164 milijuna eura) ili svega oko 5 % ukupno programom predviđene vrijednosti projekata.

Pregled realizacije projekata prema financijskim pokazateljima (ugovoreno - fakturirano - realizacija) po pojedinim projektima i uslužnim područjima je kako slijedi:

Uslužno područje / Projekt	Vrijednost projekta		Fakturirano do 31.12.2022.		Realizacija
	kune	euri	kune	euri	
1	5.708.393	757.634	5.142.643	682.546	90,09 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	5.708.393	757.634	5.142.643	682.546	90,09 %
2	13.429.227	1.782.365	12.665.491	1.681.000	94,31 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	1.789.976	237.571	1.884.866	250.165	105,30 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	11.639.251	1.544.794	10.780.625	1.430.835	92,62 %
3	78.591.146	10.430.838	7.341.409	974.372	9,34 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	25.400.698	3.371.252	1.000.000	132.723	3,94 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	53.190.448	7.059.586	6.341.409	841.650	11,92 %
4	38.716.178	5.138.520	24.770.796	3.287.650	63,98 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	9.764.553	1.295.979	6.106.369	810.454	62,54 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela	2.622.698	348.092	2.038.351	270.536	77,72 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	1.707.282	226.595	1.606.846	213.265	94,12 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	4.861.903	645.285	4.503.641	597.736	92,63 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	16.163.904	2.145.319	10.038.101	1.332.285	62,10 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	1.200.000	159.267		0	0,00 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac	2.395.839	317.982	477.489	63.374	19,93 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje					
5	7.899.537	1.048.449	6.203.122	823.296	78,53 %

Uslužno područje / Projekt	Vrijednost projekta		Fakturirano do 31.12.2022.		Realizacija
	kune	euri	kune	euri	
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina	2.962.773	393.228	2.282.384	302.924	77,04 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica	999.959	132.717	999.418	132.646	99,95 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica	3.936.805	522.504	2.921.320	387.726	74,21 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača					
6	5.652.166	750.171	4.649.085	617.040	82,25 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	2.009.905	266.760	1.209.813	160.570	60,19 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	3.183.365	422.505	3.026.776	401.722	95,08 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac	458.896	60.906	412.495	54.748	89,89 %
7	33.714.459	4.474.678	3.243.715	430.515	9,62 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	33.714.459	4.474.678	3.243.715	430.515	9,62 %
8	181.847.102	24.135.258	94.232.492	12.506.801	51,82 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo	250.000	33.181	186.318	24.729	74,53 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće	2.844.235	377.495	2.447.414	324.828	86,05 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDNOST d.o.o. Čepin	937.945	124.487	562.958	74.717	60,02 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda	806.591	107.053	785.282	104.225	97,36 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	90.009.332	11.946.291	12.803.350	1.699.297	14,22 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, RVS OSIJEK 1. faza projekta	12.351.012	1.639.261	15.105.138	2.004.796	122,30 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek, RVS OSIJEK 2. faza projekta	74.647.987	9.907.490	62.342.033	8.274.210	83,51 %
9	20.458.352	2.715.290	11.891.944	1.578.332	58,13 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	4.237.707	562.440	4.196.398	556.958	99,03 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada	2.853.874	378.774	2.853.622	378.741	99,99 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	13.366.772	1.774.076	4.841.924	642.634	36,22 %
10	37.376.521	4.960.717	1.977.812	262.501	5,29 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	37.376.521	4.960.717	1.977.812	262.501	5,29 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra					
11	53.458.777	7.095.199	45.113.419	5.987.580	84,39 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	852.219	113.109	0	0	0,00 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	52.606.558	6.982.090	45.113.419	5.987.580	85,76 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina					
12	14.026.522	1.861.639	3.811.781	505.910	27,18 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	12.987.188	1.723.696	3.436.781	456.139	26,46 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina	1.039.334	137.943	375.000	49.771	36,08 %


Uslužno područje / Projekt	Vrijednost projekta		Fakturirano do 31.12.2022.		Realizacija
	kune	euri	kune	euri	
13	713.687.852	94.722.656	479.776.033	63.677.222	67,22 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALNIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	4.879.590	647.633	1.152.242	152.929	23,61 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	708.808.262	94.075.023	478.623.791	63.524.294	67,53 %
14	62.627.506	8.312.099	35.480.458	4.709.066	56,65 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj	8.596.055	1.140.893	7.885.543	1.046.591	91,73 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	10.082.348	1.338.158	8.826.644	1.171.497	87,55 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj	1.746.198	231.760	0	0	0,00 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić	100.000	13.272	0	0	0,00 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	32.766.293	4.348.834	16.690.349	2.215.190	50,94 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	2.000.000	265.446	0	0	0,00 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	7.336.612	973.736	2.077.922	275.788	28,32 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja					
15	363.553.484	48.251.839	68.406.986	9.079.167	18,82 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	27.248.471	3.616.494	1.372.595	182.175	5,04 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	33.649.399	4.466.043	4.626.693	614.068	13,75 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	255.027.683	33.847.990	47.847.534	6.350.459	18,76 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	492.628	65.383	492.628	65.383	100,00 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	47.135.303	6.255.930	14.067.535	1.867.083	29,85 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja					
16	80.214.990	10.646.359	13.466.430	1.787.302	16,79 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	80.214.990	10.646.359	13.466.430	1.787.302	16,79 %
17	20.993.812	2.786.358	8.462.498	1.123.166	40,31 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	11.610.850	1.541.025	7.713.190	1.023.716	66,43 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	9.073.773	1.204.297	440.119	58.414	4,85 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	309.189	41.036	309.189	41.036	100,00 %
18	4.604.232	611.087	3.007.731	399.195	65,33 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKIJA d.o.o. Požega	1.335.913	177.306	1.270.904	168.678	95,13 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	3.268.319	433.780	1.736.827	230.517	53,14 %
19	14.152.566	1.878.368	7.753.021	1.029.003	54,78 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	14.152.566	1.878.368	7.753.021	1.029.003	54,78 %
20	39.437.482	5.234.253	499.703	66.322	1,27 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo					

Uslužno područje / Projekt	Vrijednost projekta		Fakturirano do 31.12.2022.		Realizacija
	kune	euri	kune	euri	
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	39.437.482	5.234.253	499.703	66.322	1,27 %
21	131.415.085	17.441.779	9.729.328	1.291.304	7,40 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	131.415.085	17.441.779	9.729.328	1.291.304	7,40 %
22	4.274.417	567.313	2.448.266	324.941	57,28 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	1.934.114	256.701	223.955	29.724	11,58 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	2.340.303	310.612	2.224.310	295.217	95,04 %
23	18.938.838	2.513.616	7.472.007	991.706	39,45 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	18.938.838	2.513.616	7.472.007	991.706	39,45 %
24	54.333.411	7.211.283	22.245.087	2.952.430	40,94 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Pula	44.260.948	5.874.437	18.423.759	2.445.253	41,63 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	10.072.463	1.336.846	3.821.329	507.177	37,94 %
25	181.503.033	24.089.592	133.257.979	17.686.373	73,42 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	45.711.772	6.066.995	12.992.455	1.724.395	28,42 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	130.271.408	17.289.987	118.869.476	15.776.691	91,25 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o. Čabar	375.000	49.771	58.670	7.787	15,65 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	2.184.245	289.899	617.262	81.925	28,26 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko	2.960.608	392.940	720.115	95.576	24,32 %
26	43.491.883	5.772.365	2.499.212	331.702	5,75 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	8.891.883	1.180.156	2.399.212	318.430	26,98 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	34.600.000	4.592.209	100.000	13.272	0,29 %
27					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski					
28	1.525.944.956	202.527.700	6.773.004	898.932	0,44 %
Razvoj alternativnog sustava opskrbe regionalnog vodovoda za UP 28 (VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. Senj)	1.500.000.000	199.084.213		0	0,00 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU CRNO VRILLO d.o.o. Karlobag	475.000	63.043	664.801	88.234	139,96 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	1.467.811	194.812	1.376.569	182.702	93,78 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	9.059.923	1.202.458	1.422.660	188.819	15,70 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	13.603.723	1.805.524	2.382.973	316.275	17,52 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o. Senj	1.338.500	177.649	926.000	122.901	69,18 %
29	74.844.422	9.933.562	17.785.461	2.360.536	23,76 %

Uslužno područje / Projekt	Vrijednost projekta		Fakturirano do 31.12.2022.		Realizacija
	kune	euri	kune	euri	
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac	13.013.257	1.727.156	3.137.166	416.374	24,11 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	3.029.442	402.076	483.573	64.181	15,96 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina	5.320.287	706.123	2.120.441	281.431	39,86 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica	7.250.000	962.240		0	0,00 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	29.656.601	3.936.107	2.431.798	322.755	8,20 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VIŠOČICA d.o.o. Donji Lapac	206.000	27.341	98.782	13.111	47,95 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje	8.700.818	1.154.797	2.809.087	372.830	32,29 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	7.668.018	1.017.721	6.704.613	889.855	87,44 %
30	1.870.495.558	248.257.424	14.139.190	1.876.593	0,76 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	22.686.108	3.010.964		0	0,00 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	1.847.809.450	245.246.460	14.139.190	1.876.593	0,77 %
31	91.020.564	12.080.505	13.762.108	1.826.546	15,12 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	39.987.247	5.307.220		0	0,00 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	51.033.317	6.773.285	13.762.108	1.826.546	26,97 %
32	103.565.763	13.745.539	10.839.329	1.438.626	10,47 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	6.654.515	883.206	1.850.063	245.546	27,80 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš	1.622.728	215.373	1.541.206	204.553	94,98 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	5.781.826	767.380	3.990.682	529.655	69,02 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	89.506.693	11.879.580	3.457.378	458.873	3,86 %
33	54.812.633	7.274.887	27.714.163	3.678.302	50,56 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	54.812.633	7.274.887	27.714.163	3.678.302	50,56 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik					
34	17.976.662	2.385.913	3.333.520	442.434	18,54 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrlika					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	17.976.662	2.385.913	3.333.520	442.434	18,54 %
35	24.440.959	3.243.873	20.566.561	2.729.652	84,15 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	24.440.959	3.243.873	20.566.561	2.729.652	84,15 %
36	26.090.284	3.462.776	22.399.712	2.972.953	85,85 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	22.385.414	2.971.055	21.265.697	2.822.443	95,00 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	3.704.870	491.721	1.134.015	150.510	30,61 %

Uslužno područje / Projekt	Vrijednost projekta		Fakturirano do 31.12.2022.		Realizacija
	kune	euri	kune	euri	
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža					
37	33.310.928	4.421.120	9.612.580	1.275.809	28,86 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	30.964.001	4.109.629	7.419.265	984.706	23,96 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	2.346.927	311.491	2.193.315	291.103	93,45 %
38	52.145.573	6.920.907	19.838.969	2.633.084	38,05 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	5.150.000	683.522	0	0	0,00 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	4.874.913	647.012	5.073.614	673.384	104,08 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković	8.065.803	1.070.516	1.659.677	220.277	20,58 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPCLM VODOVOD d.o.o. Korčula	22.891.018	3.038.160	13.105.678	1.739.422	57,25 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen	11.163.839	1.481.696		0	0,00 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište					
39	69.029.212	9.161.751	47.349.617	6.284.374	68,59 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPCLM VODOVOD d.o.o. Korčula	29.059.268	3.856.828	18.815.725	2.497.276	64,75 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato					
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	18.350.907	2.435.584	9.488.722	1.259.370	51,71 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	21.619.037	2.869.339	19.045.170	2.527.728	88,09 %
40	29.002.989	3.849.358	5.737.264	761.466	19,78 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	29.002.989	3.849.358	5.737.264	761.466	19,78 %
41	7.937.833	1.053.531		0	0,00 %
Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 41 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	7.937.833	1.053.531		0	0,00 %
RH	225.000.000	29.862.632		0	0,00 %
Interventna mjera ugradnje klorinatora na vodozahvatima u zonama opskrbe lokalnih vodovoda	5.000.000	663.614		0	0,00 %
Projekt ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe	100.000.000	13.272.281		0	0,00 %
Projekti potpore smanjenju gubitaka	120.000.000	15.926.737		0	0,00 %
Ukupno	6.429.725.310	853.371.200	1.235.399.923	163.965.747	19,21 %

Promatrajući po financijskim paketima osim Operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007-2013 (OOZO 2007-2013) gdje je realizacija premašila vrijednost komponenti projekata koje su se financirale kroz ovaj program, visoki stupanj dovršenosti bilježe i komponente projekata koje se financiraju sredstvima Švicarske darovnice.

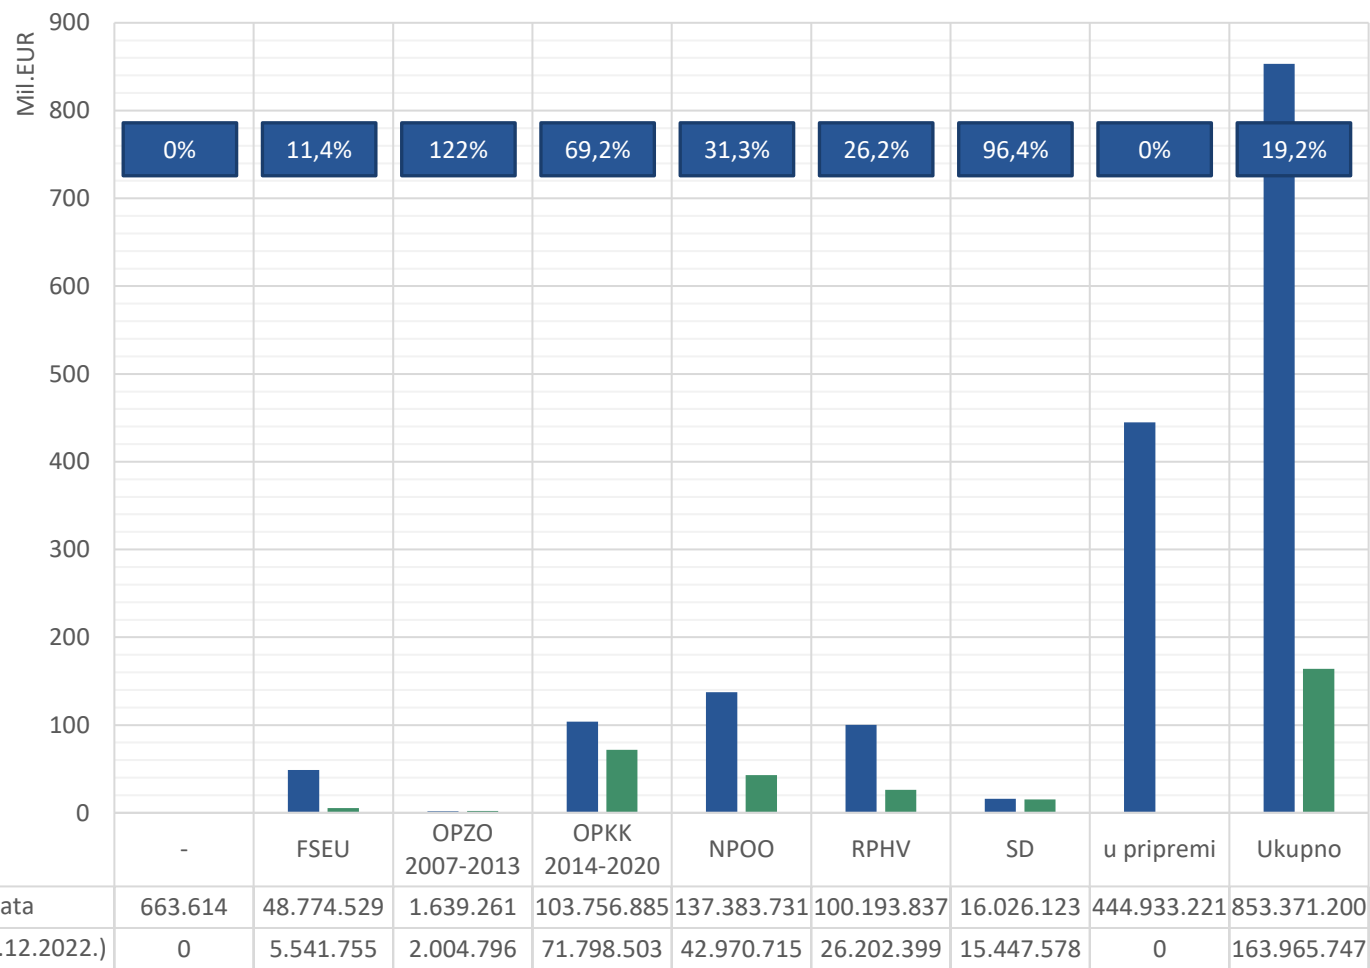

■ Vrijednost komponenti projekata ■ Realizirano (fakturirano do 31.12.2022.)

2.1.2 Pregled projekata odvodnje

Pregled realizacije projekata javne odvodnje obuhvaća informacije o realizaciji projekata / komponenti / potkomponenti u okviru sljedećih financijskih paketa

Financijski paket	Skraćenica	Razdoblje Financijskog paketa	Napomena
Razvojni programi javnih isporučitelja	RPJI	-	podaci nisu dostupni, nema obveze izvješćivanja (očekuje se u okviru 2. izvješća - godišnje izvješće)
Redoviti program Hrvatskih voda	RPHV	-	prikupljeni podaci o projektima čija je provedba započela u 2022. godini
Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007. - 2013.	OPZO 2007-2013	2007. - 2016.	korišteni podaci
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020.	OPKK 2014-2020	2014. - 2023.	korišteni podaci
Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026.	NPOO	2021. - 2026.	korišteni podaci
Fond solidarnosti Europske unije	FSEU	do svibnja 2023.	neke aktivnosti na sanaciji infrastrukture javne odvodnje uključeni u projekte vodoopskrbe
Višegodišnji financijski okvir 2021. - 2027.	VFO 2021-2027	2022. - 2029.	nema podataka (projekti u pripremi se mogu smatrati potencijalnim kandidatima za financiranje)
Švicarska darovnica	SD	do kraja 2023	korišteni podaci
Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. dodatno proširen na 2021. i 2022. godinu	RR	do kraja 2025.	korišteni podaci


Trenutačno je na području Republike Hrvatske u različitim fazama realizacije oko 1.200 potkomponenti projekata na 231 aglomeraciji iz Programa 2021. što je određeno povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i to:

- 58 (od 58) aglomeracija s rokom usklađenja do 31. prosinca 2018. godine
- 18 (od 21) aglomeracije s rokom usklađenja do 31. prosinca 2020. godine
- 64 (od 181) aglomeracija s rokom usklađenja do 31. prosinca 2023. godine i
- 91 mala aglomeracija (opterećenje manje od 2.000 ES)

U navedenom broju aglomeracija se nalazi i oko 90 aglomeracija za koje nije utvrđen rok usklađenja, ali se očekuje da će njihov rok usklađenja biti propisan u preinaci Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda koja je u pripremi.

Gotovo 90 % vrijednosti projekata se financira kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. i taj omjer financiranja je zadržan i tijekom 2. izvještajnog razdoblja. Pri tome, potrebno je napomenuti da se u različitim fazama pripreme nalaze i projekti odnosno njihove komponente u procijenjenom iznosu od 2.898 milijuna eura, te da je u najavi oko 659 milijuna eura vrijednosti projekata odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Kao novi izvor

financiranja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje pojavljuje se i Fond solidarnosti Europske Unije kojim se financiraju projekti u vrijednosti od oko 2,7 milijuna eura.

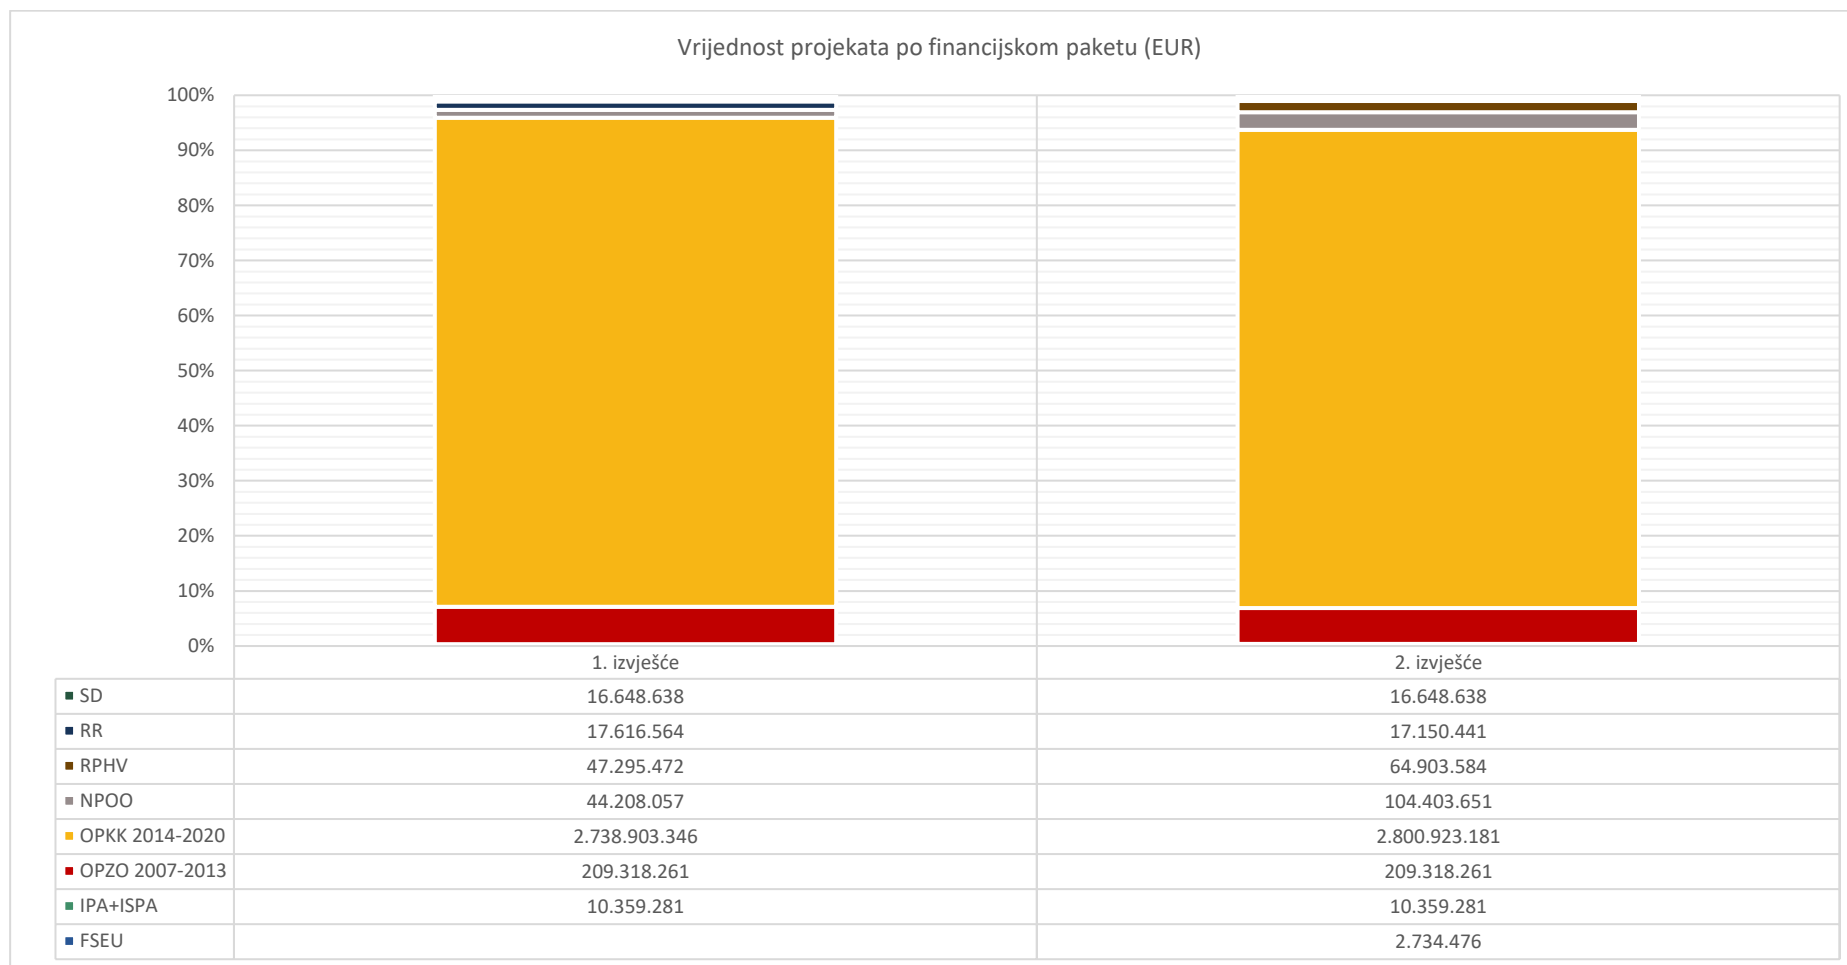



Potrebno je naglasiti da su u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, osigurana dodatna sredstva u iznosu od oko 78 milijuna eura koja se ulažu u realizaciju projekata 15 aglomeracija.

		Vrijednost projekta prema 1. Izvješću		Dodatna sredstva		Vrijednost projekta	
		kune	euri	kune	euri	kune	euri
Mursko Središće	31.12.2020.	181.777.310,00	24.125.995,09	60.590.432,81	8.041.732,41	242.367.742,81	32.167.727,49
Donja Dubrava	31.12.2018.	189.080.650,00	25.095.314,88	59.968.192,40	7.959.146,91	249.048.842,40	33.054.461,80
Varaždinske Toplice	31.12.2023.	49.684.723,00	6.594.295,97	6.761.444,76	897.397,94	56.446.167,76	7.491.693,91
Osijek	31.12.2018.	200.679.737,00	26.634.778,29	103.128.828,25	13.687.547,71	303.808.565,25	40.322.326,00
Belišće	31.12.2018.	271.578.968,00	36.044.723,34	47.352.233,10	6.284.721,36	318.931.201,10	42.329.444,70
Koška	31.12.2023.						
Petrijevci	31.12.2023.						
Petrinja	31.12.2018.	344.922.279,52	45.779.053,62	74.876.590,22	9.937.831,34	419.798.869,74	55.716.884,96
Novska	31.12.2020.	98.905.027,68	13.126.953,04	19.188.626,05	2.546.768,34	118.093.653,73	15.673.721,38
Vinkovci	31.12.2018.	384.560.952,11	51.040.009,57	60.350.411,90	8.009.876,16	444.911.364,01	59.049.885,73
Otok (Vinkovci)	31.12.2023.						
Ivankovo	31.12.2023.						
Cerna	31.12.2023.						
Rovinj	31.12.2018.	223.862.868,00	29.711.708,54	35.071.681,94	4.654.812,12	258.934.549,94	34.366.520,66
Nin	31.12.2020.	317.766.078,40	42.174.806,34	121.123.769,04	16.075.886,79	438.889.847,44	58.250.693,14
Ukupno		2.262.818.593,71	300.327.638,69	588.412.210,47	78.095.721,08	2.851.230.804,18	378.423.359,77

Iz Fonda solidarnosti Europske unije je za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko - zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko - moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko - posavske županije i Bjelovarsko - bilogorske županije za operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama financirano 7 aglomeracija sa ulaganjima od oko 2,7 milijuna eura (oko 20,6 milijuna kuna). Pri tome treba naglasiti da se za samo dvije aglomeracije (Jastrebarsko i Samobor) ulaganja odnose isključivo na sanaciju građevina javne odvodne, dok se na preostalih 5 (Glina, Hrvatska Kostajnica, Petrinja, Sisak i Zaprešć) u sanaciju sustava odvodnje ulaže kroz projekte sanacije vodoopskrbnih sustava (naznačeno u tablici).

Od ukupno programiranih ulaganja u odvodnju i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda od oko 3.602 milijuna eura (27.139 milijuna kuna), do sada su u različitim statusima realizacije (od najave projekta do završetka) projekti u vrijednosti od oko 188 % programiranih iznosa (6.784 milijuna eura, odnosno 51.112 milijuna kuna - iznosi bez PDV). Od ukupne vrijednosti projekata do sada je realizirano (fakturirano na osnovu ovjerenih situacija od strane nadzornih inženjera) oko 22 % (11.442 milijuna kuna, odnosno oko 1.519 milijuna eura) ili čak oko 42 % ukupno programom predviđene vrijednosti projekata. Nadalje ukoliko se promatraju samo oni projekti koji su završeni ili se nalaze u različitim fazama realizacije (uključivo i izvođenje - retroaktivno i završeni projekti) može se zaključiti da je realizirano oko 51 % ukupne vrijednosti takvih projekata (2.942 milijuna eura. odnosno gotovo 82 % Programom predviđene vrijednosti projekata infrastrukture javne odvodnje).

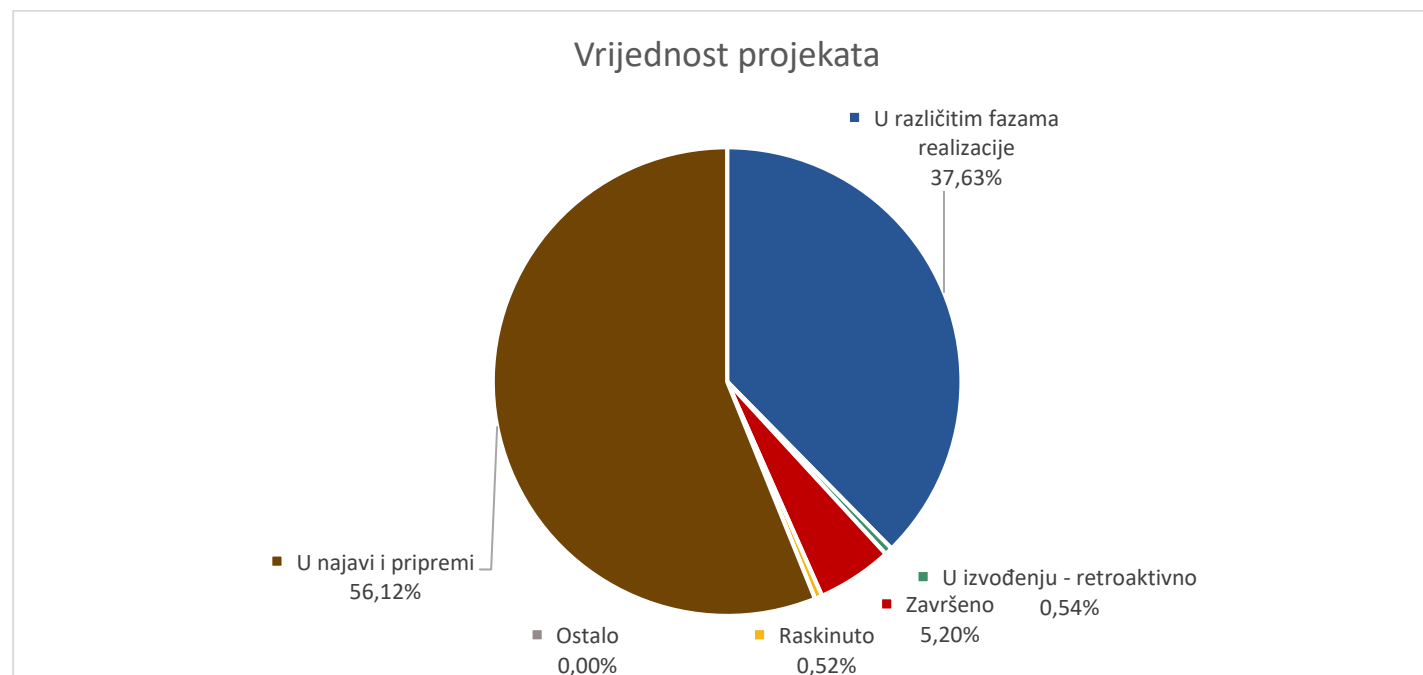

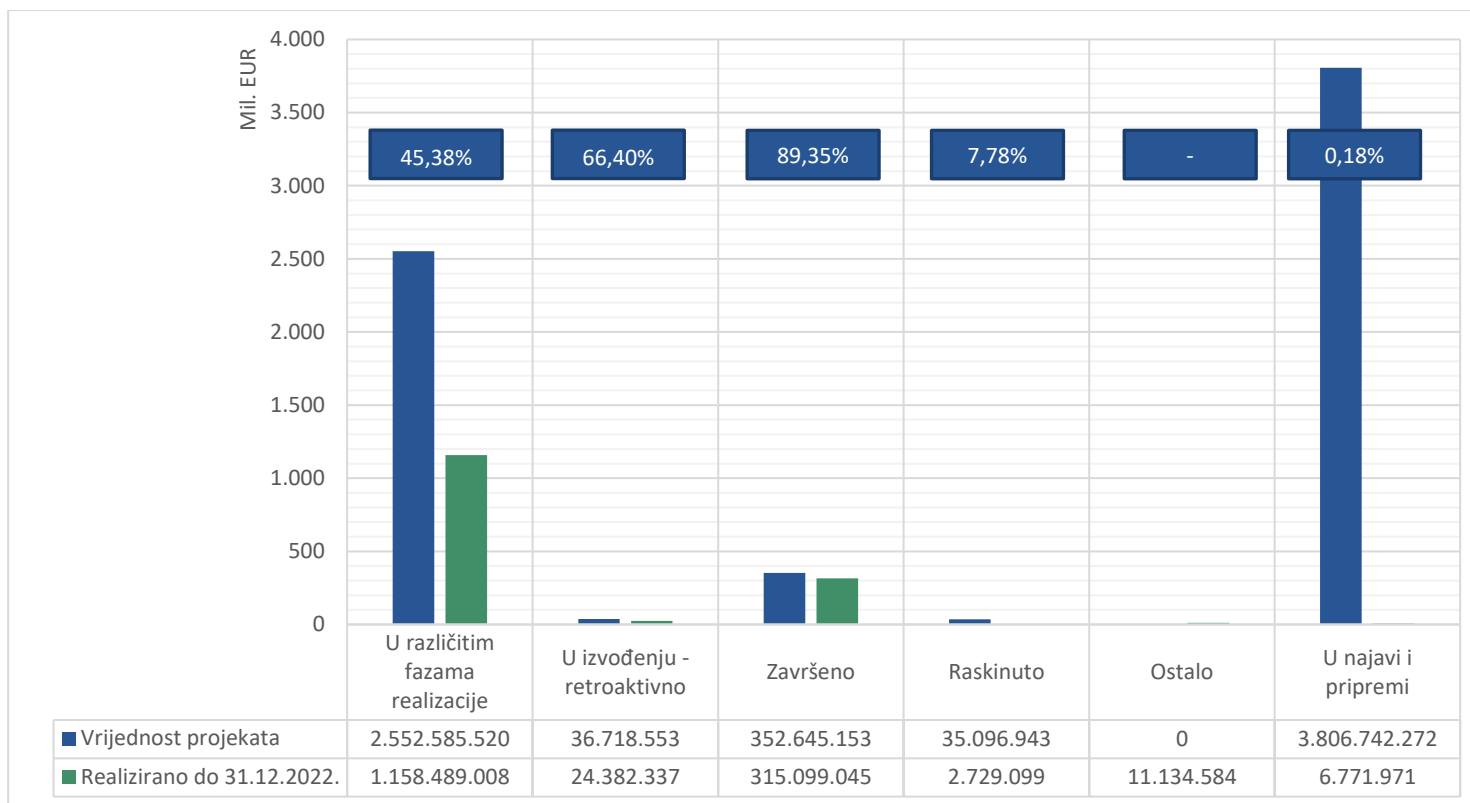

Pregled realizacije projekata prema financijskim pokazateljima (ugovoreno - fakturirano - realizacija) po pojedinim projektima i uslužnim područjima je kako slijedi:

Uslužno područje / rok usklađenja / aglomeracija	Vrijednost projekta		Realizirano do 31.12.2022.		Realizacija (%)	Komentar
	kune	euri	kune	euri		
1	1.740.107.809	230.951.995	601.904.807	79.886.496	34,59 %	
31.12.2018.	525.518.815	69.748.333	384.319.505	51.007.964	73,13 %	
Čakovec	276.469.972	36.693.871	199.444.068	26.470.777	72,14 %	
Donja Dubrava	249.048.842	33.054.462	184.875.437	24.537.187	74,23 %	
31.12.2020.	242.934.243	32.242.915	192.094.283	25.495.293	79,07 %	

Uslužno područje / rok usklađenja / aglomeracija	Vrijednost projekta		Realizirano do 31.12.2022.		Realizacija (%)	Komentar
	kune	euri	kune	euri		
Mursko Središće	242.934.243	32.242.915	192.094.283	25.495.293	79,07 %	
31.12.2023.	971.380.880	128.924.398	25.244.535	3.350.526	2,60 %	
Belica						u projektu agl. Podturen
Donji Kraljevec	154.091.848	20.451.503			0,00 %	
Držimurec						u projektu agl. Podturen
Goričan						u projektu agl. Donji Kraljevac
Novo Selo na Dravi	76.000.000	10.086.933	25.244.535	3.350.526	33,22 %	
Podbrest	251.967.562	33.441.842			0,00 %	
Podturen	489.321.470	64.944.120			0,00 %	
Turčišće						u projektu agl. Podturen
male aglomeracije (< 2.000 ES)	273.872	36.349	246.485	32.714	90,00 %	
Štrigova	273.872	36.349	246.485	32.714	90,00 %	
2	1.853.293.987	245.974.383	599.217.931	79.529.887	32,33 %	
31.12.2018.	687.795.086	91.286.095	461.538.095	61.256.632	67,10 %	
Varaždin	687.795.086	91.286.095	461.538.095	61.256.632	67,10 %	
31.12.2020.	173.047.160	22.967.305	61.843.414	8.208.032	35,74 %	
Ivanec	173.047.160	22.967.305	61.843.414	8.208.032	35,74 %	
31.12.2023.	964.337.024	127.989.518	54.444.928	7.226.084	5,65 %	
Jalžabet	108.000.000	14.334.063			0,00 %	
Lepoglava	92.460.500	12.271.617			0,00 %	
Ludbreg	369.710.574	49.069.026			0,00 %	
Novi Marof	278.523.438	36.966.413			0,00 %	
Varaždinske Toplice	56.446.168	7.491.694	54.444.928	7.226.084	96,45 %	
Veliki Bukovec	59.196.344	7.856.705			0,00 %	
mala	28.114.717	3.731.464	21.391.494	2.839.139	76,09 %	
Bedenec	4.255.000	564.736	4.057.000	538.456	95,35 %	
Bednja	6.762.000	897.472	237.000	31.455	3,50 %	
Beletinec	549.500	72.931			0,00 %	
Donja Voća	195.000	25.881			0,00 %	
Jalžabet	5.862.432	778.078	11.685.839	1.550.977	199,33 %	
Kapela Kalnička	334.000	44.329	334.000	44.329	100,00 %	
Klenovnik	100.000	13.272	100.000	13.272	100,00 %	
Slanje	489.500	64.968			0,00 %	
Sveti Ilija	9.482.286	1.258.516	4.918.155	652.751	51,87 %	
Žarovnica	85.000	11.281	59.500	7.897	70,00 %	
3	767.527.535	101.868.410	248.442.450	32.973.980	32,37 %	
31.12.2018.	704.001.035	93.436.994	248.139.450	32.933.765	35,25 %	
Koprivnica	447.630.810	59.410.818	158.648.319	21.056.250	35,44 %	
Križevci	256.370.225	34.026.176	89.491.130	11.877.514	34,91 %	
31.12.2020.	238.000	31.588	238.000	31.588	100,00 %	
Križevci	238.000	31.588	238.000	31.588	100,00 %	
mala	63.288.500	8.399.827	65.000	8.627	0,10 %	
Legrad	100.000	13.272	65.000	8.627	65,00 %	
Sveti Ivan Žabno	62.790.500	8.333.732			0,00 %	

Uslužno područje / rok usklađenja / aglomeracija	Vrijednost projekta		Realizirano do 31.12.2022.		Realizacija (%)	Komentar
	kune	euri	kune	euri		
Sveti Petar Orehovec	398.000	52.824			0,00 %	
4	1.136.853.247	150.886.356	155.858.608	20.685.992	13,71 %	
31.12.2018.	526.951.371	69.938.466	88.045.646	11.685.665	16,71 %	
Bjelovar	312.815.499	41.517.752	87.848.346	11.659.479	28,08 %	
Daruvar	214.135.872	28.420.714	197.300	26.186	0,09 %	
31.12.2023.	587.917.625	78.030.078	55.831.953	7.410.174	9,50 %	
Đurđevac	282.013.011	37.429.559	46.604.071	6.185.423	16,53 %	
Ferdinandovac						u projektu agl. Đurđevac
Garešnica	135.191.208	17.942.957			0,00 %	
Grubišno Polje	151.459.656	20.102.151	9.000.882	1.194.622	5,94 %	
Hercegovac						u projektu agl. Garešnica
Podravske Sesvete						u projektu agl. Đurđevac
Rovišće	18.468.000	2.451.125			0,00 %	u projektu agl. Đurđevac
Virje	785.750	104.287	227.000	30.128	28,89 %	
mala	21.984.251	2.917.812	11.981.009	1.590.153	54,50 %	
Đulovac	196.500	26.080	100.000	13.272	50,89 %	
Kapela	14.363.946	1.906.423	8.329.142	1.105.467	57,99 %	
Končanica	193.700	25.708	193.700	25.708	100,00 %	
Molve	112.000	14.865			0,00 %	
Sirač	198.000	26.279	158.400	21.023	80,00 %	
Suha Katalena	6.420.000	852.080	2.713.000	360.077	42,26 %	
Veliko Trojstvo	500.105	66.375	486.767	64.605	97,33 %	
5	861.706.936	114.368.165	397.793.488	52.796.269	46,16 %	
31.12.2018.	159.079.024	21.113.415	169.763.587	22.531.500	106,72 %	
Virovitica	159.079.024	21.113.415	169.763.587	22.531.500	106,72 %	
31.12.2020.	213.405.964	28.323.839	37.493.857	4.976.290	17,57 %	
Slatina	213.405.964	28.323.839	37.493.857	4.976.290	17,57 %	
31.12.2023.	479.506.172	63.641.406	185.295.768	24.592.975	38,64 %	
Čačinci	1.340.310	177.890	1.335.710	177.279	99,66 %	
Gradina						u projektu agl. Suhopolje
Orahovica	80.447.153	10.677.172			0,00 %	
Pitomača	209.818.645	27.847.720	183.960.058	24.415.696	87,68 %	
Suhopolje	187.900.064	24.938.624			0,00 %	
mala	9.715.775	1.289.505	5.240.276	695.504	53,94 %	
Čađavica	197.500	26.213			0,00 %	
Nova Bukovica	190.000	25.217			0,00 %	
Podravska Moslavina	5.330.715	707.507	5.240.276	695.504	98,30 %	
Voćin	3.997.560	530.567			0,00 %	
6	755.761.571	100.306.798	257.307.296	34.150.547	34,05 %	
31.12.2018.	382.743.357	50.798.773	203.760.973	27.043.729	53,24 %	
Đakovo	216.484.787	28.732.469	140.580.509	18.658.240	64,94 %	
Našice	166.258.570	22.066.304	63.180.465	8.385.489	38,00 %	
31.12.2023.	369.934.872	49.098.795	52.124.323	6.918.086	14,09 %	
Punitovci	88.506.270	11.746.801	5.854.470	777.022	6,61 %	

Uslužno područje / rok usklađenja / aglomeracija	Vrijednost projekta		Realizirano do 31.12.2022.		Realizacija (%)	Komentar
	kune	euri	kune	euri		
Semeljci	175.653.809	23.313.267	46.269.853	6.141.065	26,34 %	
Sušine-Đurđenovac	105.774.793	14.038.728			0,00 %	
mala	3.083.342	409.230	1.422.000	188.732	46,12 %	
Feričanci	220.000	29.199	198.000	26.279	90,00 %	
Podgorač	2.863.342	380.031	1.224.000	162.453	42,75 %	
7	164.934.898	21.890.623	35.604.068	4.725.472	21,59 %	
31.12.2018.	116.682.963	15.486.491	25.287.696	3.356.254	21,67 %	
Beli Manastir	116.682.963	15.486.491	25.287.696	3.356.254	21,67 %	
31.12.2020.	10.751.935	1.427.027	10.316.372	1.369.218	95,95 %	
Beli Manastir	10.751.935	1.427.027	10.316.372	1.369.218	95,95 %	
31.12.2023.	37.500.000	4.977.105			0,00 %	
Kneževi Vinogradi	37.500.000	4.977.105			0,00 %	
8	1.859.135.814	246.749.726	644.243.078	85.505.751	34,65 %	
31.12.2018.	1.053.361.469	139.805.092	642.948.881	85.333.981	61,04 %	
Belišće	334.293.624	44.368.389	184.277.455	24.457.821	55,12 %	
Osijek	719.067.845	95.436.704	458.671.427	60.876.160	63,79 %	
31.12.2023.	805.774.344	106.944.634	1.294.196	171.769	0,16 %	
Dalj	35.948.000	4.771.120			0,00 %	
Donji Miholjac	119.052.321	15.800.958	1.294.196	171.769	1,09 %	
Ernestinovo	650.774.023	86.372.556			0,00 %	
Koška						u projektu agl. Belišće
Petrijevci						u projektu agl. Belišće
9	864.134.365	114.690.340	184.630.942	24.504.737	21,37 %	
31.12.2018.	478.674.348	63.531.004	175.988.719	23.357.717	36,77 %	
Zabok	478.674.348	63.531.004	175.988.719	23.357.717	36,77 %	
31.12.2020.	124.167.883	16.479.910	0	0	0,00 %	
Krapina	124.167.883	16.479.910			0,00 %	
Zlatar						u projektu agl. Zabok
31.12.2023.	253.674.622	33.668.408	4.148.222	550.564	1,64 %	
Hum na Sutli	54.601.410	7.246.852			0,00 %	
Jakovlje	92.447.804	12.269.932			0,00 %	
Krapina	5.149.693	683.482	4.148.222	550.564	80,55 %	
Krapinske Toplice	51.971.189	6.897.762			0,00 %	
Pregrada	49.504.526	6.570.380			0,00 %	
mala	7.617.511	1.011.018	4.494.001	596.456	59,00 %	
Desinić	7.617.511	1.011.018	4.494.001	596.456	59,00 %	
10	608.330.383	80.739.317	477.992.084	63.440.452	78,57 %	
31.12.2018.	608.330.383	80.739.317	477.992.084	63.440.452	78,57 %	
Zaprešić	608.330.383	80.739.317	477.992.084	63.440.452	78,57 %	
11	2.340.974.895	310.700.763	139.249.010	18.481.520	5,95 %	
31.12.2018.	2.140.387.175	284.078.197	8.914.232	1.183.122	0,42 %	
Samobor	218.409.725	28.987.952			0,00 %	
Zagreb	1.921.977.450	255.090.245	8.914.232	1.183.122	0,46 %	

Uslužno područje / rok usklađenja / aglomeracija	Vrijednost projekta		Realizirano do 31.12.2022.		Realizacija (%)	Komentar
	kune	euri	kune	euri		
31.12.2020.	136.487.261	18.114.973	127.442.487	16.914.525	93,37 %	
Glavničica						u projektu agl. Zagreb
Jastrebarsko	136.487.261	18.114.973	127.442.487	16.914.525	93,37 %	
31.12.2023.	64.100.459	8.507.593	2.892.291	383.873	4,51 %	
Donja Zdenčina	2.893.059	383.975	2.892.291	383.873	99,97 %	
Donja Zdenčina - Klinča sela	61.207.400	8.123.618			0,00 %	
Gudci						u projektu agl. Đurđevac
12	530.237.609	70.374.625	384.872.510	51.081.360	72,58 %	
31.12.2018.	398.890.121	52.941.817	384.872.510	51.081.360	96,49 %	
Velika Gorica	398.890.121	52.941.817	384.872.510	51.081.360	96,49 %	
31.12.2023.	131.347.488	17.432.807	0	0	0,00 %	
Mala Buna	131.347.488	17.432.807		0	0,00 %	
13	1.086.029.519	144.140.888	227.439.806	30.186.450	20,94 %	
31.12.2018.	610.759.915	81.061.771	211.184.510	28.029.001	34,58 %	
Ivanić Grad	286.296.395	37.998.062			0,00 %	
Rugvica	173.079.910	22.971.652	195.695.370	25.973.239	113,07 %	
Vrbovec	151.383.610	20.092.058	15.489.141	2.055.762	10,23 %	
31.12.2023.	447.280.843	59.364.370	0	0	0,00 %	
Brckovljani						u projektu agl. Sveti Ivan Zelina
Čazma	91.690.268	12.169.390			0,00 %	
Dubrava						u projektu agl. Vrbovec
Gradec						u projektu agl. Vrbovec
Križ-Novoselec	90.000.000	11.945.053			0,00 %	
Lipovec Lonjski	32.000.000	4.247.130			0,00 %	
Paukovec						u projektu agl. Sveti Ivan Zelina
Polonje						u projektu agl. Sveti Ivan Zelina
Sveti Ivan Zelina	233.590.575	31.002.797			0,00 %	
mala	27.988.760	3.714.747	16.255.296	2.157.448	58,08 %	
Berek	7.864.314	1.043.774	7.287.993	967.283	92,67 %	
Narta	197.750	26.246	99.900	13.259	50,52 %	
Pisarovina	19.926.697	2.644.727	8.867.403	1.176.907	44,50 %	
14	708.346.847	94.013.783	158.021.182	20.973.015	22,31 %	
31.12.2018.	358.997.261	47.647.125	150.000.932	19.908.545	41,78 %	
Karlovac-Duga Resa	358.997.261	47.647.125	150.000.932	19.908.545	41,78 %	
31.12.2023.	340.602.585	45.205.732	997.500	132.391	0,29 %	
Draganić	54.000.000	7.167.032			0,00 %	
Josipdol	50.400.000	6.689.230			0,00 %	
Ogulin	170.466.382	22.624.777	997.500	132.391	0,59 %	
Slunj	65.736.203	8.724.693			0,00 %	
mala	8.747.000	1.160.926	7.022.750	932.079	80,29 %	
Barilović	4.904.000	650.873	2.050.500	272.148	41,81 %	
Donji Velemerić						u projektu agl. Barilović
Krnjak	395.000	52.426	169.750	22.530	42,97 %	

Uslužno područje / rok usklađenja / aglomeracija	Vrijednost projekta		Realizirano do 31.12.2022.		Realizacija (%)	Komentar
	kune	euri	kune	euri		
Ozalj	3.053.000	405.203	2.752.000	365.253	90,14 %	
Žakanje	395.000	52.426		0	0,00 %	
15	960.668.437	127.502.613	268.746.021	35.668.727	27,97 %	
31.12.2018.	421.011.051	55.877.769	266.964.344	35.432.258	63,41 %	
Petrinja	421.011.051	55.877.769	266.964.344	35.432.258	63,41 %	
31.12.2023.	531.645.319	70.561.460	150.000	19.908	0,03 %	
Dvor	54.000.000	7.167.032			0,00 %	
Glina	137.572.197	18.258.968	150.000	19.908	0,11 %	
Hrvatska Kostajnica	54.000.000	7.167.032			0,00 %	
Lekenik	286.073.122	37.968.428			0,00 %	
mala	8.012.068	1.063.384	1.631.677	216.561	20,37 %	
Hrvatska Dubica	4.751.716	630.661	972.940	129.131	20,48 %	
Hrvatska Kostajnica	363.500	48.245			0,00 %	
Jasenovac	2.317.151	307.539	268.037	35.575	11,57 %	
Topusko	579.700	76.939	390.700	51.855	67,40 %	
16	769.133.237	102.081.523	252.640.025	33.531.094	32,85 %	
31.12.2018.	707.933.237	93.958.887	252.640.025	33.531.094	35,69 %	
Sisak	707.933.237	93.958.887	252.640.025	33.531.094	35,69 %	
31.12.2023.	61.200.000	8.122.636			0,00 %	
Sunja	61.200.000	8.122.636			0,00 %	
17	755.065.932	100.214.471	277.376.927	36.814.245	36,74 %	
31.12.2018.	390.731.725	51.859.012	193.423.585	25.671.721	49,50 %	
Kutina	390.731.725	51.859.012	193.423.585	25.671.721	49,50 %	
31.12.2020.	118.093.654	15.673.721	77.834.934	10.330.471	65,91 %	
Novska	118.093.654	15.673.721	77.834.934	10.330.471	65,91 %	
31.12.2023.	240.642.053	31.938.689	768.571	102.007	0,32 %	
Lipovljani	63.192.500	8.387.086	192.500	25.549	0,30 %	
Popovača	177.449.553	23.551.603	576.071	76.458	0,32 %	
Voloder						u projektu agl. Popovača
mala	5.598.500	743.049	5.349.837	710.045	95,56 %	
Stara Subocka	5.598.500	743.049	5.349.837	710.045	95,56 %	
18	649.025.266	86.140.456	389.951.246	51.755.425	60,08 %	
31.12.2018.	330.457.116	43.859.197	291.411.029	38.676.890	88,18 %	
Lipik-Pakrac	153.546.408	20.379.111	150.973.540	20.037.632	98,32 %	
Požega	176.910.708	23.480.086	140.437.489	18.639.258	79,38 %	
31.12.2020.	141.426.792	18.770.561	87.434.840	11.604.597	61,82 %	
Pleternica	141.426.792	18.770.561	87.434.840	11.604.597	61,82 %	
31.12.2023.	158.836.473	21.081.223			0,00 %	
Kaptol	48.600.000	6.450.328			0,00 %	
Kutjevo	110.236.473	14.630.894			0,00 %	
Velika						u projektu agl. Kutjevo
mala	18.304.886	2.429.476	11.105.378	1.473.937	60,67 %	
Bertelovci	2.822.000	374.544	2.615.000	347.070	92,66 %	
Brodski Drenovac	11.087.623	1.471.580	5.629.810	747.204	50,78 %	

Uslužno područje / rok usklađenja / aglomeracija	Vrijednost projekta		Realizirano do 31.12.2022.		Realizacija (%)	Komentar
	kune	euri	kune	euri		
Čaglin	150.000	19.908			0,00 %	
Eminovci	2.563.000	340.169	1.594.000	211.560	62,19 %	
Kaptol	1.483.263	196.863	1.266.568	168.102	85,39 %	
Marino Selo	199.000	26.412			0,00 %	
19	516.620.557	68.567.331	132.982.807	17.649.852	25,74 %	
31.12.2018.	144.909.000	19.232.729	126.819.135	16.831.792	87,52 %	
Nova Gradiška	143.169.478	19.001.855	125.224.287	16.620.119	87,47 %	
Okučani	1.739.522	230.874	1.594.848	211.673	91,68 %	
31.12.2023.	357.908.995	47.502.687	0	0	0,00 %	
Batrina						u najavi
Davor	47.700.000	6.330.878			0,00 %	
Okučani	69.839.415	9.269.283			0,00 %	
Staro Petrovo Selo	240.369.580	31.902.526			0,00 %	
mala	13.802.562	1.831.915	6.163.673	818.060	44,66 %	
Orubica	13.802.562	1.831.915	6.163.673	818.060	44,66 %	
20	1.223.704.551	162.413.505	223.538.176	29.668.615	18,27 %	
31.12.2018.	225.766.028	29.964.301	223.538.176	29.668.615	99,01 %	
Slavonski Brod	225.766.028	29.964.301	223.538.176	29.668.615	99,01 %	
31.12.2023.	997.938.523	132.449.203	0	0	0,00 %	
Beravci						u projektu agl. Oriovac
Brodski Stupnik						u projektu agl. Garčin
Donji Andrijevc						u projektu agl. Garčin
Garčin	500.225.523	66.391.336			0,00 %	
Gundinci						u projektu agl. Oriovac
Oriovac	497.713.000	66.057.867			0,00 %	
Slavonski Šamac						u projektu agl. Oriovac
Vrpolje						u projektu agl. Oriovac
21	1.658.808.040	220.161.662	492.153.462	65.319.990	29,67 %	
31.12.2018.	533.889.733	70.859.345	492.153.462	65.319.990	92,18 %	
Vinkovci	456.892.581	60.640.066	432.141.426	57.355.024	94,58 %	
Županja	76.997.152	10.219.278	60.012.035	7.964.966	77,94 %	
31.12.2023.	1.124.918.307	149.302.317	0	0	0,00 %	
Babina Greda	174.601.174	23.173.558			0,00 %	
Bošnjaci						u projektu agl. Gradište
Cerna						u projektu agl. Vinkovci
Gradište	91.675.154	12.167.384			0,00 %	
Gunja	208.118.986	27.622.136			0,00 %	
Ivankovo						u projektu agl. Vinkovci
Jarmina						u projektu agl. Nuštar
Nijemci	237.600.000	31.534.939			0,00 %	
Novi Jankovci						u projektu agl. Nijemci
Nuštar	358.922.993	47.637.268			0,00 %	

Uslužno područje / rok usklađenja / aglomeracija	Vrijednost projekta		Realizirano do 31.12.2022.		Realizacija (%)	Komentar
	kune	euri	kune	euri		
Otok (Vinkovci)						u projektu agl. Vinkovci
Rajevo Selo	54.000.000	7.167.032			0,00 %	
Vođinci						u projektu agl. Babina Greda
Vrbanja						u projektu agl. Nijemci
22	422.115.992	56.024.420	343.964.618	45.651.950	81,49 %	
31.12.2018.	368.667.663	48.930.608	341.535.950	45.329.610	92,64 %	
Vukovar	368.667.663	48.930.608	341.535.950	45.329.610	92,64 %	
31.12.2023.	53.258.329	7.068.595	2.238.668	297.122	4,20 %	
Ilok	53.258.329	7.068.595	2.238.668	297.122	4,20 %	
mala	190.000	25.217	190.000	25.217	100,00 %	
Lovas	190.000	25.217	190.000	25.217	100,00 %	
23	2.445.090.002	324.519.212	841.814.008	111.727.919	34,43 %	
31.12.2018.	1.230.659.572	163.336.595	805.092.792	106.854.176	65,42 %	
Lanterna	409.395.049	54.336.061	347.580.422	46.131.850	84,90 %	
Novigrad Istarski	3.400.677	451.347	634.677	84.236	18,66 %	
Poreč-Jug	39.148.248	5.195.865	45.420.107	6.028.284	116,02 %	
Poreč-Sjever	8.253.618	1.095.443	8.253.618	1.095.443	100,00 %	
Rovinj	266.780.943	35.407.916	194.250.915	25.781.527	72,81 %	
Umag	448.563.961	59.534.669	203.529.311	27.012.982	45,37 %	
Vrsar	55.117.076	7.315.293	5.423.742	719.854	9,84 %	
31.12.2023.	1.175.866.824	156.064.347	14.556.537	1.931.984	1,24 %	
Buje	173.594.099	23.039.896	153.950	20.433	0,09 %	
Buzet	131.840.011	17.498.177	694.894	92.228	0,53 %	
Kanfana	8.968.000	1.190.258			0,00 %	
Pazin	861.464.713	114.336.016	13.707.692	1.819.323	1,59 %	
mala	38.563.607	5.118.270	22.164.680	2.941.759	57,48 %	
Cerovlje	22.548.794	2.992.739	11.181.622	1.484.056	49,59 %	
Gračiče	349.000	46.320			0,00 %	
Grimalda	3.311.000	439.445	310.000	41.144	9,36 %	
Karojba	342.000	45.391	130.600	17.334	38,19 %	
Kršete	42.250	5.608	42.250	5.608	100,00 %	
Lupoglav Istarski	2.233.176	296.393	2.025.017	268.766	90,68 %	
Mandalenčići	3.947.000	523.857	3.591.000	476.608	90,98 %	
Motovun	200.000	26.545	53.850	7.147	26,93 %	
Ritošin Brig	3.937.000	522.530	3.920.000	520.273	99,57 %	
Tinjan	981.800	130.307	437.478	58.063	44,56 %	
Višnjan	473.588	62.856	472.862	62.760	99,85 %	
Žminj	198.000	26.279			0,00 %	
24	1.995.031.652	264.786.204	27.127.178	3.600.395	1,36 %	
31.12.2018.	1.005.769.195	133.488.512	7.600.659	1.008.781	0,76 %	
Medulin	298.240.039	39.583.256	1.595.513	211.761	0,53 %	
Pula Centar	36.374.239	4.827.691	6.005.146	797.020	16,51 %	
Pula-Centar	671.154.917	89.077.565			0,00 %	

Uslužno područje / rok usklađenja / aglomeracija	Vrijednost projekta		Realizirano do 31.12.2022.		Realizacija (%)	Komentar
	kune	euri	kune	euri		
31.12.2020.	970.788.015	128.845.712	2.324.385	308.499	0,24 %	
Labin	624.860.371	82.933.223	2.294.000	304.466	0,37 %	
Pula-Sjever	345.927.644	45.912.488	30.385	4.033	0,01 %	
31.12.2023.	516.442	68.544	339.134	45.011	65,67 %	
Banjole	516.442	68.544	339.134	45.011	65,67 %	u projektu agl. Medulin
Premantura						u projektu agl. Medulin
Rabac						u projektu agl. Labin
Raša						u projektu agl. Labin
mala	17.958.000	2.383.436	16.863.000	2.238.105	93,90 %	
Brijuni	320.000	42.471			0,00 %	
Loborika	12.055.000	1.599.973	11.668.000	1.548.610	96,79 %	
Sveti Bartul-Vicani	5.583.000	740.991	5.195.000	689.495	93,05 %	
25	3.217.518.234	427.038.056	394.289.248	52.331.176	12,25 %	
31.12.2018.	2.363.084.190	313.635.170	257.338.545	34.154.694	10,89 %	
Opatija-Lovran	598.016.486	79.370.428	4.942.108	655.930	0,83 %	
Rijeka	1.765.067.704	234.264.743	252.396.437	33.498.764	14,30 %	
31.12.2023.	819.294.195	108.739.026	116.930.047	15.519.284	14,27 %	
Delnice	52.656.087	6.988.664	52.542.057	6.973.529	99,78 %	
Fužine	55.546.506	7.372.288	47.480.466	6.301.741	85,48 %	
Kostrena	481.192.890	63.865.272	16.907.524	2.244.014	3,51 %	
Kraljevica	229.898.711	30.512.803			0,00 %	
Mošćenička Draga						u projektu agl. Opatija-Lovran
mala	35.139.850	4.663.860	20.020.657	2.657.198	56,97 %	
Brod Moravice	17.236.568	2.287.686	8.955.376	1.188.583	51,96 %	
Brseč	6.311.000	837.614	5.593.000	742.319	88,62 %	
Mrkopalj	6.380.000	846.772	3.720.600	493.809	58,32 %	
Ravna Gora	1.468.000	194.837	586.343	77.821	39,94 %	
Vrbovsko	3.744.281	496.952	1.165.337	154.667	31,12 %	
26	911.788.198	121.015.090	412.648.151	54.767.822	45,26 %	
31.12.2018.	510.913.257	67.809.842	326.805.259	43.374.512	63,96 %	
Krk	510.913.257	67.809.842	326.805.259	43.374.512	63,96 %	
31.12.2020.						
Mali Lošinj						u projektu agl. Cres
Malinska-Njivice						u projektu agl. Krk
31.12.2023.	388.552.276	51.569.749	71.075.206	9.433.301	18,29 %	
Baška						u projektu agl. Krk
Cres	387.020.156	51.366.402	70.525.206	9.360.303	18,22 %	
Klimno-Šilo	1.532.120	203.347	550.000	72.998	35,90 %	
Martinšćica						u projektu agl. Cres
Nerezine						u projektu agl. Cres
Omišalj						u projektu agl. Krk
Punat						u projektu agl. Krk
mala	12.322.664	1.635.499	14.767.686	1.960.009	119,84 %	

Uslužno područje / rok usklađenja / aglomeracija	Vrijednost projekta		Realizirano do 31.12.2022.		Realizacija (%)	Komentar
	kune	euri	kune	euri		
Orlec	5.358.000	711.129	5.780.000	767.138	107,88 %	
Unije	4.808.531	638.202	6.944.258	921.661	144,42 %	
Vrbnik	2.156.133	286.168	2.043.428	271.210	94,77 %	
27	1.066.440.275	141.540.948	285.401.389	37.879.274	26,76 %	
31.12.2018.	367.636.276	48.793.719	138.616.584	18.397.582	37,70 %	
Crikvenica	367.636.276	48.793.719	138.616.584	18.397.582	37,70 %	
31.12.2023.	698.803.998	92.747.229	146.784.805	19.481.692	21,01 %	
Jadranovo	117.973.460	15.657.769			0,00 %	
Klenovica	213.194.262	28.295.741			0,00 %	
Novi Vinodolski	367.636.276	48.793.719	146.784.805	19.481.692	39,93 %	
28	1.241.967.568	164.837.424	134.514.265	17.853.111	10,83 %	
31.12.2018.	770.737.469	102.294.441	129.339.433	17.166.293	16,78 %	
Novalja	248.353.490	32.962.173	129.339.433	17.166.293	52,08 %	
Rab	522.383.979	69.332.269			0,00 %	
31.12.2023.	471.230.099	62.542.982	5.174.832	686.818	1,10 %	
Karlobag	35.200.000	4.671.843			0,00 %	
Lopar	958.885	127.266	993.943	131.919	103,66 %	
Mandre						u projektu agl. Pag
Pag	402.837.891	53.465.776	2.323.163	308.337	0,58 %	
Povljana	3.393.700	450.421	89.700	11.905	2,64 %	
Senj	28.839.623	3.827.676	1.768.026	234.657	6,13 %	
Supetarska Draga						u projektu agl. Rab
29	640.134.615	84.960.464	4.091.749	543.068	0,64 %	
31.12.2023.	609.991.414	80.959.774	0	0	0,00 %	
Gospić	228.270.193	30.296.661			0,00 %	
Otočac	71.790.873	9.528.286			0,00 %	
Plitvička jezera	309.930.348	41.134.826			0,00 %	
mala	30.143.201	4.000.690	4.091.749	543.068	13,57 %	
Donji Babin Potok	5.038.998	668.790	3.300.282	438.023	65,49 %	
Perušić	2.549.040	338.316	623.748	82.786	24,47 %	
Vojnić	22.555.163	2.993.585	167.720	22.260	0,74 %	
30	3.764.073.101	499.578.353	473.699.281	62.870.699	12,58 %	
31.12.2018.	472.870.007	62.760.635	206.075.439	27.350.911	43,58 %	
Zadar	472.870.007	62.760.635	206.075.439	27.350.911	43,58 %	
31.12.2020.	1.520.647.941	201.824.665	260.691.794	34.599.747	17,14 %	
Bibinje-Sukošan	294.410.930	39.075.045			0,00 %	
Nin	438.889.847	58.250.693	231.878.033	30.775.504	52,83 %	
Vir	787.347.164	104.498.927	28.813.760	3.824.243	3,66 %	
31.12.2023.	1.763.207.280	234.017.822	0	0	0,00 %	
Gračac						u najavi
Kali						u projektu agl. Preko
Posedarje						u projektu agl. Novigradski zaljev
Preko	177.547.600	23.564.616			0,00 %	
Ražanac	1.445.519.681	191.853.432			0,00 %	

Uslužno područje / rok usklađenja / aglomeracija	Vrijednost projekta		Realizirano do 31.12.2022.		Realizacija (%)	Komentar
	kune	euri	kune	euri		
Starigrad Zadarski						u projektu agl. Novigradski zaljev u najavi
Škabrnja						
Ugljan	140.140.000	18.599.774			0,00 %	
mala	7.347.872	975.230	6.932.048	920.041	94,34 %	
Novigrad Zadarski	631.800	83.854	505.000	67.025	79,93 %	
Zemunik Donji	6.716.072	891.376	6.427.048	853.016	95,70 %	
31	825.246.319	109.529.009	7.704.320	1.022.539	0,93 %	
31.12.2018.	552.621.724	73.345.507	3.789.000	502.887	0,69 %	
Biograd	552.621.724	73.345.507	3.789.000	502.887	0,69 %	
31.12.2023.	272.624.595	36.183.502	3.915.320	519.652	1,44 %	
Benkovac	4.393.786	583.156	3.915.320	519.652	89,11 %	
Pašman	268.230.809	35.600.346			0,00 %	
32	2.059.666.818	273.364.765	549.133.695	72.882.566	26,66 %	
31.12.2018.	898.913.867	119.306.373	385.556.902	51.172.195	42,89 %	
Šibenik	397.619.090	52.773.122	286.316.189	38.000.689	72,01 %	
Vodice	501.294.777	66.533.251	99.240.713	13.171.506	19,80 %	
31.12.2020.	523.507.460	69.481.380	120.555.716	16.000.493	23,03 %	
Knin	121.992.356	16.191.168	120.555.716	16.000.493	98,82 %	
Pirovac-Tisno-Jezera	401.515.104	53.290.212			0,00 %	
31.12.2023.	617.590.127	81.968.296	42.556.305	5.648.192	6,89 %	
Betina-Murter	124.691.413	16.549.395			0,00 %	
Bilice	66.000.000	8.759.705			0,00 %	
Drniš	66.920.250	8.881.844	42.556.305	5.648.192	63,59 %	
Primošten	169.649.094	22.516.304			0,00 %	
Rogoznica	190.329.370	25.261.049			0,00 %	
mala	19.655.364	2.608.715	464.771	61.686	2,36 %	
Golubić	579.000	76.847			0,00 %	
Vrlika	990.114	131.411	464.771	61.686	46,94 %	
Zaton	18.086.250	2.400.458			0,00 %	
33	3.079.437.660	408.711.615	496.361.168	65.878.448	16,12 %	
31.12.2018.	2.599.365.000	344.995.023	489.760.463	65.002.384	18,84 %	
Čiovo	7.327.671	972.549	8.711.372	1.156.198	118,88 %	
Kaštela-Trogir	1.157.862.820	153.674.805	453.074.078	60.133.264	39,13 %	
Split-Solin	1.434.174.508	190.347.668	27.975.012	3.712.922	1,95 %	
31.12.2023.	473.000.000	62.777.888	0	0	0,00 %	
Marina	354.200.000	47.010.419			0,00 %	
Muč	118.800.000	15.767.470			0,00 %	
Vinišće						u najavi
mala	7.072.660	938.703	6.600.705	876.064	93,33 %	
Stomorska	7.072.660	938.703	6.600.705	876.064	93,33 %	
34	558.251.356	74.092.688	195.129.869	25.898.184	34,95 %	
31.12.2018.	302.669.801	40.171.186	56.736.874	7.530.277	18,75 %	
Sinj	302.669.801	40.171.186	56.736.874	7.530.277	18,75 %	
31.12.2023.	199.479.212	26.475.441	138.234.595	18.346.884	69,30 %	


Uslužno područje / rok usklađenja / aglomeracija	Vrijednost projekta		Realizirano do 31.12.2022.		Realizacija (%)	Komentar
	kune	euri	kune	euri		
Dicmo						u projektu agl. Otok
Otok	80.218.156	10.646.779	55.935.809	7.423.958	69,73 %	
Trilj	119.261.056	15.828.662	82.298.786	10.922.926	69,01 %	
mala	56.102.344	7.446.061	158.400	21.023	0,28 %	
Hrvace	56.102.344	7.446.061	158.400	21.023	0,28 %	
35	355.991.636	47.248.210	0	0	0,00 %	
31.12.2023.	355.991.636	47.248.210	0	0	0,00 %	
Dugi Rat	177.235.093	23.523.139			0,00 %	
Mimice	23.256.000	3.086.602			0,00 %	
Omiš	155.500.543	20.638.469			0,00 %	
36	1.127.544.374	149.650.856	201.282.905	26.714.832	17,85 %	
31.12.2020.	378.933.698	50.293.145	171.535.022	22.766.610	45,27 %	
Jelsa-Vrboska	378.933.698	50.293.145	171.535.022	22.766.610	45,27 %	
31.12.2023.	730.445.451	96.946.772	16.952.819	2.250.026	2,32 %	
Bol	19.000.000	2.521.733			0,00 %	
Hvar	200.000.000	26.544.562			0,00 %	
Komiža	187.068.943	24.828.315	12.048.894	1.599.163	6,44 %	
Milna	21.000.000	2.787.179			0,00 %	
Postira	16.454.000	2.183.821			0,00 %	
Supetar	37.355.509	4.957.928	4.903.925	650.863	13,13 %	
Sutivan	6.992.000	927.998			0,00 %	
Vis	242.575.000	32.195.235			0,00 %	
mala	18.165.225	2.410.940	12.795.064	1.698.197	70,44 %	
Murvica (Bol)	9.802.200	1.300.976	5.051.511	670.451	51,53 %	
Povlja	1.088.000	144.402			0,00 %	
Sučuraj	7.275.025	965.562	7.743.553	1.027.746	106,44 %	
37	1.024.197.548	135.934.375	62.968.178	8.357.313	6,15 %	
31.12.2018.	231.014.072	30.660.836	62.073.826	8.238.613	26,87 %	
Imotski	231.014.072	30.660.836	62.073.826	8.238.613	26,87 %	
31.12.2020.	239.357.976	31.768.263	0	0	0,00 %	
Makarska	239.357.976	31.768.263		0	0,00 %	
31.12.2023.	553.825.500	73.505.276	894.351	118.701	0,16 %	
Baška Voda						u projektu Makarsko primorje (Brela)
Brela	343.623.000	45.606.610			0,00 %	u projektu Makarsko primorje
Drvenik	165.000.000	21.899.263			0,00 %	
Podgora	1.202.500	159.599	894.351	118.701	74,37 %	u projektu Makarsko primorje (Brela)
Promajna-Krvavica						u projektu Makarsko primorje (Brela)
Tučepi						u projektu Makarsko primorje (Brela)
Živogošće	44.000.000	5.839.804			0,00 %	
38	1.833.064.349	243.289.448	298.332.761	39.595.562	16,28 %	
31.12.2018.	358.929.889	47.638.183	143.622.296	19.061.954	40,01 %	
Metković	358.929.889	47.638.183	143.622.296	19.061.954	40,01 %	
31.12.2023.	1.471.968.960	195.363.854	153.024.625	20.309.858	10,40 %	
Gradac	53.600.000	7.113.943			0,00 %	

Uslužno područje / rok usklađenja / aglomeracija	Vrijednost projekta		Realizirano do 31.12.2022.		Realizacija (%)	Komentar
	kune	euri	kune	euri		
Malostonski zaljev	962.554.646	127.752.956	46.108.904	6.119.703	4,79 %	
Opuzen	209.550.000	27.812.065			0,00 %	
Ploče	199.275.529	26.448.408	91.513.414	12.145.917	45,92 %	
Vrgorac	46.988.786	6.236.484	15.402.307	2.044.237	32,78 %	
mala	2.165.500	287.411	1.685.841	223.750	77,85 %	
Blace	429.000	56.938	16.000	2.124	3,73 %	
Komin	1.736.500	230.473	1.669.841	221.626	96,16 %	
39	997.631.711	132.408.482	11.755.275	1.560.193	1,18 %	
31.12.2020.	102.374.580	13.587.442	2.625.000	348.397	2,56 %	
Vela Luka	102.374.580	13.587.442	2.625.000	348.397	2,56 %	
31.12.2023.	885.116.571	117.475.157	1.109.460	147.251	0,13 %	
Blato	191.695.393	25.442.351			0,00 %	
Janjina	110.000.000	14.599.509			0,00 %	
Korčula	137.100.000	18.196.297			0,00 %	
Lumbarda	16.100.000	2.136.837			0,00 %	
Orebić	309.208.215	41.038.983	314.360	41.723	0,10 %	
Smokvica-Brna						u projektu agl. Blato
Trpanj	121.012.963	16.061.180	795.100	105.528	0,66 %	
mala	10.140.560	1.345.884	8.020.815	1.064.545	79,10 %	
Mljet	7.881.654	1.046.075	5.778.153	766.893	73,31 %	
Prud	2.258.906	299.808	2.242.662	297.652	99,28 %	
40	1.387.487.286	184.151.209	136.280.151	18.087.484	9,82 %	
31.12.2018.	668.096.529	88.671.648	130.683.745	17.344.714	19,56 %	
Dubrovnik	668.096.529	88.671.648	130.683.745	17.344.714	19,56 %	
31.12.2023.	706.674.780	93.791.861	0	0	0,00 %	
Malostonski zaljev	370.000	49.107			0,00 %	
Slano	23.704.780	3.146.165			0,00 %	
Zaton	182.600.000	24.235.185			0,00 %	
Župa Dubrovačka	500.000.000	66.361.404			0,00 %	
mala	12.715.977	1.687.700	5.596.406	742.771	44,01 %	
Lopud	12.715.977	1.687.700	5.596.406	742.771	44,01 %	
41	349.373.880	46.369.883	15.473.102	2.053.634	4,43 %	
31.12.2023.	330.000.000	43.798.527	0	0	0,00 %	
Cavtat	330.000.000	43.798.527			0,00 %	
mala	19.373.880	2.571.356	15.473.102	2.053.634	79,87 %	
Molunat	19.373.880	2.571.356	15.473.102	2.053.634	79,87 %	
Grand Total	51.112.454.009	6.783.788.441	11.441.937.235	1.518.606.044	22,39 %	

Ako se izuzmu oni financijski paketi koji su završeni u cijelosti (IPA+ISPA, OPZO 2007-2013, SD i RR), najviši stupanj realizacije imaju, odnosno najbrže se realiziraju projekti koji se financiraju sredstvima iz redovitog programa Hrvatskih voda. Realizacija komponenti projekata aglomeracija koji se financiraju

sredstvima Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (2021.-2026.) i Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija) 2014. - 2020. je usporediva iako je po iznosima značajno različita.

Od ukupno 97 komponenti projekata aglomeracija koje su financirane sredstvima redovitog programa Hrvatskih voda prema 1. Izvješću (ukupna vrijednost 106,24 milijuna kuna, odnosno 14,1 milijuna eura), Planom upravljanja vodama za 2023. godinu predviđeno je financiranje njih 60 (ukupna vrijednost oko 67,1 milijun kuna, odnosno 8,9 milijuna eura). Preostalih 37 komponenti projekata se uglavnom odnose na projektiranje.

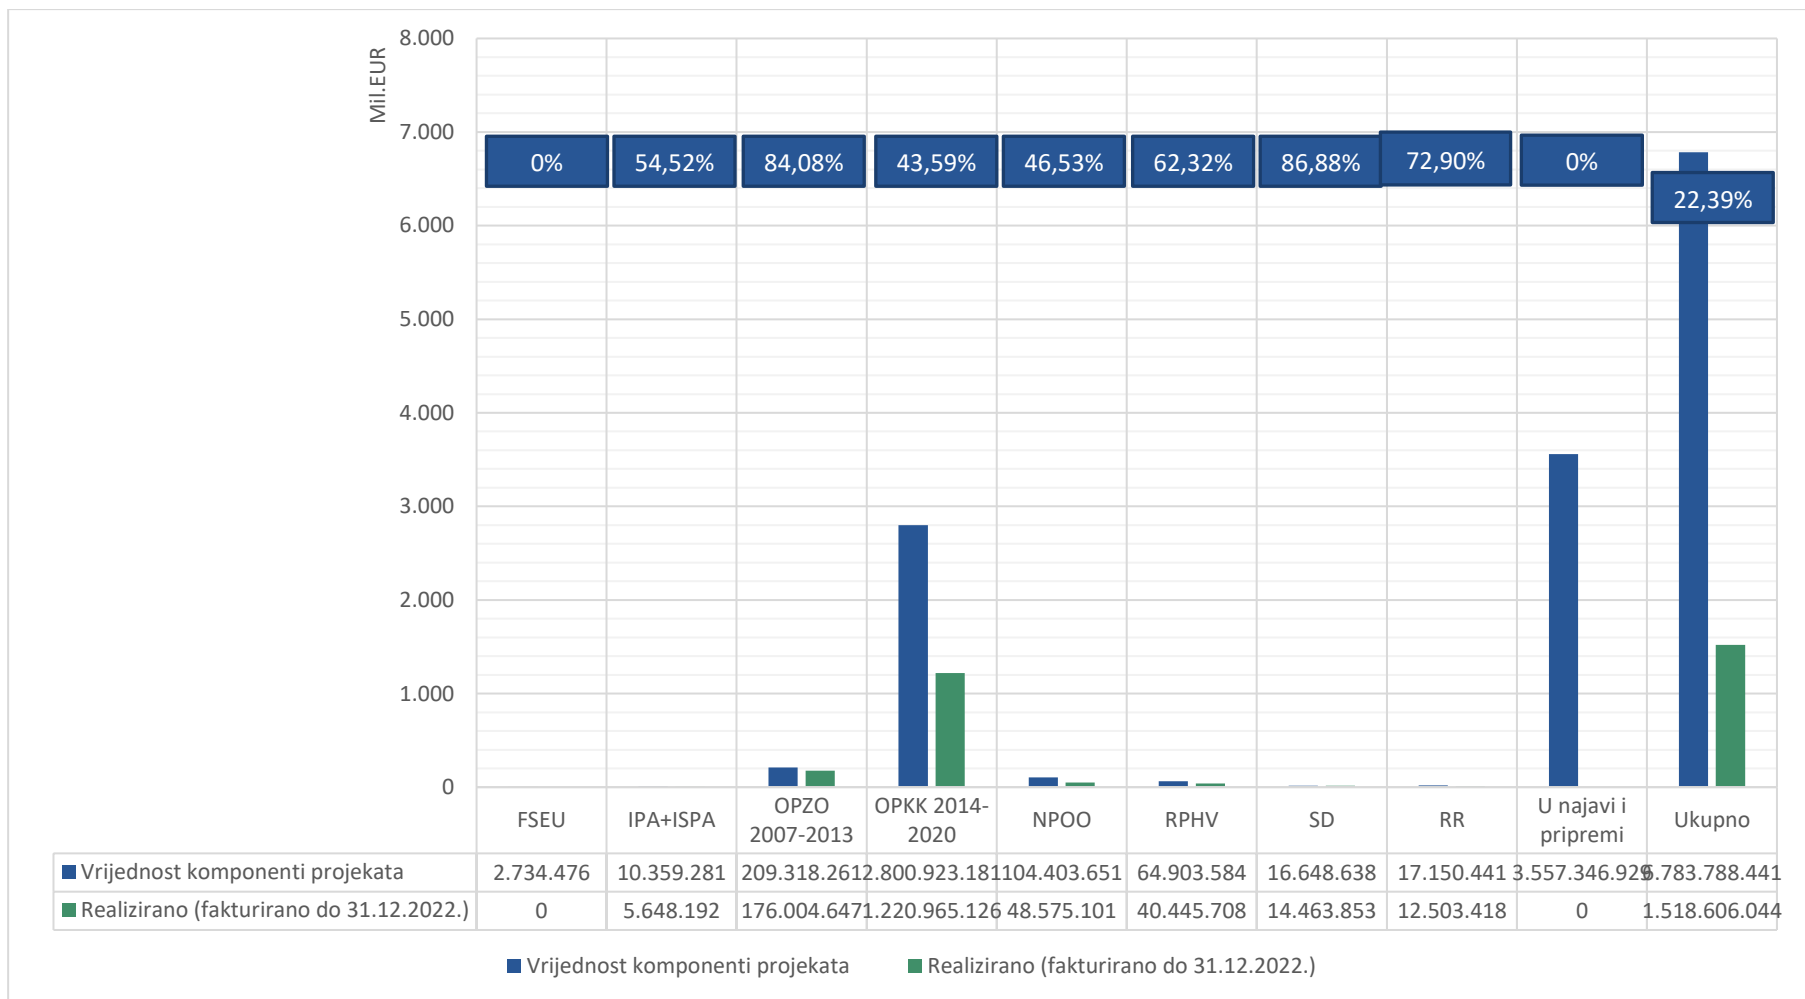

2.1.3 Projekti potpore razvoju vodnocomunalnih usluga

Kako su projekti potpore razvoju vodnocomunalnih usluga koji se provode na nacionalnoj razini vezani uz uspostavu uslužnih područja, njihova realizacija još uvijek nije započela. Riječ je o projektima unaprjeđenja poslovanja isporučitelja vodnih usluga kako slijedi:

1. Projekti poticanja energetske učinkovitosti:
 - povezivanje u informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), odnosno uvođenje certificiranih sustava gospodarenja energijom (kao ISO 50001) (vidjeti poglavlje 6.3.4. mjere MEN - 7 / MEN - 8),
 - sredstva za pripremu aplikacija za korištenje dodatnih sredstava iz ove namjene (mjera MEN - 31),
2. Projekt uspostave kibernetičke sigurnosti - osiguranje sredstava za pripremu tehničke dokumentacije.

Projekt (prema Programu 2021.)	Financijski paket	Stanje realizacije projekta prema prethodnom izvješću		Stanje realizacije Projekta	
		uslužno područje	stanje	uslužno područje	stanje
Projekt poticanja energetske učinkovitosti	-			1 - 41	-
Projekt uspostave kibernetičke sigurnosti	-			1 - 41	-
-	projekt se ne provodi				

2.2 Pregled stanja indikatora provedbe Programa 2021. (pokazatelji ishoda)

Pregled stanja indikatora provedbe prati sistematizaciju Programa 2021., odnosno daje se na razini Republike Hrvatske i uslužnih područja (u nastavku teksta), te isporučitelja vodnih usluga ili projekata (u Prilogu izvješća). Prema definicijama interventne logike „aktivnost - mjera - cilj“ riječ je o pokazateljima ishoda odnosno pokazateljima učinka. Doprinos svake komponente projekta povećanju indikatora uzima se u obzir tek nakon što je ishođena uporabna dozvola, odnosno smatra se da završetak realizacije (završeno) potkomponente ne doprinosi promjeni vrijednosti ovih indikatora. U slučajevima kada je riječ o broju priključenih stanovnika na sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje na razini polugodišnjeg izvješća daju se procijenjeni podaci, koji će se provjeriti i po potrebi korigirati u suradnji s isporučiteljima vodnih usluga sukladno situaciji na terenu najmanje na 2-godišnjoj razini (na kraju kalendarske godine), a po mogućnosti i godišnje.

U izvještajnom razdoblju nije došlo do promjene indikatora provedbe Programa 2021.

2.2.1 Ciljevi vezani uz reformu vodnocomunalnog sektora

Reforma vodnocomunalnog sektora obuhvaća međusobno usklađeni proces donošenja zakonodavnog okvira i provedbe investicija kroz Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda i Program razvoja javne vodoopskrbe. Nastavak te daljnji koraci u provođenju reforme vodnocomunalnog sektora, odnosno postizanja ciljeva vezani za reformu komunalnog sektora određeni su samo na razini Republike Hrvatske i prate se na osnovu sljedećih indikatora:

R.br	Cilj	Indikator uspješnosti postizanja ciljeva	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	
			broj	broj	broj	broj	broj	%
1	Do kraja 2022., doneseni podzakonski propisi: Uredba o uslužnim područjima, Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga te Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga čime će se provesti reforma javnih isporučitelja vodnih usluga	-	-	4	-	-	-	25 %
2	Do kraja 2023., integracija postojećih 200 javnih isporučitelja na 41 uslužnom području po principu jedan isporučitelj vodnih usluga po uslužnom području	-	-	ispunjen				
3	Uspostavljena uslužna područja	broj uslužnih područja	0	41			0	0 %
4	Prihvaćena preporuka Strategije upravljanja vodama o jedinstvenom obavljanju usluge vodoopskrbe i odvodnje	broj uslužnih područja	31	41			31	75,6 %
5	ispoštovano načelo jedan isporučitelj na uslužnom području	broj uslužnih područja	11	41			11	26,8 %

2.2.2 Ciljevi postizanja standarda obavljanja usluge javne vodoopskrbe, odnosno opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju

Ciljevi postizanja standarda obavljanja usluge javne vodoopskrbe su određeni na razini projekta i Republike Hrvatske u cjelini. Napominje se da su projekti u daleko najvećem broju slučajeva planirani na način da, u različitom omjeru, zadovoljavaju sva tri navedena cilja. Isti zaključak se može izvesti i kada je riječ o većini zahvata koji se planiraju realizirati. Naime, određeni zahvati u prostoru omogućavaju i povećanje kapaciteta sustava i smanjenje gubitaka i smanjenje rizika po zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju. Očekivane učinke provedenih projekata moguće je procijeniti budući da je poznat njihov prostorni obuhvat.

R.br	Cilj	Indikator uspješnosti postizanja ciljeva	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno	% u odnosu na ciljnu vrijednost
1	Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji	ima pristup vodi za ljudsku potrošnju prema procijenjenom broju stanovnika iz 2018.	%	93,4 %	98 %		93,4 %	
			broj	3.808.525	3.996.101		3.808.525	95,3 %

R.br	Cilj	Indikator uspješnosti postizanja ciljeva		Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno	% u odnosu na ciljanu vrijednost
2	Smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode namijenjene ljudskoj potrošnji	broj stanovnika s dostupnom zdravstveno ispravnom vodom	%	58 %	98 %			58 %	
			broj	2.348.585	3.996.101			2.348.585	58,8 %
3	Smanjenje gubitaka iz vodoopskrbnih sustava - smanjenje opterećenja voda zahvaćanjem vode namijenjene za ljudsku potrošnju	Gubici u sustavima javne odvodnje - prosjek za Republiku Hrvatsku	%	45 % - 48 %	< 20 %			45 % - 48 %	

Navedene ciljane vrijednosti za Republiku Hrvatsku se oslanjaju na pretpostavku da će se realizacijom projekata omogućiti priključenje 75 % nepriključenih stanovnika koji gravitiraju javnim vodoopskrbnim sustavima i lokalnim vodovodima, te 50 % stanovnika s individualnom vodoopskrbom, te će se, ukoliko ne postoje točni podaci koji proizlaze iz tehničke dokumentacije i snimka izvedenog stanja, odnosno podaci potvrđeni od strane isporučitelja vodnih usluga, indikator proračunavati prema prethodno navedenim pretpostavkama.

Ciljevi postizanja standarda javne vodoopskrbe - početne i ciljane vrijednosti pokazatelja po uslužnim područjima:


Uslužno područje	Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji					Smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode					Smanjenje gubitaka iz sustava javne vodoopskrbe						
	stanovnici koji imaju pristup vodi					stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi					omjer između zahvaćene i isporučene količine vode						
	početna	ciljana	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	ukupno postignuta vrijednost indikatora	početna	ciljana	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	ukupno postignuta vrijednost indikatora	početna*	ciljana	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	ukupno postignuta vrijednost indikatora		
	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	broj	broj	%	%	%	%	%	%
1	109.191	109.451			109.191	99,8 %	109.191	109.451			109.191	99,8 %	31 %	20 %			31 %
2	157.398	164.343			157.398	95,8 %	155.562	164.343			155.562	94,7 %	37 % - 51 %	20 %			37 % - 51 %
3	67.918	75.358			67.918	90,1 %	67.770	75.358			67.770	89,9 %	12 % - 34 %	20 %			12 % - 34 %
4	110.646	121.776			110.646	90,9 %	84.559	121.776			84.559	69,4 %	9 % - 48 %	20 %			9 % - 48 %
5	73.925	74.874			73.925	98,7 %	73.843	74.874			73.843	98,6 %	20 % - 34 %	20 %			20 % - 34 %
6	66.536	68.435			66.536	97,2 %	11.374	68.435			11.374	16,6 %	36 % - 55 %	20 %			36 % - 55 %
7	19.411	19.914			19.411	97,5 %	9.112	19.914			9.112	45,8 %	48 %	20 %			48 %
8	182.657	183.865			182.657	99,3 %	39.650	183.865			39.650	21,6 %	17 % - 38 %	20 %			17 % - 38 %
9	103.540	122.150			103.540	84,8 %	97.313	122.150			97.313	79,7 %	19 % - 43 %	20 %			19 % - 43 %
10	49.973	49.981			49.973	100,0 %	49.973	49.981			49.973	100,0 %	34 % - 45 %	20 %			34 % - 45 %
11	820.322	869.307			820.322	94,4 %	529.636	869.307			529.636	60,9 %	45 % - 55 %	20 %			45 % - 55 %
12	68.510	72.072			68.510	95,1 %	67.479	72.072			67.479	93,6 %	15 % - 31 %	20 %			15 % - 31 %

Uslužno područje	Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji stanovnici koji imaju pristup vodi						Smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi						Smanjenje gubitaka iz sustava javne vodoopskrbe omjer između zahvaćene i isporučene količine vode					
	početna		ciljana		ukupno postignuta vrijednost indikatora		početna		ciljana		ukupno postignuta vrijednost indikatora		početna*		ciljana		ukupno postignuta vrijednost indikatora	
	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	broj	broj	%	%	%	%	%	%	%
	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje	prethodno izvješće	izvještajno razdoblje
13	91.259	101.358			91.259	90,0 %	12.982	101.358			12.982	12,8 %	26 % - 43 %	20 %			26 % - 43 %	
14	108.921	114.013			108.921	95,5 %	90.046	114.013			90.046	79,0 %	43 % - 71 %	20 %			43 % - 71 %	
15	33.549	40.188			33.549	83,5 %	33.206	40.188			33.206	82,6 %	49 % - 81 %	20 %			49 % - 81 %	
16	48.458	49.621			48.458	97,7 %	47.675	49.621			47.675	96,1 %	52 %	20 %			52 %	
17	47.970	50.158			47.970	95,6 %	47.804	50.158			47.804	95,3 %	1 % - 68 %	20 %			1 % - 68 %	
18	61.371	64.724			61.371	94,8 %	59.501	64.724			59.501	91,9 %	40 % - 47 %	20 %			40 % - 47 %	
19	29.029	34.853			29.029	83,3 %		34.853				0,0 %	46 % - 20 %	20 %			46 % - 20 %	
20	92.808	98.670			92.808	94,1 %	18.842	98.670			18.842	19,1 %	36 % - 61 %	20 %			36 % - 61 %	
21	110.644	110.762			110.644	99,9 %	15.351	110.762			15.351	13,9 %	22 % - 51 %	20 %			22 % - 51 %	
22	41.655	41.684			41.655	99,9 %		41.684				0,0 %	26 % - 42 %	20 %			26 % - 42 %	
23	97.249	99.858			97.249	97,4 %	97.249	99.858			97.249	97,4 %	24 %	20 %			24 %	
24	105.786	107.640			105.786	98,3 %	105.786	107.640			105.786	98,3 %	20 % - 26 %	20 %			20 % - 26 %	
25	219.925	222.740			219.925	98,7 %	216.046	222.740			216.046	97,0 %	23 % - 69 %	20 %			23 % - 69 %	
26	29.629	31.091			29.629	95,3 %	13.301	31.091			13.301	42,8 %	23 %	20 %			23 %	
27	18.810	18.868			18.810	99,7 %	18.810	18.868			18.810	99,7 %	45 %	20 %			45 %	
28	24.010	25.344			24.010	94,7 %	17.925	25.344			17.925	70,7 %	23 % - 62 %	20 %			23 % - 62 %	
29	33.031	34.916			33.031	94,6 %	32.548	34.916			32.548	93,2 %	25 % - 90 %	20 %			25 % - 90 %	
30	121.109	128.574			121.109	94,2 %	183	128.574			183	0,1 %	45 % - 89 %	20 %			45 % - 89 %	
31	24.064	27.499			24.064	87,5 %	3.051	27.499			3.051	11,1 %	45 % - 73 %	20 %			45 % - 73 %	
32	98.781	101.786			98.781	97,0 %	87.055	101.786			87.055	85,5 %	56 % - 72 %	20 %			56 % - 72 %	
33	275.259	286.126			275.259	96,2 %	8.369	286.126			8.369	2,9 %	56 % - 60 %	20 %			56 % - 60 %	
34	44.809	45.459			44.809	98,6 %	43.103	45.459			43.103	94,8 %	43 % - 70 %	20 %			43 % - 70 %	
35	22.007	22.770			22.007	96,6 %	22.007	22.770			22.007	96,6 %	15 %	15 %			15 %	
36	27.770	29.131			27.770	95,3 %	13.581	29.131			13.581	46,6 %	17 % - 35 %	20 %			17 % - 35 %	
37	48.102	49.759			48.102	96,7 %	14.646	49.759			14.646	29,4 %	15 % - 75 %	20 %			15 % - 75 %	
38	40.513	40.865			40.513	99,1 %	9.105	40.865			9.105	22,3 %	25 % - 81 %	20 %			25 % - 81 %	
39	21.889	23.671			21.889	92,5 %	8.584	23.671			8.584	36,3 %	22 % - 59 %	20 %			22 % - 59 %	
40	52.055	54.127			52.055	96,2 %	8.331	54.127			8.331	15,4 %	22 %	20 %			22 %	
41	8.036	8.324			8.036	96,5 %	8.036	8.324			8.036	96,5 %	28 %	20 %			28 %	
*	Indikativna vrijednost prema izvještajima javnih isporučitelja za 2019. godinu, preciznija početna vrijednost pokazatelja će se utvrditi pri izradi detaljne tehničke dokumentacije																	


Komentar: S obzirom na to da je riječ o 1. Izvješću te da u izvještajnom razdoblju nije završen niti jedna komponenta projekta ukupno postignuta vrijednost sva 3 indikatora postizanja ciljeva standarda javne vodoopskrbe jednaka su početnim vrijednostima indikatora kako je to navedeno u Programu 2021.

Uspoređujući postignutu vrijednost indikatora (u ovom 1. Izvješću postignuta vrijednost indikatora je jednaka početnoj vrijednosti indikatora, generalno se može zaključiti sljedeće:

- Indikator „dostupnost vode za ljudsku potrošnju“ je na vrlo visokoj razini ispunjenosti, odnosno ciljani indikator je postignut na razini od oko 95 %. Na uslužnom području 10 indikator je u potpunosti ispunjen, dok se vrlo visoki stupanj ispunjenosti indikatora dostupnosti vode za ljudsku potrošnju (veći od 95 %) bilježi na 26 uslužnih područja. Na 4 uslužna područja (9, 15, 19 i 31) razina ispunjenosti indikatora je manja od 90 %, ali se ne spušta ispod razine od 83,5 %.

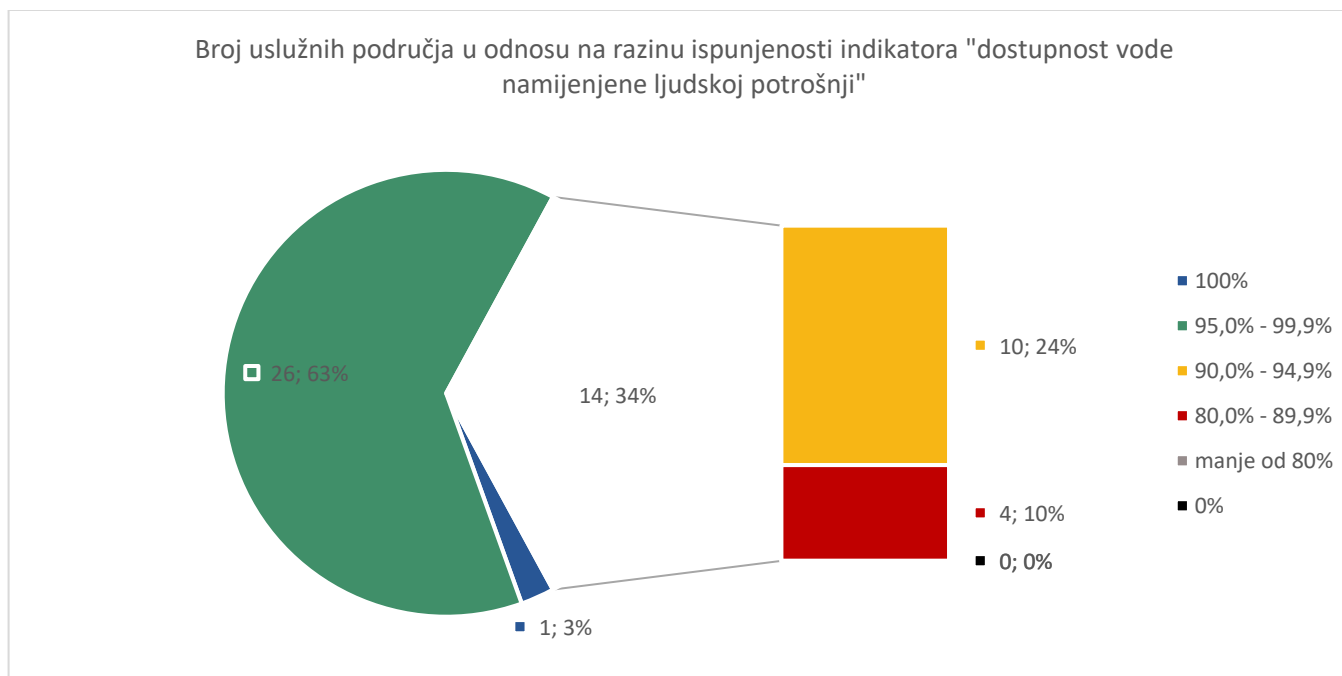

- Indikator „smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode“ je na značajno nižoj razini ispunjenosti i u prosjeku iznosi 58,8 %. Na uslužnom području 10 indikator je u potpunosti ispunjen dok se vrlo visoki stupanj ispunjenosti indikatora dostupnosti vode za ljudsku potrošnju (veći od 80 %) bilježi na 18 uslužnih područja. Posebno se naglašava da je na 4 uslužna područja razina ispunjenosti indikatora iznimno niska i to 0 % (uslužna područja 19 i 22), odnosno uslužna područja 30 i 33 (0,1 % i 2,9 % respektivno).

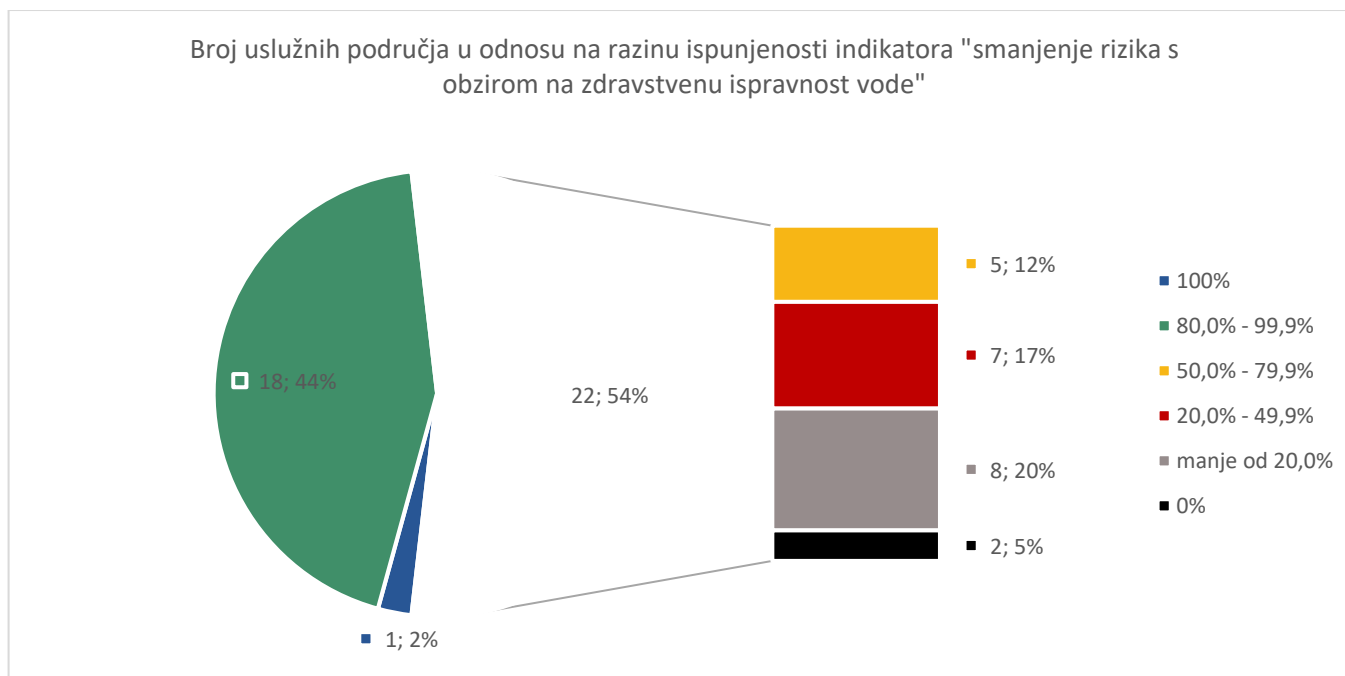

- Na uslužnom području 10 potrebna ulaganja je potrebno usmjeriti na smanjenje gubitaka s 34 % - 45 % na ciljanih 20 %.

2.2.3 Ciljevi postizanja standarda javne odvodnje

Ciljevi postizanja standarda javne odvodnje u Programu 2021. odnose se isključivo na aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES.

R.br	Cilj	Indikator uspješnosti postizanja ciljeva	Broj aglomeracija	Ukupno opterećenje	Početa vrijednost	Ciljana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno	% u odnosu na ciljnu vrijednost
1	Priključenost na sustav javne odvodnje	usklađeno (ES)	15	243.908	242.769	242.769	-	-	242.769	100 %
		uvjetno usklađeno (ES)	7	269.242	249.498	263.857			249.498	95 %
		treba uskladiti (ES)	228	4.498.248	2.921.228	4.408.283			2.921.228	66 %
2	Usklađenost s obzirom na potrebnu razinu pročišćavanja	Broj aglomeracija (broj)			45	260			45	17 %
		Opterećenje priključeno na UPOV-e zahtijevanog stupnja (ES)			242.769	4.914.909			242.769	5 %

Indikator „priključenost na sustav javne odvodnje“ se prati u odnosu na ocjenu postojećeg stanja usklađenosti gdje se:

- usklađenim sustavom smatra sustav na kome je priključeno više od 98 % opterećenja na zahtijevani stupanj pročišćavanja
- uvjetno usklađenim sustavom smatra sustav na kome je priključeno između 90 % i 98 % opterećenja na zahtijevani sustav pročišćavanja


sve ostalo se smatra neusklađenim sustavom.

Komentar: S obzirom na to da je riječ o 1. Izvješću te da u izvještajnom razdoblju nije završen niti jedna komponenta projekta ukupno postignuta vrijednost oba indikatora postizanja ciljeva standarda javne odvodnje jednaka su početnim vrijednostima indikatora kako je to navedeno u Programu 2021.

Uslužno područje	Početna vrijednost Priključeno opterećenje (ES)			Ciljano priključeno opterećenje (ES)			Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću (ES)			Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju (ES)			Ukupno postignuta vrijednost indikatora (ukupno postignuta usklađenost)				
	usklađeno	neusklađeno	uvjetno	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	ukupno ciljana vrijednost - opterećenje	postignuta vrijednost prema prethodnom izvješću	ukupno postignuta vrijednost u izvještajnom razdoblju	postignuta vrijednost indikatora na kraju izvještajnog razdoblja	
	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	%
1	3.087	65.983		3.087	140.716	0							143.803			3.087	2,15 %
2		125.055		0	186.677	0							186.677			0	0,00 %
3		62.349		0	82.197	0							82.197			0	0,00 %
4		73.549		0	98.499	0							98.499			0	0,00 %
5		38.093	4.875	0	58.353	4.963							63.316			0	0,00 %
6		37.641		0	59.641	0							59.641			0	0,00 %
7		10.907		0	16.873	0							16.873			0	0,00 %
8	8.250	174.194		8.250	212.572	0							220.822			8.250	3,74 %
9		35.028		0	68.289	0							68.289			0	0,00 %
10		30.726		0	52.530	0							52.530			0	0,00 %
11		872.710		0	998.352	0							998.352			0	0,00 %
12		48.048		0	67.197	0							67.197			0	0,00 %
13		46.027		0	89.553	0							89.553			0	0,00 %
14		46.340		0	79.611	0							79.611			0	0,00 %
15		17.087	2.027	0	34.062	2.084							36.146			0	0,00 %
16		31.084		0	53.827	0							53.827			0	0,00 %
17		31.246		0	46.252	0							46.252			0	0,00 %
18		45.173		0	63.312	0							63.312			0	0,00 %
19		16.578	2.294	0	32.563	2.346							34.910			0	0,00 %
20		60.635		0	106.531	0							106.531			0	0,00 %
21		56.568		0	128.914	0							128.914			0	0,00 %
22		27.880	8.101	0	36.673	8.586							45.258			0	0,00 %
23	135.933	11.644	100.893	135.933	15.411	105.671							257.015			135.933	52,89 %
24	11.843	63.176	79.874	11.843	99.497	86.626							197.967			11.843	5,98 %
25		166.891		0	236.696	0							236.696			0	0,00 %
26		68.758	22.286	0	102.903	23.231							126.134			0	0,00 %
27		40.371		0	53.561	0							53.561			0	0,00 %
28	11.750	53.744	3.830	11.750	85.093	3.892							100.735			11.750	11,66 %

Uslužno područje	Početna vrijednost Priključeno opterećenje (ES)			Ciljano priključeno opterećenje (ES)			Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću (ES)			Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju (ES)			Ukupno postignuta vrijednost indikatora (ukupno postignuta usklađenost)				
	usklađeno	neusklađeno	uvjetno	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	ukupno ciljana vrijednost - opterećenje	postignuta vrijednost prema prethodnom izvješću	ukupno postignuta vrijednost u izvještajnom razdoblju	postignuta vrijednost indikatora na kraju izvještajnog razdoblja	
	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	%
29		10.258		0	18.757	0							18.757			0	0,00 %
30		87.682		0	242.207	0							242.207			0	0,00 %
31		31.779		0	58.540	0							58.540			0	0,00 %
32		72.201		0	150.947	0							150.947			0	0,00 %
33		205.004		0	337.956	0							337.956			0	0,00 %
34		12.815		0	31.002	0							31.002			0	0,00 %
35		11.745		0	24.466	0							24.466			0	0,00 %
36	3.742	19.395	23.189	3.742	35.122	24.187							63.052			3.742	5,93 %
37	68.164	3.560	2.125	68.164	24.723	2.271							95.158			68.164	71,63 %
38		34.549		0	54.058	0							54.058			0	0,00 %
39		7.937		0	42.611	0							42.611			0	0,00 %
40		64.554		0	78.577	0							78.577			0	0,00 %
41		2.264		0	2.959	0							2.959			0	0,00 %
RH	242.769	2.921.228	249.494	242.769	4.408.283	263.857							4.914.909			242.769	4,94 %

Postignuta vrijednost indikatora „priključenost na sustav javne odvodnje“ kojim se mjeri ukupna potpuna uskladenost s zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda je iznimno niska i na razini Republike Hrvatske iznosi oko 5 %. Naime na čak 34 uslužna područja usklađenost je 0 %. Najpovoljnija situacija je na uslužnim područjima 37 i 23 gdje je oko 71,2 %, odnosno 52,9 % stanovnika priključeno na odgovarajući sustav i odgovarajuću razinu pročišćavanja otpadnih voda.

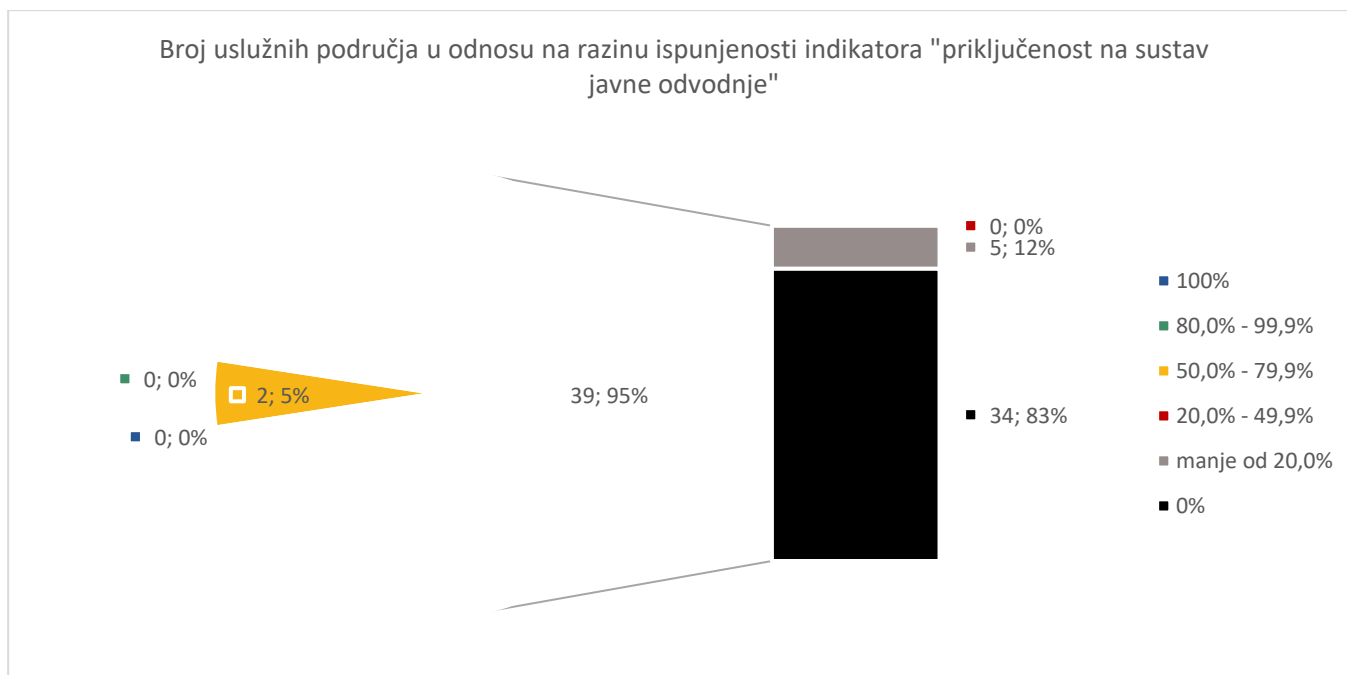


Usklađenost s obzirom na indikator „potrebna razina pročišćavanja“ se prati u odnosu na ukupan broj aglomeracija na kojima je uspostavljen zahtijevani stupanj pročišćavanja.

Uslužno područje	Početna vrijednost usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Ciljana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	
	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	%
1	4	7	11			4	36,4 %
2	0	8	8			0	0,0 %
3	1	1	2			1	50,0 %
4	5	4	9			5	55,6 %
5	1	6	7			1	14,3 %
6	1	4	5			1	20,0 %
7	1	1	2			1	50,0 %
8	2	5	7			2	28,6 %

Uslužno područje	Početna vrijednost usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Ciljana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	
	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	Broj aglomeracija	%
9	1	6	7			1	14,3 %
10	0	1	1			0	0,0 %
11	0	6	6			0	0,0 %
12	0	2	2			0	0,0 %
13	1	11	12			1	8,3 %
14	2	3	5			2	40,0 %
15	0	5	5			0	0,0 %
16	1	1	2			1	50,0 %
17	0	5	5			0	0,0 %
18	1	5	6			1	16,7 %
19	0	5	5			0	0,0 %
20	1	8	9			1	11,1 %
21	4	12	16			4	25,0 %
22	1	1	2			1	50,0 %
23	4	7	11			4	36,4 %
24	0	8	8			0	0,0 %
25	1	6	7			1	14,3 %
26	0	10	10			0	0,0 %
27	1	3	4			1	25,0 %
28	1	8	9			1	11,1 %
29	3	0	3			3	100,0 %
30	1	11	12			1	8,3 %
31	1	2	3			1	33,3 %
32	2	7	9			2	22,2 %
33	0	6	6			0	0,0 %
34	1	2	3			1	33,3 %
35	0	3	3			0	0,0 %
36	1	9	10			1	10,0 %
37	0	9	9			0	0,0 %
38	1	5	6			1	16,7 %
39	0	8	8			0	0,0 %
40	1	3	4			1	25,0 %
41	0	1	1			0	0,0 %
Ukupno	45	215	260			45	17,3 %


Zahtijevanu, odnosno „potrebnu razinu pročišćavanja“ ima oko 17 % aglomeracija u Republici Hrvatskoj. Čak 14 uslužnih područja nema niti jednu aglomeraciju koja je s potrebnom razinom pročišćavanja. Najpovoljnija situacija je na uslužnom području 29 na kojem su sve 3 aglomeracije u potpunosti usklađene s obzirom na potreban stupanj pročišćavanja, ali je na tom području potrebno investirati u sustave prikupljanja komunalnih otpadnih voda. Na 5 uslužnih područja (3, 4, 7, 16 i 22) preko 50 % aglomeracija ima zahtijevanu razinu pročišćavanja.

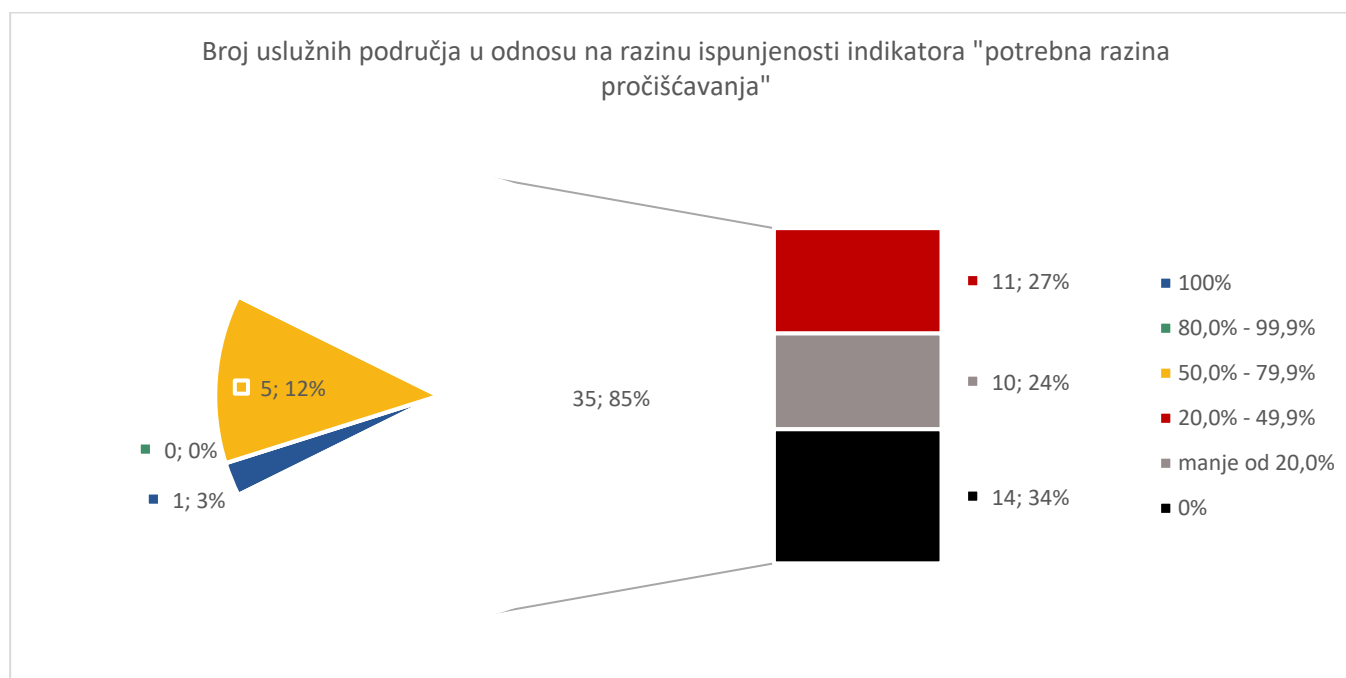

3 ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Na osnovu prikupljeni podataka o realizaciji projekata iz Programa 2021. može se zaključiti sljedeće:

1. Sukladno obrazloženju i zaključku iz 1. Izvješća, a kako bi se uspostavila jasna veza između Programa 2021. i Izvješća, podaci vezani uz razvoj sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u 1. i 2. Izvješću će pratiti podatke iz Programa 2021. Nadalje, podaci u 3. Izvješću će se usuglasiti s podacima za novi ciklus izvješćivanja prema članku 17. Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.
2. I dalje se uočavaju bitne razlike u načinu prikupljanja podataka o provedbi i uspješnosti projekata ovisno o financijskom paketu kroz koji se svaki projekt, odnosno komponenta projekta financira.
3. Doprinos svake komponente projekta povećanju indikatora uzima se u obzir tek nakon što je ishođena uporabna dozvola (kraj realizacije), odnosno smatra se da završetak realizacije potkomponente ne doprinosi promjeni vrijednosti indikatora. U slučajevima kada je riječ o broju priključenih stanovnika na sustave javne vodoopskrbe i javne odvodnje na razini polugodišnjeg izvješća daju se procijenjeni podaci, koji se provjeravaju i po potrebi korigiraju u suradnji s isporučiteljima vodnih usluga sukladno situaciji na terenu najmanje na 2-godišnjoj razini (na kraju kalendarske godine), a po mogućnosti i godišnje. Takve korekcije će posebno biti naglašene i praćene kroz sukcesivna Izvješća. S obzirom na navedeno U izvještajnom razdoblju nije došlo do promjene indikatora provedbe Programa 2021.
4. Uočava se intenziviranje dinamike provedbe projekata osobito u dijelu Programa 2021. koji se odnosi na razvoj infrastrukture javne vodoopskrbe jer se trenutačno u različitim fazama realizacije nalazi preko 1.000 komponenti na 140 projekata predviđenih Programom 2021. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje značajno je porastao i broj završenih komponenti / podkomponenti vodoopskrbnih projekata. Nešto manje je izražena dinamika aktivnosti na projektima javne odvodnje, što je u skladu s očekivanjima. Naime aktivnosti na razvoju javne odvodnje su započelo znatno ranije u odnosu na razvoj javne vodoopskrbe.
5. Uzimajući u obzir isključivo financijske pakete koji su trenutačno aktivni (Fond solidarnosti Europske unije, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020., Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. i redoviti program Hrvatskih voda, realizacija komponenti projekata odvodnje (aglomeracija) iznosi 44 % i nešto je bolja od realizacije komponenti projekata vodoopskrbe koja iznosi 38 %. Prema podacima, u javnoj vodoopskrbi se najbrže realiziraju projekti Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, a u javnoj odvodnji najefikasnije se realiziraju projekti koji se financiraju kroz redoviti program Hrvatskih voda. Preko 85 % u vrijednosti projekta, odnosno gotovo 89 % od ukupno realiziranih sredstava financirano je kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020.

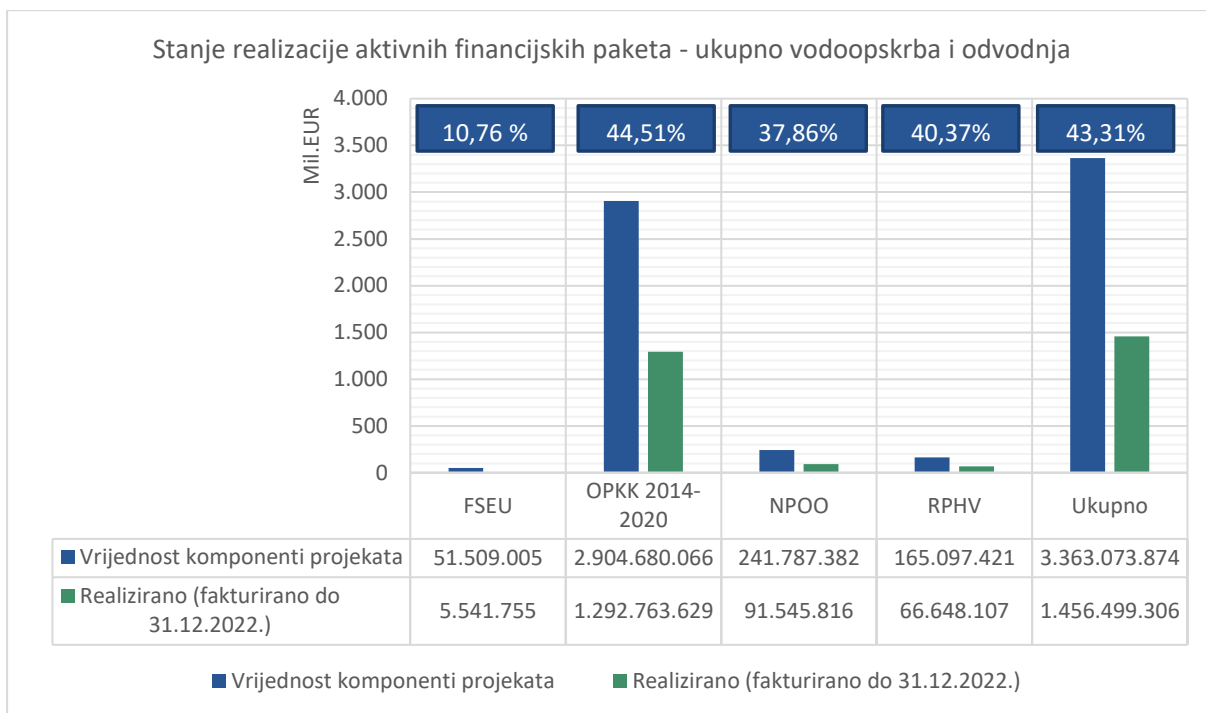

6. U izvještajnom razdoblju nije okončan niti jedan projekt. Ostvarene vrijednosti indikatora postizanja ciljeva standarda javne vodoopskrbe i odvodnje jednake su početnim vrijednostima indikatora kako je to navedeno u Programu 2021.
7. Napominje se da niti u ovom izvještajnom razdoblju nisu prikupljeni podaci o ulaganjima javnih isporučitelja vodnih usluga u razvoj vodonokomunalne infrastrukture. Razgovori s pojedinim isporučiteljima u smislu unaprjeđenja praćenja i sistematizacije aktivnosti koje provode su započeli i planiraju se nastaviti u narednom izvještajnom razdoblju. Unaprjeđenje sustava praćenja podataka je neophodno kako bi se omogućilo kompletiranje Izvješća o realizaciji programa. S obzirom na izuzetnu angažiranost javnih isporučitelja na provedbi aktivnih projekata, projekta ugradnje vodomjera na vodoozavatima, provedbi aktivnosti na smanjenju gubitaka, prilagodbi koji proizlaze iz reforme vodonokomunalnog gospodarstva, ne očekuje se da će se realizacija unaprjeđenja sustava praćenja provedbe projekata provesti u naredna 2 do 3 izvještajna razdoblja.
8. Veliki broj komponenti projekta čini ovakvu vrstu izvješća nepreglednim pa treba razmisliti o mogućnosti da se format izvješća promijeni na način da se pregled stanja realizacije pojedinačnih komponenti projekta izdvoji iz pisanog dijela izvješća, te vodi kao poseban tablični pregled uz svako izvješće na mrežnoj stranici Hrvatskih voda. U tom slučaju potrebno je prilagoditi sustav prikupljanja i sistematizacije podataka.

4 PRILOZI

4.1 Popis Projekata prema Planu 2021.

4.1.1 Javna vodoopskrba

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
1	72	MEDI MURSKE VODE d.o.o. Čakovec	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 1 na VP JIVU MEDI MURSKE VODE d.o.o. Čakovec	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEDI MURSKE VODE d.o.o. Čakovec
2	74	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec
	143	VARKOM d.d. Varaždin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin
3	75	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
	35	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci
4	39	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar
	16	KAPELAKOM d.o.o. Kapela	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela
	73	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac
	40	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma
	45	VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica
	34	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar
	139	VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac
	36	VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje
5	78	KOMRAD d.o.o. Slatina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina
	77	VIRKOM d.o.o. Virovitica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica
	79	VODA d.o.o. Orahovica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica
	76	VODAKOM d.o.o. Pitomača	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)		
6	12	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo		
	80	NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice		
	81	VODORAD d.o.o. Đurđenovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac		
	7	7	84	BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir
	8	89	DVORAC d.o.o. Valpovo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo	
	83	HIDROBEL d.o.o. Belišće	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće		
	82	MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac		
	135	UREDOST d.o.o. Čepin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU UREDOST d.o.o. Čepin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDOST d.o.o. Čepin		
	144	VODOOPSKRBA d.o.o. Darda	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda		
	87	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek		
	9	2	HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	
	3	KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina		
	136	VIOP d.o.o. Pregrada	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada		
	1	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok		
10	4	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić		
137	VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra			
11	46	VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko		
33	VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac			
145	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb			

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
	17	VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina
12	6	VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica
	32	VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina
13	149	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 13 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma
	5	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb
14	9	KOMUNALAC d.o.o. Slunj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj
	11	KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa
	24	KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj
	146	VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić
	29	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac
	22	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin
	44	VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić
	151	VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja
15	18	JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica
	50	KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor
	42	PRIVREDA d.o.o. Petrinja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja
	138	SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak
	43	VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko
	47	VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
	148	VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja
16	25	SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak
17	15	JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac
	20	LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani
	41	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina
	14	VODOOPSRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU VODOOPSRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOOPSRBA d.o.o. Hrvatska Dubica
	21	VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska
18	28	TEKIJA d.o.o. Požega	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na VP JIVU TEKIJIA d.o.o. Požega	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKIJIA d.o.o. Požega
	31	VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac
19	37	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška
20	131	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo
	26	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod
21	10	DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci
	38	KOMUNALAC d.o.o. Županja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja
	13	KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja
	49	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci
22	90	KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok
	88	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar
23	57	ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
24	68	VODOVOD d.o.o Pula	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o Pula
	67	VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin
25	61	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
	53	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice
	56	KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar
	58	LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići
	65	VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko
26	59	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk
	62	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres
27	70	VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski
28	51	CRNO VRILO d.o.o. Karlobag	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o. Karlobag	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o. Karlobag
	54	KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja
	112	KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag
	63	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj
	110	VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana
	69	VRELO d.o.o. Rab	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab
29	52	KAPLJA d.o.o. Lovinac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac
	140	KOMUNALAC d.o.o. Otočac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac
	55	KRALJEVAC d.o.o. Udbina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
	27	SPELEKOM d.o.o. Rakovica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica
	60	USLUGA d.o.o. Gospić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić
	64	VISOČICA d.o.o. Donji Lapac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU VISOČICA d.o.o. Donji Lapac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VISOČICA d.o.o. Donji Lapac
	66	VODOVOD d.o.o. Brinje	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje
	48	VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica
30	125	GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac
	105	KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali
	142	OTOK UGLJAN d.o.o. Preko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko
	129	SABUŠA d.o.o. Kukljica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica
	111	VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir
	123	VODOVOD d.o.o. Zadar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar
31	141	KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru
	116	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac
32	91	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin
	96	RAD d.o.o. Drniš	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš
	104	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split
	98	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik
33	150	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split
	99	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
34	106	KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo
	97	USLUGA d.o.o. Vrlika	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrlika	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrlika
35	108	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj
	124	VODOVOD d.o.o. Omiš	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš
36	121	HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa
	126	VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar
37	117	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža
	102	VODOVOD d.o.o. Makarska	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska
	147	VODOVOD d.o.o. Omiš	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš
	122	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski
38	92	IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče
	128	KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac
	94	METKOVIĆ d.o.o. Metković	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković
	114	NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula
	109	VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen
	120	ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište
39	127	IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj
	113	NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula
	115	VODA MLJET d.o.o. Babino Polje	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje

Uslužno područje	Redni broj projekta	Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe	Naziv projekta	Naziv projekta (skraćeni)
	100	VODOVOD d.o.o. Blato	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato
	119	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik
	130	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić
40	118	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik
41	93	KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	Unaprjeđenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 41 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 41 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi
28		VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. Senj	Razvoj alternativnog sustava opskrbe regionalnog vodovoda za UP 28	Razvoj alternativnog sustava opskrbe regionalnog vodovoda za UP 28

4.1.2 Javna odvodnja

Aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje	Naziv aglomeracije	ID aglomeracije
6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag	Buje	3024
	Novigrad Istarski	1076
	Umag	1156
ALBANEŽ d.o.o., Pomer	Banjole	1001
	Premantura	1101
	Medulin	1066
BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir	Kneževi Vinogradi	7009
	Beli Manastir	7003
CRNO VRILO d.o.o., Karlobag	Karlobag	1036
DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar	Daruvar	6012
DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci	Rajevo Selo	7040
DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Slano	Slano	1129
DVORAC d.o.o., Valpovo	Koška	101050
	Petrijevci	7013
ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo	Punitovci	101039
	Semeljci	101043
	Đakovo	6020
GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac	Gračac	2045
HIDROBEL d.o.o., Belišće	Belišće	7004
HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli	Hum na Sutli	4036
HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa	Jelsa-Vrboska	101207
	Stari Grad	101117
IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec	Ivanec	5017
IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj	Trpanj	1151
IZVOR Ploče javna ustanova Ploče	Gradac	1025
	Ploče	1089
JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica	Hrvatska Kostajnica	4036
KANFANAR ODVODNJA d.o.o., Kanfanar	Kanfanar	3056
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka	Kraljevica	1046
	Rijeka	1116
	Kostrena	1045
KOMRAD d.o.o., Slatina	Slatina	5123
KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor	Dvor	4029
KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice	Delnice	2036
	Fužine	2178
KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru	Biograd	1006
	Pašman	1087
KOMUNALAC d.o.o., Otočac	Otočac	2245
KOMUNALAC d.o.o., Slunj	Slunj	2007
KOMUNALAC d.o.o., Županja	Županja	7053
	Bošnjaci	7020
	Gradište	7026
KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac	Virje	5038
	Đurđevac	5012
	Podravske Sesvete	5031
KOMUNALIJE d.o.o., Ilok	Ilok	7060
KOMUNALIJE d.o.o., Novalja	Novalja	1074
KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma	Čazma	6011
KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac	Vrgorac	2137
KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag	Pag	1086
	Mandre	101057
KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin	Knin	1036

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje	Naziv aglomeracije	ID aglomeracije
KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Gunja	Gunja	7027
KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi	Cavtat	1015
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica	Koprivnica	5021
KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina	Krapina	4044
LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići	Mošćenička Draga	1070
	Opatija-Lovran	1081
LIP-KOM d.o.o., Lipovljani	Lipovljani	4054
LOPARKO d.o.o., Lopar	Lopar	1052
MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec	Donji Kraljevec	5045
	Novo Selo na Dravi	5057
	Podturen	5060
	Čakovec	101339
	Belica	5041
	Držimurec	5047
	Goričan	5049
	Podbrest	5059
	Turčišće	5065
	Donja Dubrava	5044
	Mursko Središće	5056
METKOVIĆ d.o.o., Metković	Metković	1067
MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac	Donji Miholjac	5001
MOSLAVINA d.o.o., Kutina	Popovača	4066
	Voloder	4088
	Kutina	4051
NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice	Našice	5004
NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula	Janjina	1032
	Korčula	1043
	Lumbarda	1056
ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o., Bibinje	Bibinje - Sukošan	101390
ODVODNJA HVAR d.o.o., Hvar	Hvar	1027
ODVODNJA Kali d.o.o., Kali	Kali	1034
ODVODNJA Opuzen d.o.o., Opuzen	Opuzen	1082
ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreč	Vrsar	1069
	Poreč - Jug	1094
	Lanterna	101444
	Poreč - Sjever	1095
ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., Rovinj	Rovinj	101105
ODVODNJA SAMOBOR d.o.o., Samobor	Samobor	4011
ODVODNJA SLIVNO d.o.o., Podgradina	Malostonski zaljev	1062
ODVODNJA, d.o.o., Zadar	Zadar	1171
	Starigrad Zadarski	1134
	Posedarje	1096
	Škabrnja	2126
	Ražanac	1115
OTOK UGLJAN d.o.o., Preko	Preko	1100
	Ugljan	1155
PARK ODVODNJA d.o.o., Buzet	Buzet	3026
PONIKVE VODA d.o.o., Krk	Omišalj	1080
	Klimno - Šilo	1020
	Baška	1003
	Krk	1047
	Malinska - Njivice	1061
	Punat	1109
PRAGRANDE d.o.o., Pula	Pula - Centar	1107
	Pula - Sjever	1108
PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o., Primošten	Primošten	101294
PRIVREDA d.o.o., Petrinja	Lekenik	4053
	Petrinja	4063
RAD d.o.o., Drniš	Drniš	1022

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje	Naziv aglomeracije	ID aglomeracije
SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak	Sisak	4071
	Sunja	4074
TEKIJA d.o.o., Požega	Kaptol	6040
	Kutjevo	6045
	Velika	6089
	Požega	6064
	Pleternica	6061
USLUGA d.o.o., Gospić	Gospić	2186
USLUGA ODVODNJA d.o.o., Pazin	Pazin	3099
VARKOM d.d., Varaždin	Jalžabet	5018
	Lepoglava	5024
	Ludbreg	5025
	Novi Marof	5029
	Varaždinske Toplice	5036
	Veliki Bukovec	101061
	Varaždin	5035
VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica	Mala Buna	101114
	Velika Gorica	4010
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci	Cerna	7021
	Ivankovo	7029
	Otok (Vinkovci)	7034
	Nuštar	7071
	Babina Greda	7016
	Jarmina	7061
	Nijemci	7031
	Novi Jankovci	7032
	Vođinci	7051
	Vrbanja	7052
	Vinkovci	7050
	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski	Jadranovo
Klenovica		1038
Crikvenica		1018
Novi Vinodolski		1075
VIOP d.o.o., Pregrada	Pregrada	4068
VIRKOM d.o.o., Virovitica	Suhopolje	5128
	Gradina	5093
	Virovitica	5132
VODA d.o.o., Orahovica	Čačinci	5077
	Orahovica	5113
VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica	Garešnica	6025
	Hercegovac	6032
VODAKOM d.o.o., Pitomača	Pitomača	5118
VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko	Jastrebarsko	4039
VODE LIPIK d.o.o., Pakrac	Lipik-Pakrac	6047
VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar	Rovišće	6069
	Bjelovar	6008
VODNE USLUGE d.o.o., Križevci	Križevci	4048
VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres	Mali Lošinj	1060
	Cres	1017
	Martinšćica	1064
	Nerezine	1072
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb	Gudci	4005
	Zagreb	4008
	Glavničica	4007
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb	Brckovljani	4018
	Dubrava	4027
	Gradec	101430
	Križ - Novoselec	101127
	Lipovec Lonjski	101441

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje	Naziv aglomeracije	ID aglomeracije
	Paukovec	101437
	Polonje	101436
	Sveti Ivan Zelina	4075
	Ivanić Grad	4037
	Rugvica	4002
	Vrbovec	4089
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić	Zaprešić	4009
VODORAD d.o.o., Đurđenovac	Sušine - Đurđenovac	5006
VODOVOD - VIR d.o.o., Vir	Nin	1073
	Vir	1063
VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar	Sutivan	1044
	Bol	1008
	Milna	1068
	Postira	1097
	Supetar	1141
VODOVOD d.o.o., Blato	Vela Luka	101058
	Blato	1007
	Smokvica-Brna	1130
VODOVOD d.o.o., Makarska	Brela	1010
	Tučepi	1153
	Makarska	1058
	Baška Voda	1004
	Drvenik	1023
	Podgora	1092
	Promajna - Kravica	101495
	Živogošće	1175
VODOVOD d.o.o., Omiš	Dugi Rat	101296
	Omiš	1079
	Mimice	101359
VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod	Slavonski Brod	6077
	Beravci	6006
	Brodski Stupnik	6009
	Donji Andrijevići	6016
	Garčin	6024
	Gundinci	6031
	Oriovac	6057
	Slavonski Šamac	6079
	Vrpolje	6099
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik	Zaton	1173
	Dubrovnik	1024
	Župa Dubrovačka	1178
VODOVOD GLINA d.o.o., Glina	Glina	4031
VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar	Vukovar	7081
VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje	Grubišno Polje	6029
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac	Karlovac - Duga Resa	4040
	Draganić	4026
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin	Ogulin	2003
	Josipdol	2002
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split	Kaštela - Trogir	1037
	Split-Solin	1131
	Čiovo	201118
	Marina	1063
	Muč	2078
	Vinišće	101396
VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj	Trilj	1150
	Dicmo	101358
	Sinj	1126
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac	Benkovac	2011
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić	Orebić	1084

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje	Naziv aglomeracije	ID aglomeracije
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj	Senj	1123
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik	Vodice	1165
	Rogoznica	1117
	Betina - Murter	1005
	Šibenik	1124
	Bilice	101471
	Pirovac - Tisno - Jezera	1088
VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža	Vis	1164
	Komiža	1042
VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski	Imotski	2052
VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina	Donja Zdenčina	4024
VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica	Plitvička jezera	2005
VODOVOD LABIN d.o.o., Labin	Rabac	1112
	Raša	1113
	Labin	3068
VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska	Novska	4060
VODOVOD POVLJANA d.o.o., Poveljana	Poveljana	1099
VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška	Batrina	6002
	Davor	6013
	Okučani	6055
	Staro Petrovo Selo	6081
	Nova Gradiška	6051
VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek	Ernestinovo	101031
	Dalj	7006
	Osijek	7012
VRELO d.o.o., Rab	Supetarska Draga	1142
	Rab	1111
ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok	Krapinske Toplice	4045
	Jakovlje	101060
	Zabok	4060
	Zlatar	4091

Uslužno područje	Popis aglomeracija manjih od 2.000 ES	Broj aglomeracija
1	Štrigova, Bogdanovec	2
2	Donji Martijanec, Struga, Leskovec Toplički, Hum Breznički, Slanje, Donja Višnjica, Gornja Voća, Visoko, Sveti Ilija, Donja Poljana, Bedenec, Čukovec, Podevčevo, Hrastovsko, Breznica, Sveti Petar Ludbreški, Lovrečan, Selnik, Ključ, Završje Podbelsko, Donja Voća, Bednja, Žarovnica, Beletinec, Klenovnik, Kapela Kalnička, Oštrice - Novi Marof	27
3	Gornja Rijeka, Prkos, Sveti Petar Orehovac, Pustakovec, Selnica Podravska, Legrad, Ivanec Križevački, Sveti Ivan Žabno	8
4	Sveta Ana, Mičetinac, Sirova Katalena, Berek, Hrastovac, Ždala, Kaniška Iva, Zrinski Topolovac, Veliki Bastaji, Velika Trnovitica, Tomašica, Kapela, Šandrovac, Bedenik, Severin, Dežanovac, Ivanska, Velika Pisanica, Narta, Prespa, Đulovac, Nova Rača, Veliki Grđevac, Sirač, Molve, Kalinovac, Veliko Trojstvo, Končanica, Mali Zdenci-Veliki Zdenci, Ferdinandovac, Gola	31
5	Zvonimirovac, Dobrović, Donji Meljani, Novi Gradac, Crnac, Gornji Miholjac, Vukosavljevića, Sedlarica, Staro Petrovo Polje, Cabuna, Podravska Moslavina, Novi Senkovec, Orešac, Lukač, Terezino Polje, Nova Bukovica, Brezovica, Bušetina, Stari Gradac, Voćin, Mikleuš, Kapinci, Čađavica, Zdenci, Gornje Bazje	25
6	Trnava, Levajska Varoš, Gašinci, Šaptinovići, Široko Polje, Poganovci, Drenje, Gorjani, Podgorač, Feričanci	10
7	Kozarac, Grabovac, Batina, Popovac, Čeminac, Zmajevac, Draž	7
8	Vinogradci, Nard, Aljmaš, Petrova Slatina, Vuka, Magadenovac, Sveti Đurađ, Marjančaci, Rakitovica, Petlovac, Viljevo, Vladislavci	12
9	Dol Klanječki, Belečka Selnica, Jurjevec, Tuheljske Toplice, Tuhelj, Desinić, Budinščina, Kumrovec, Radoboj, Klanjec, Đurmanec	11
10		0

Uslužno područje	Popis aglomeracija manjih od 2.000 ES	Broj aglomeracija
11	Trpuci, Gudci Draganički, Horvati, Galgovo	4
12	Lukinić Brdo, Pokupsko, Bratina, Donja Kupčina, Pisarovina, Veleševac	6
13	Mlaka, Sišćani, Pobjenik, Dubrovčak, Rakovec, Preseka, Poljanski Lug, Stara Marča, Markovac, Vagovina, Čemernica, Žabnica, Farkaševac, Bedenica, Deanovec, Lupoglav	16
14	Donji Velemerić, Barilović, Krnjak, Šišljavić, Saborsko, Mahićno, Kamanje, Tounj, Lasinja, Generalski Stol, Belajske Poljice, Jasenak, Rečica, Cerovac Vukmanički, Žakanje, Plaški, Vojnić, Ozalj, Krašić	19
15	Gornji Hrastovac, Donji Kukuruzari, Komogovina-Borojevići-Mečenčani, Majur-Stubalj-Graboštani, Topusko, Gvozd	6
16		0
17	Okoli, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Banova Jaruga, Rajić, Velika Ludina, Stara Subocka, Stružec	8
18	Vlatkovac, Kneževac, Venje, Bertelovci, Zarišlac, Brezine, Hrnjevac, Stara Lipa, Marino Selo, Gaj, Alilovci, Ratkovića, Poreč, Nova Ljeskovića, Grabarje, Rajsavac, Bektež, Češljakovci-Golo Brdo, Badljevin, Poljana, Boričevci, Eminovci, Čaglin, Vetovo, Brodski Drenovac	25
19	Gredani, Banićevac, Dolina, Mačkovac, Podvrško, Šagovina Cernička, Dragovci, Vrbovljani, Gorice, Dragalić, Medari, Orubica, Bačin Dol, Komarnica, Stara Gradiška, Ljupina, Siče, Vrbje	18
20	Dubočac, Krajačići, Šušnjevci, Vrhovina, Brodski Zdenci, Ravan, Pričac, Stupnički Kut, Klokočevik, Jaruge, Kaniža, Zadubravljje, Zbjeg, Bebrina, Slavonski Kobaš, Klakar, Oprisavci, Novi Grad, Lužani	19
21	Podgrađe, Korog, Strošinci, Đeletovci, Banovci, Ostrovo, Ilača, Račinovci, Lipovac, Soljani, Tordinci, Markušica, Tovarnik	13
22	Mohovo, Vera, Pačetin, Sotin, Petrovci, Čakovci, Lovas, Negoslavci, Bapska, Bobota	10
23	Završje, Kloštar, Butoniga, Grimalda, Šćulci-Paladini, Oprtalj, Draguč, Lanišće, Marčenegla, Boljun, Vranja, Rudani, Grdoselo, Pagubice, Kršete, Vrh, Crklada, Kašćerga, Grožnjan, Lupoglav Istarski, Mandalenčići, Cerovlje, Pičan, Sveti Lovreč Pazenatički, Livade, Karojba, Vižinada, Tinjan, Roč-Stanica Roč, Gračiće, Motovun, Trviž, Sveti Petar u Šumi, Kaldanija-Plovanija-Kaštel, Bale, Višnjan, Žminj, Kaštelir-Labinci	38
24	Prhati, Topid, Tunarica, Kršan, Plomin, Barban, Svetvinčenat, Koromačno, Potpićan, Brijuni, Marčana	11
25	Kuželj, Severin na Kupi, Brod na Kupi, Crni Lug, Studena, Čabar, Brod Moravice, Moravice, Prezid, Skrad, Tršće, Gerovo, Lokve, Mrkopalj, Klana, Ravna Gora, Vrbovsko	17
26	Unije, Dobrinj, Ilovik, Susak, Valun, Vrbnik	6
27	Tribalj, Grižane, Bribir	3
28	Košljun, Dinjiška, Vlašići, Stinica, Sveti Juraj	5
29	Donji Babin Potok, Lovinac Lički, Perušić, Vrhovine, Udbina, Donji Lapac, Brinje, Lički Osik, Korenica	9
30	Dragove, Premuda, Rava, Jasenice, Molat, Brbinj, Olib, Sestrunj, Ist, Jovići, Mali Iž, Donji Srb, Veli Rat, Veli Iž, Žman, Silba, Božava, Novigrad Zadarski, Rovanska, Maslenica, Obrovac, Gornji Karin, Sali, Zemunik Donji, Kruševo (Novigrad Zadarski), Poličnik, Kukljica, Pridraga, Vinjerac	29
31	Gornje Biljane-Ograde, Miranje-Gaj, Benkovačko Selo-Kukalj, Buković-Gaj, Kakma, Pristeg, Korlat, Donji Karin, Raštevici, Vukšić, Tinj, Islam Grčki, Lišane Ostrovičke, Polača, Ždrelac, Tkon	16
32	Ružić, Unešić, Banjevci, Oklaj, Rupe, Zaton (Šibenik), Lozovac, Primorski Dolac, Zlarin, Golubić, Stankovci, Skradin, Kistanje	13
33	Gizdavac-Prisike, Drvenik Veliki, Brstanovo, Crivac, Maslinica, Prugovo, Stomorska, Nečujam	8
34	Ježević, Civljane, Donji Bitelić, Gljev, Tijarica, Ugljane, Vinalić, Udovičić, Kijevo, Ruda, Potravlje, Turjaci, Vrljka, Obrovac Sinjski, Hrvace	15
35	Čelina, Marušići, Pisak, Šestanovac, Stanići	5
36	Murvica (Bol), Bobovišća - Ložišća, Nerežišća, Povelja, Splitska, Sućuraj, Milna (Hvar), Sumartin, Pučišća	9
37	Dobranje, Svib, Studenci, Cista Provo, Aržano, Cista, Zagvozd, Lovreć, Drašnice, Zaostrog, Igrane	11
38	Kula Norinska, Prud, Blace, Komin	4
39	Pupnat, Račići, Lastovo, Mljet	4
40	Suđurađ, Zaton Doli, Trsteno, Koločep, Lopud	5
41	Molunat, Gruda	2
Ukupno		487

4.1.3 Ostali projekti i projekti koji se provode na nacionalnoj razini

Projekt	
1N	Interventna mjera ugradnje klorinatora na vodozahvatima u zonama opskrbe lokalnih vodovoda
2N	Projekt ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe
3N	Projekt poticanja energetske učinkovitosti
4N	Projekt uspostave kibernetičke sigurnosti

4.2 Indikator: Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji po Projektima

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblje	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
1	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	109.191	109.451			109.191	99,8 %
2	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	16.376	16.816			16.376	97,4 %
2	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	141.022	147.527			141.022	95,6 %
3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	45.448	47.604			45.448	95,5 %
3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	22.470	27.754			22.470	81,0 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVDONJA d.o.o. Daruvar	17.406	18.738			17.406	92,9 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela	2.573	2.665			2.573	96,5 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	25.442	26.562			25.442	95,8 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	7.912	9.559			7.912	82,8 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	7.803	10.179			7.803	76,7 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	41.172	44.956			41.172	91,6 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac	3.164	3.700			3.164	85,5 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	5.174	5.418			5.174	95,5 %
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina	20.985	21.186			20.985	99,1 %
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica	35.375	35.375			35.375	100,0 %
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica	8.420	9.110			8.420	92,4 %
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača	9.145	9.204			9.145	99,4 %
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	41.106	41.962			41.106	98,0 %
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	19.753	20.703			19.753	95,4 %
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac	5.677	5.770			5.677	98,4 %
7	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	19.411	19.914			19.411	97,5 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo	20.421	20.529			20.421	99,5 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće	11.753	11.754			11.753	100,0 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	12.013	12.051			12.013	99,7 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDNOST d.o.o. Čepin	9.706	9.706			9.706	100,0 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda	12.374	12.471			12.374	99,2 %

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblje	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
		broj	broj	broj	broj	broj	%
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	116.390	117.354			116.390	99,2 %
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	3.899	4.434			3.899	87,9 %
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	20.402	22.102			20.402	92,3 %
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada	5.440	5.794			5.440	93,9 %
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	73.799	89.821			73.799	82,2 %
10	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	43.553	43.561			43.553	100,0 %
10	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra	6.420	6.420			6.420	100,0 %
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	15.105	15.142			15.105	99,8 %
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac	444	602			444	73,8 %
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	799.569	848.359			799.569	94,2 %
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	5.204	5.204			5.204	100,0 %
12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	64.969	68.513			64.969	94,8 %
12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina	3.541	3.559			3.541	99,5 %
13	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	6.852	7.173			6.852	95,5 %
13	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	84.407	94.185			84.407	89,6 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj	4.435	5.138			4.435	86,3 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	17.470	18.586			17.470	94,0 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj	8.857	9.067			8.857	97,7 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić	1.973	2.098			1.973	94,0 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	53.889	54.863			53.889	98,2 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	17.859	18.779			17.859	95,1 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	3.404	4.259			3.404	79,9 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	1.034	1.224			1.034	84,5 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	3.439	3.810			3.439	90,3 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	1.621	2.694			1.621	60,2 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	20.438	22.668			20.438	90,2 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	2	1.276			2	0,2 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	3.251	3.729			3.251	87,2 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	4.798	5.931			4.798	80,9 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	0	81			0	0,0 %

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblje	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
16	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	48.458	49.621			48.458	97,7 %
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	1.548	1.552			1.548	99,7 %
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	3.065	3.065			3.065	100,0 %
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	30.368	32.319			30.368	94,0 %
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	1.287	1.470			1.287	87,6 %
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	11.702	11.752			11.702	99,6 %
18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKIJIA d.o.o. Požega	51.677	53.889			51.677	95,9 %
18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	9.694	10.836			9.694	89,5 %
19	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	29.029	34.853			29.029	83,3 %
20	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	2.810	2.970			2.810	94,6 %
20	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	89.998	95.700			89.998	94,0 %
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci	4.109	4.109			4.109	100,0 %
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja	16.824	16.824			16.824	100,0 %
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja	2.882	2.882			2.882	100,0 %
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	86.829	86.947			86.829	99,9 %
22	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	6.374	6.374			6.374	100,0 %
22	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	35.281	35.310			35.281	99,9 %
23	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	97.249	99.858			97.249	97,4 %
24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Pula	85.523	87.050			85.523	98,2 %
24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	20.263	20.590			20.263	98,4 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	173.474	175.679			173.474	98,7 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	12.157	12.474			12.157	97,5 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o. Čabar	2.935	3.108			2.935	94,4 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	27.226	27.317			27.226	99,7 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko	4.133	4.163			4.133	99,3 %
26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	19.270	20.452			19.270	94,2 %
26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	10.359	10.639			10.359	97,4 %
27	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski	18.810	18.868			18.810	99,7 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU CRNO VRILLO d.o.o. Karlobag	539	767			539	70,3 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	3.663	3.938			3.663	93,0 %

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblje	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	4.495	4.762			4.495	94,4 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	5.393	5.938			5.393	90,8 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLIJANA d.o.o. Poveljana	739	739			739	100,0 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab	9.181	9.201			9.181	99,8 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac	639	659			639	97,0 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	9.300	9.782			9.300	95,1 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina	1.143	1.325			1.143	86,3 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica	2.053	2.123			2.053	96,7 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	13.026	13.588			13.026	95,9 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VISOČICA d.o.o. Donji Lapac	1.313	1.391			1.313	94,4 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje	2.233	2.566			2.233	87,0 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	3.324	3.483			3.324	95,4 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	2.815	3.099			2.815	90,8 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali	521	1.603			521	32,5 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko	3.479	3.859			3.479	90,2 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica	100	571			100	17,5 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	1.000	3.154			1.000	31,7 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	113.194	116.288			113.194	97,3 %
31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	15.618	17.296			15.618	90,3 %
31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	8.446	10.203			8.446	82,8 %
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	12.055	12.624			12.055	95,5 %
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš	6.408	6.512			6.408	98,4 %
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	125	515			125	24,3 %
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	80.193	82.135			80.193	97,6 %
33	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	275.075	285.826			275.075	96,2 %
33	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	184	300			184	61,3 %
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo	272	272			272	100,0 %
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrljika	1.898	1.916			1.898	99,1 %
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	42.639	43.271			42.639	98,5 %
35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	22.007	22.770			22.007	96,6 %

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	10.599	11.204			10.599	94,6 %
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	13.832	14.444			13.832	95,8 %
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	3.339	3.483			3.339	95,9 %
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	23.298	23.806			23.298	97,9 %
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	0	245			0	0,0 %
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	24.804	25.709			24.804	96,5 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	10.317	10.347			10.317	99,7 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	6.962	7.171			6.962	97,1 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković	16.550	16.553			16.550	100,0 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2.996	3.107			2.996	96,4 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen	3.135	3.135			3.135	100,0 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište	553	553			553	100,0 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	629	667			629	94,3 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	8.054	8.448			8.054	95,3 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje	0	301			0	0,0 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato	8.350	8.398			8.350	99,4 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1.296	1.826			1.296	71,0 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	3.560	4.031			3.560	88,3 %
40	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	52.055	54.127			52.055	96,2 %
41	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 41 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	8.036	8.324			8.036	96,5 %
	Ukupno	3.808.525	3.996.101			3.808.525	95,3 %

4.3 Indikator: Smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode prema Projektima

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi				
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora
		broj	broj	broj	broj	broj %
1	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	109.191	109.451			109.191 99,8 %
2	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	16.083	16.816			16.083 95,6 %
2	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	139.479	147.527			139.479 94,5 %
3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	45.398	47.604			45.398 95,4 %
3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	22.372	27.754			22.372 80,6 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	2.357	18.738			2.357 12,6 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela	2.573	2.665			2.573 96,5 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	25.442	26.562			25.442 95,8 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	4.677	9.559			4.677 48,9 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica		10.179			0 0,0 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	41.172	44.956			41.172 91,6 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac	3.164	3.700			3.164 85,5 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	5.174	5.418			5.174 95,5 %
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina	20.985	21.186			20.985 99,1 %
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica	35.375	35.375			35.375 100,0 %
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica	8.338	9.110			8.338 91,5 %
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača	9.145	9.204			9.145 99,4 %
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	5.795	41.962			5.795 13,8 %
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice		20.703			0 0,0 %
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac	5.579	5.770			5.579 96,7 %
7	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	9.112	19.914			9.112 45,8 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo		20.529			0 0,0 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće	11.753	11.754			11.753 100,0 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac		12.051			0 0,0 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDNOST d.o.o. Čepin	9.706	9.706			9.706 100,0 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda	12.374	12.471			12.374 99,2 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	5.817	117.354			5.817 5,0 %
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	3.821	4.434			3.821 86,2 %
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	16.875	22.102			16.875 76,4 %

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada	5.440	5.794			5.440	93,9 %
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	71.177	89.821			71.177	79,2 %
10	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	43.553	43.561			43.553	100,0 %
10	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra	6.420	6.420			6.420	100,0 %
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	14.895	15.142			14.895	98,4 %
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac	258	602			258	42,9 %
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	509.279	848.359			509.279	60,0 %
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	5.204	5.204			5.204	100,0 %
12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	63.938	68.513			63.938	93,3 %
12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina	3.541	3.559			3.541	99,5 %
13	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma		7.173			0	0,0 %
13	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	12.982	94.185			12.982	13,8 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj	3.518	5.138			3.518	68,5 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	12.378	18.586			12.378	66,6 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj	7.949	9.067			7.949	87,7 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić	1.875	2.098			1.875	89,4 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	53.889	54.863			53.889	98,2 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	6.353	18.779			6.353	33,8 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	3.050	4.259			3.050	71,6 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	1.034	1.224			1.034	84,5 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	3.354	3.810			3.354	88,0 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	1.600	2.694			1.600	59,4 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	20.438	22.668			20.438	90,2 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak		1.276			0	0,0 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	3.188	3.729			3.188	85,5 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	4.626	5.931			4.626	78,0 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja		81			0	0,0 %
16	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	47.675	49.621			47.675	96,1 %
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	1.548	1.552			1.548	99,7 %
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	3.065	3.065			3.065	100,0 %
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	30.202	32.319			30.202	93,4 %

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	1.287	1.470			1.287	87,6 %
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	11.702	11.752			11.702	99,6 %
18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKLIJA d.o.o. Požega	49.810	53.889			49.810	92,4 %
18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	9.691	10.836			9.691	89,4 %
19	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška		34.853			0	0,0 %
20	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	751	2.970			751	25,3 %
20	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	18.091	95.700			18.091	18,9 %
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci		4.109			0	0,0 %
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja		16.824			0	0,0 %
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja		2.882			0	0,0 %
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	15.351	86.947			15.351	17,7 %
22	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok		6.374			0	0,0 %
22	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar		35.310			0	0,0 %
23	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	97.249	99.858			97.249	97,4 %
24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Pula	85.523	87.050			85.523	98,2 %
24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	20.263	20.590			20.263	98,4 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	173.474	175.679			173.474	98,7 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	11.202	12.474			11.202	89,8 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o. Čabar	33	3.108			33	1,1 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	27.211	27.317			27.211	99,6 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko	4.126	4.163			4.126	99,1 %
26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	2.942	20.452			2.942	14,4 %
26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	10.359	10.639			10.359	97,4 %
27	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski	18.810	18.868			18.810	99,7 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o. Karlobag		767			0	0,0 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja		3.938			0	0,0 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	3.351	4.762			3.351	70,4 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	5.393	5.938			5.393	90,8 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana		739			0	0,0 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab	9.181	9.201			9.181	99,8 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLIJA d.o.o. Lovinac	631	659			631	95,8 %

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	9.300	9.782			9.300	95,1 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina	1.068	1.325			1.068	80,6 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica	2.053	2.123			2.053	96,7%
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	12.767	13.588			12.767	94,0 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VISOČICA d.o.o. Donji Lapac	1.313	1.391			1.313	94,4 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje	2.233	2.566			2.233	87,0 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	3.183	3.483			3.183	91,4 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	183	3.099			183	5,9 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali		1.603			0	0,0 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko		3.859			0	0,0 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica		571			0	0,0 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir		3.154			0	0,0 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar		116.288			0	0,0 %
31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru		17.296			0	0,0 %
31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	3.051	10.203			3.051	29,9 %
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	758	12.624			758	6,0 %
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš	6.243	6.512			6.243	95,9 %
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	125	515			125	24,3 %
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	79.929	82.135			79.929	97,3 %
33	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	8.285	285.826			8.285	2,9 %
33	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	84	300			84	28,0 %
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo	272	272			272	100,0 %
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrljika	1.862	1.916			1.862	97,2 %
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	40.969	43.271			40.969	94,7 %
35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	22.007	22.770			22.007	96,6 %
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	10.242	11.204			10.242	91,4 %
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar		14.444			0	0,0 %
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	3.339	3.483			3.339	95,9 %
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	13.552	23.806			13.552	56,9 %
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	0	245			0	0,0 %
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	1.094	25.709			1.094	4,3 %

Uslužno područje	Projekt (kratki naziv)	stanovnici koji imaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi					
		početna	ciljana	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora	
						broj	broj
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	2.143	10.347			2.143	20,7 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	6.962	7.171			6.962	97,1 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković		16.553			0	0,0 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula		3.107			0	0,0 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen		3.135			0	0,0 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište		553			0	0,0 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj		667			0	0,0 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	7.507	8.448			7.507	88,9 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje		301			0	0,0 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato		8.398			0	0,0 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	1.077	1.826			1.077	59,0 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić		4.031			0	0,0 %
40	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	8.331	54.127			8.331	15,4 %
41	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 41 na VP JIVU KONAOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	8.036	8.324			8.036	96,5 %
	Ukupno	2.348.585	3.996.101			2.348.585	58,8 %

4.4 Indikator: Smanjenje gubitaka iz sustava javne vodoopskrbe prema Projektima

№	Projekt (kratki naziv)	omjer između zahvaćene i isporučene količine vode				
		početna*	ciljana*	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješći	vrijednost indikatora u razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora
		%	%			
1	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	31 %	20 %			31 %
2	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	51 %	20 %			51 %
2	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d. Varaždin	37 %	20 %			37 %
3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	12 %	12 %			12 %
3	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	34 %	20 %			34 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	40 %	20 %			40 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela	21 %	20 %			21 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	25 %	20 %			25 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	43 %	20 %			43 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	48 %	20 %			48 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	35 %	20 %			35 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac	9 %	9 %			9 %
4	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	45 %	20 %			45 %
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina	32 %	20 %			32 %
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica	34 %	20 %			34 %
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODA d.o.o. Orahovica	34 %	20 %			34 %
5	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača	20 %	20 %			20 %
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	36 %	20 %			36 %
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	54 %	20 %			54 %
6	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac	55 %	20 %			55 %
7	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	48 %	20 %			48 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo	38 %	20 %			38 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće	17 %	17 %			17 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	32 %	20 %			32 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU UREDNOST d.o.o. Čepin	32 %	20 %			32 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda	24 %	20 %			24 %
8	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	34 %	20 %			34 %
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	29 %	20 %			29 %
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	19 %	19 %			19 %
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VIOP d.o.o. Pregrada	43 %	20 %			43 %
9	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	39 %	20 %			39 %

UP	Projekt (kratki naziv)	omjer između zahvaćene i isporučene količine vode				
		početna*	ciljana*	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješći	vrijednost indikatora u razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora
		%	%			
10	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	34 %	20 %			34 %
10	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra	45 %	20 %			45 %
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	55 %	20 %			55 %
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac	45 %	20 %			45 %
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	48 %	20 %			48 %
11	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	50 %	20 %			50 %
12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	15 %	15 %			15 %
12	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina	31 %	20 %			31 %
13	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	43 %	20 %			43 %
13	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	26 %	20 %			26 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj	71 %	20 %			71 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa	61 %	20 %			61 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj	43 %	20 %			43 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić	44 %	20 %			44 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	60 %	20 %			60 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	70 %	20 %			70 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić	69 %	20 %			69 %
14	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	65 %	20 %			65 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	81 %	20 %			81 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	73 %	20 %			73 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja	70 %	20 %			70 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	52 %	20 %			52 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko	49 %	20 %			49 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	61 %	20 %			61 %
15	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja	65 %	20 %			65 %
16	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	52 %	20 %			52 %
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac	68 %	20 %			68 %
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	15 %	15 %			15 %
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina	22 %	20 %			22 %
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica	1 %	1 %			1 %
17	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	33 %	20 %			33 %
18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU TEKIJA d.o.o. Požega	40 %	20 %			40 %
18	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	47 %	20 %			47 %

UP	Projekt (kratki naziv)	omjer između zahvaćene i isporučene količine vode				
		početna*	ciljana*	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješći	vrijednost indikatora u razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora
		%	%			
19	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	46 %	20 %			46 %
20	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	36 %	20 %			36 %
20	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	61 %	20 %			61 %
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci	22 %	20 %			22 %
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja	37 %	20 %			37 %
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja	51 %	20 %			51 %
21	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	43 %	20 %			43 %
22	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	42 %	20 %			42 %
22	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	26 %	20 %			26 %
23	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	24 %	20 %			24 %
24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Pula	20 %	20 %			20 %
24	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	26 %	20 %			26 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	44 %	20 %			44 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	42 %	20 %			42 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o. Čabar	69 %	20 %			69 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	23 %	20 %			23 %
25	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko	56 %	20 %			56 %
26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk	23 %	20 %			23 %
26	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	23 %	20 %			23 %
27	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski	45 %	20 %			45 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o. Karlobag	60 %	20 %			60 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	23 %	20 %			23 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	43 %	20 %			43 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	62 %	20 %			62 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	61 %	20 %			61 %
28	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VRELO d.o.o. Rab	29 %	20 %			29 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac	26 %	20 %			26 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac	80 %	20 %			80 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina	25 %	20 %			25 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica	48 %	20 %			48 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Gospić	71 %	20 %			71 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VIŠOČICA d.o.o. Donji Lapac	68 %	20 %			68 %
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje	87 %	20 %			87 %

UP	Projekt (kratki naziv)	omjer između zahvaćene i isporučene količine vode				
		početna*	ciljana*	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješći	vrijednost indikatora u razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora
		%	%			
29	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	90 %	20 %			90 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	89 %	20 %			89 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali	45 %	20 %			45 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko	45 %	20 %			45 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica	46 %	20 %			46 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	45 %	20 %			45 %
30	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar	63 %	20 %			63 %
31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	45 %	20 %			45 %
31	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	73 %	20 %			73 %
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	72 %	20 %			72 %
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o. Drniš	57 %	20 %			57 %
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	60 %	20 %			60 %
32	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	56 %	20 %			56 %
33	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	60 %	20 %			60 %
33	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	56 %	20 %			56 %
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo	61 %	20 %			61 %
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o. Vrljika	70 %	20 %			70 %
34	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	43 %	20 %			43 %
35	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	15 %	15 %			15 %
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	35 %	20 %			35 %
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	17 %	17 %			17 %
36	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	27 %	20 %			27 %
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska	45 %	20 %			45 %
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš	15 %	15 %			15 %
37	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	75 %	20 %			75 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	63 %	20 %			63 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	81 %	20 %			81 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković	25 %	20 %			25 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	31 %	20 %			31 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen	59 %	20 %			59 %
38	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište	64 %	20 %			64 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	27 %	20 %			27 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	31 %	20 %			31 %

UP	Projekt (kratki naziv)	omjer između zahvaćene i isporučene količine vode				
		početna*	ciljana*	vrijednost indikatora prema prethodnom izvješći	vrijednost indikatora u razdoblju	ukupno postignuta vrijednost indikatora
		%	%			
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje	45 %	20 %			45 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD d.o.o. Blato	59 %	20 %			59 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	22 %	20 %			22 %
39	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	47 %	20 %			47 %
40	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	22 %	20 %			22 %
41	Unaprjeđenje vodoopskrbe na UP 41 na VP JIVU KONAOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	28 %	20 %			28 %
Ukupno						

*Indikativna vrijednost prema izvještajima javnih isporučitelja za 2019. godinu, preciznija početna vrijednost pokazatelja će se utvrditi pri izradi detaljne tehničke dokumentacije

4.5 Indikator: Priklučenost opterećenja na sustav javne odvodnje prema javnim isporučiteljima

Isporučitelj usluge javne odvodnje	Početna vrijednost - priključeno opterećenje			Ciljano priključeno opterećenje			Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću			Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju			Ukupno postignuta vrijednost indikatora					
	usklađeno	neusklađeno	uvjetno	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)		neusklađeno (postaje usklađeno)		uvjetno (postaje usklađeno)	
	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	Es	%	Es	%	Es	%
6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag			73.608		0	77.927												
ALBANEŽ d.o.o., Pomer		21.699			37.028	0												
BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir		10.907			16.873	0												
CRNO VRILO d.o.o., Karlobag		1.759			2.045	0												
DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar		14.882			16.972	0												
DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci		0			2.197	0												
DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Slano		2.487			3.172	0												
DVORAC d.o.o., Valpovo		0			9.972	0												
ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo		21.997			36.586	0												
GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac		2.619			3.002	0												
HIDROBEL d.o.o., Belišće		17.970			21.674	0												
HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli		1.439			2.083	0												
HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa		5.076			14.504	0												
IVKOM - VODE d.o.o., Ivanec		5.784			10.544	0												
IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj		0			4.033	0												
IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče		8.576			16.430	0												
JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica			2.027		0	2.084												
KANFANAR ODVODNJA d.o.o., Kanfanar		2.000			2.744	0												
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka		131.082			192.614	0												
KOMRAD d.o.o., Slatina		10.714			14.651	0												
KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor		930			2.206	0												
KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice		3.684			7.350	0												

Isporučitelj usluge javne odvodnje	Početna vrijednost - priključeno opterećenje			Ciljano priključeno opterećenje			Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću			Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju			Ukupno postignuta vrijednost indikatora					
	usklađeno	neusklađeno	uvjetno	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)		neusklađeno (postaje usklađeno)		uvjetno (postaje usklađeno)	
	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	Es	%	Es	%	Es	%
KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru		26.540			52.464	0												
KOMUNALAC d.o.o., Otočac		4.075			5.996	0												
KOMUNALAC d.o.o., Slunj		1.342			1.984	0												
KOMUNALAC d.o.o., Županja		13.854			24.026	0												
KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac		7.032			17.972	0												
KOMUNALIJE d.o.o., Ilok			8.101		0	8.586												
KOMUNALIJE d.o.o., Novalja		23.081			28.345	0												
KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma		2.789			3.679	0												
KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac		2.586			3.483	0												
KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag		2.652			18.194	0												
KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin		10.165			12.487	0												
KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Gunja		0			6.084	0												
KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi		2.264			2.959	0												
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica		52.789			66.576	0												
KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina		6.702			10.251	0												
LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići		32.125			36.732	0												
LIP - KOM d.o.o., Lipovljani		1.508			2.391	0												
LOPARKO d.o.o., Lopar	11.750			11.750	0	0	11.750	-	-	-	-	-	11.750	100 %	-	-	-	-
MEDIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec	3.087	65.983		3.087	140.716	0	3.087						3.087	100 %				
METKOVIĆ d.o.o., Metković		9.617			15.659	0												
MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac	8.250			8.250	0	0	8.250						8.250	100 %				
MOSLAVINA d.o.o., Kutina		21.618			33.442	0												
NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice		12.824			18.360	0												
NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula		5.584			13.318	0												
ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o., Bibinje		5.385			15.918	0												
ODVODNJA HVAR d.o.o., Hvar			13.033		0	13.496												

Isporučitelj usluge javne odvodnje	Početna vrijednost - priključeno opterećenje			Ciljano priključeno opterećenje			Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću			Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju			Ukupno postignuta vrijednost indikatora					
	usklađeno	neusklađeno	uvjetno	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)		neusklađeno (postaje usklađeno)		uvjetno (postaje usklađeno)	
	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	Es	%	Es	%	Es	%
ODVODNJA Kali d.o.o., Kali		460			2.851	0												
ODVODNJA Opuzen d.o.o., Opuzen		1.770			3.824	0												
ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreč	77.987		27.285	77.987	0	27.745	77.987						77.987	100 %				
ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o., Rovinj	57.946			57.946	0	0	57.946						57.946	100 %				
ODVODNJA SAMOBOR d.o.o., Samobor		24.621			31.256	0												
ODVODNJA SLIVNO d.o.o., Podgradina		12.000			14.662	0												
ODVODNJA, d.o.o., Zadar		68.877			120.860	0												
OTOK UGLJAN d.o.o., Preko		2.631			7.985	0												
PARK ODVODNJA d.o.o., Buzet		5.312			6.217	0												
PONIKVE VODA d.o.o., Krk	39.440	12.834			67.704	13.245												
PRAGRANDE d.o.o., Pula	31.950	78.042			48.751	84.644												
PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o., Primošten		3.281			8.984	0												
PRIVREDA d.o.o., Petrinja		10.602			24.868	0												
RAD d.o.o., Drniš		2.157			3.186	0												
SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak		31.084			53.827	0												
TEKIJA d.o.o., Požega		35.296			52.310	0												
USLUGA d.o.o., Gospić		4.256			7.959	0												
USLUGA ODVODNJA d.o.o., Pazin		4.332			6.449	0												
VARKOM d.d., Varaždin		119.271			176.133	0												
VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica		48.048			67.197	0												
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci		42.714			96.607	0												
VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski		40.371			53.561	0												
VIOP d.o.o., Pregrada		930			2.375	0												
VIRKOM d.o.o., Virovitica		25.441			33.335	0												
VODA d.o.o., Orahovica		0	4.875		2.068	4.963												
VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica		5.420			8.298	0												
VODAKOM d.o.o., Pitomača		1.938			8.300	0												
VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko		8.539			12.347	0												

Isporučitelj usluge javne odvodnje	Početna vrijednost - priključeno opterećenje			Ciljano priključeno opterećenje			Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću			Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju			Ukupno postignuta vrijednost indikatora					
	usklađeno	neusklađeno	uvjetno	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)		neusklađeno (postaje usklađeno)		uvjetno (postaje usklađeno)	
	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	Es	%	Es	%	Es	%
VODE LIPIK d.o.o., Pakrac		9.877			11.001	0												
VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar		44.256			51.461	0												
VODNE USLUGE d.o.o., Križevci		9.560			15.620	0												
VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres		29.318	9.452		35.199	9.986												
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb		838.698			950.775	0												
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb		43.238			85.874	0												
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić		30.726			52.530	0												
VODORAD d.o.o., Đurđenovac		2.820			4.694	0												
VODOVOD - VIR d.o.o., Vir		7.710			91.591	0												
VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar		14.319	7.712		20.618	8.206												
VODOVOD d.o.o., Blato		1.353			16.587	0												
VODOVOD d.o.o., Makarska	68.164	0	2.125	68.164	5.180	2.271	68.164						68.164	100 %				
VODOVOD d.o.o., Omiš		11.745			24.466	0												
VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod		60.635			106.531	0												
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik		62.067			75.405	0												
VODOVOD GLINA d.o.o., Glina		5.555			6.987	0												
VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar		27.880			36.673	0												
VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje		1.959			3.797	0												
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac		40.088			66.086	0												
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin		4.910			11.541	0												
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split		205.004			337.956	0												
VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj		12.815			31.002	0												
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac		5.239			6.076	0												

Isporučitelj usluge javne odvodnje	Početna vrijednost - priključeno opterećenje			Ciljano priključeno opterećenje			Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću			Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju			Ukupno postignuta vrijednost indikatora					
	usklađeno	neusklađeno	uvjetno	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)	neusklađeno (postaje usklađeno)	uvjetno (postaje usklađeno)	usklađeno (ostaje usklađeno)		neusklađeno (postaje usklađeno)		uvjetno (postaje usklađeno)	
	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	Es	%	Es	%	Es	%
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić		1.000			8.673	0												
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj		6.450			8.413	0												
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik		56.598			126.291	0												
VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža	3.742		2.444	3.742	0	2.486	3.742						3.742	100 %				
VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski		3.560			19.543	0												
VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina		852			3.974	0												
VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica		1.927			4.803	0												
VODOVOD LABIN d.o.o., Labin	11.843	9.527	1.832	11.843	13.718	1.983	11.843						11.843	100 %				
VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska		8.120			10.419	0												
VODOVOD POVLJANA d.o.o., Poveljana			3.830		0	3.892												
VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška		16.578	2.294		32.563	2.346												
VODOVOD - OSIJEK d.o.o., Osijek		156.224			180.926	0												
VRELO d.o.o., Rab		19.802			28.097	0												
ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok		25.957			53.582	0												
REPUBLIKA HRVATSKA	242.769	2.921.228	249.494	242.769	4.408.283	263.857	242.769						242.769	100 %				

4.6 Indikator: Usklađenost s obzirom na potrebnu razinu pročišćavanja prema javnim isporučiteljima

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtjevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija										
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Ciljana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora		
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%
1	6.MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag	3	30.000		1	3							1	33 %
		3	59.000		1									
		2	8.000	1				1	100 %					
2	ALBANEŽ d.o.o. Pomer	2	10.000		1	3								
		2	21.000		1									
		2	7.500		1									
3	BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir	3	16.000		1	2							1	50 %
		2	2.500	1				1	100 %					
4	CRNO VRILO d.o.o. Karlobag	1	1.600		1	1								
5	DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar	3	50.000		1	1								
6	DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci	2	3.000		1	1								
7	DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o. Slano	P	5.000	1		1			1	100 %			1	100 %
8	DVORAC d.o.o. Valpovo	2	9.800		1	2								
		2	3.000		1									
		3	33.000		1	3								
9	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo	2	2.600		1									
		2	4.800		1									
10	GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac	2	5.000		1	1								
11	HIDROBEL d.o.o. Belišće	3	24.200		1	1								
12	HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli	2	3.900	1		1			1	100 %			1	100 %
13	HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa	P	9.000		1	2								
		P	6.000		1									
14	IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec	3	16.000		1	1								
15	IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj	P	5.400		1	1								
16	IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče	2	15.600		1	2								
		P	8.939		1									
17	JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica	2	3.000		1	1								
18	KANFANAR ODVODNJA d.o.o. Kanfanar	3	8.000	1		1			1	100 %			1	100 %
19	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka	2	41.600		1	3								
		1	14.200		1									
		2	200.000		1									

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtjevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija												
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Cijeljena vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora		Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora			
				broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%		
20	KOMRAD d.o.o. Slatina	3	34.500		1	1										
21	KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor	2	3.000		1	1										
22	KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	2	6.660	1		2			1	100 %				1	50 %	
		2	2.400		1											
23	KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru	2	54.000		1	2										
		1	11.500		1											
24	KOMUNALAC d.o.o. Otočac	2	8.000	1		1			1	100 %				1	100 %	
25	KOMUNALAC d.o.o. Slunj	2	6.000		1	1										
26	KOMUNALAC D.O.O. Vela Luka	2	27.000		1	1										
27	KOMUNALAC d.o.o. Županja	2	5.000		1	3								1	33 %	
		2	3.800		1											
		3	17.000	1					1	100 %						
28	KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac	3NP	9.000	1		3								1	22 %	
		2	5.900	1												
		2	7.900	1					1	100 %						
29	KOMUNALIJE d.o.o. Ilok	2	8.000	1		1			1	100 %			1	100 %		
30	KOMUNALIJE d.o.o. Novalja	2	39.000		1	1										
31	KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma	2	5.000		1	1										
32	KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac	3	6.000	1		1										
33	KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag	1	7.600		1	2										
		1	11.500		1											
34	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin	3	20.000		1	1										
35	KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja	2	10.000		1	1										
36	KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi	1	15.000		1	1										
37	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica	3	100.000	1		1			1	100 %				1	100 %	
38	KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina	3	21.200		1	1										
39	LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići	1	4.700		1	2										
		2	58.300		1											
40	LIP-KOM d.o.o. Lipovljani	2	3.500		1	1										
41	LOPARKO d.o.o. Lopar	2	14.000		1	1										
42	MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec	2	2.700		1	11								4	36 %	
		3	13.000		1											
		2	8.800		1											

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtjevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija													
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Cijeljena vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora		Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora				
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%			
		2	4.800		1												
		2	3.000	1						1	100 %						
		3	12.000		1												
		2	5.000	1						1	100 %						
		2	3.600		1												
		2	5.900	1						1	100 %						
		2	4.200		1												
		3	75.000	1						1	100 %						
43	METKOVIĆ d.o.o. Metković	3	18.400		1	1											
44	MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac	2	8.000	1		1				1	100 %				1	100 %	
45	MOSLAVINA d.o.o. Kutina	3	23.000		1	3											
		2	7.000		1												
		2	4.000		1												
46	NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice	3	15.000	1		1				1	100 %				1	100 %	
47	NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula	2	5.000		1	3											
		2	18.800		1												
		P	8.600		1												
48	ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o. Bibinje	2	25.000		1	1											
49	ODVODNJA HVAR d.o.o. Hvar	2	25.000		1	1											
50	ODVODNJA Kali d.o.o. Kali	1	6.100		1	1											
51	ODVODNJA Opuzen d.o.o. Opuzen	2	9.500		1	1											
52	ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč	3	48.000		1	4											
		3	37.000		1												
		3	22.500		1												
		3	30.000		1												
53	ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. Rovinj	3	63.000		1	1											
54	ODVODNJA SAMOBOR d.o.o. Samobor	3	40.000		1	1											
55	ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina	2	41.000		1	1											
56	ODVODNJA d.o.o. Zadar	2	6.000		1	5									1	20 %	
		P	7.500		1												
		2	11.000		1												
		2	100.000	1						1	100 %						
		2	4.000		1												

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtjevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija											
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Cijeljena vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora			
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%	
57	OTOK UGLJAN d.o.o. Preko	2	14.500		1	2									
		P	6.370		1										
58	PARK ODVODNJA D.O.O. Buzet	2	7.200	1		1			1	100 %			1	100 %	
59	PONIKVE VODA d.o.o. Krk	2	14.000		1	6									
		1	7.500		1										
		2	19.000		1										
		2	25.000		1										
		2	7.000		1										
		2	12.500		1										
60	PRAGRANDE d.o.o. Pula	2	98.000		1	2									
		2	42.000		1										
61	PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o. Primošten	1	15.000		1	1									
62	PRIVREDA d.o.o. Petrinja	2	3.500		1	2									
		3	24.000		1										
63	RAD d.o.o. Drniš	3	5.000	1		1			1	100 %			1	100 %	
64	SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak	3	60.000	1		2			1	100 %			1	50 %	
		2	3.400		1										
65	TEKIJA d.o.o. Požega	2	2.700		1	5								1	20 %
		2	4.800		1										
		3	15.300		1										
		3	33.500	1						1	100 %				
		2	4.200		1										
66	USLUGA d.o.o. Gospić	2	8.000	1		1			1	100 %			1	100 %	
67	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin	2	7.000	1		1			1	100 %			1	100 %	
68	VARKOM d.d. Varaždin	2	6.000		1	7									
		2	8.700		1										
		2	10.000		1										
		3	12.000		1										
		3	127.000		1										
		2	6.500		1										
		2	3.000		1										
69	VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica	3	74.000		1	2									
		2	5.300		1										

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtjevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija											
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Cijeljena vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora			
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%	
70	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci	2	5.000		1	11								3	27 %
		2	6.000	1				1	100 %						
		2	8.000	1				1	100 %						
		2	3.000		1										
		2	7.000		1										
		2	8.500	1				1	100 %						
		3	43.000		1										
		2	6.000		1										
		2	3.200		1										
		2	3.000		1										
2	6.000		1												
71	VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski	2	31.500		1	4							1	25 %	
		1	2.500	1				1	100 %						
		1	2.000		1										
		2	12.000		1										
72	VIOP d.o.o. Pregrada	2	2.200		1	1									
73	VIRKOM d.o.o. Virovitica	2	3.000		1	3							1	33 %	
		2	9.900	1				1	100 %						
		3	26.000		1										
74	VODA d.o.o. Orahovica	2	3.500		1	2									
		2	8.500		1										
75	VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica	2	7.000	1		2				1	100 %		1	50 %	
		2	5.000		1										
76	VODAKOM d.o.o. Pitomača	2	15.000		1	1									
77	VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko	3	14.965		1	1									
78	VODE LIPIK d.o.o. Pakrac	3	13.500		1	1									
79	VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar	3	47.000		1	2									
		2	3.600		1										
80	VODNE USLUGE d.o.o. Križevci	3	25.000		1	1									
81	VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres	2	12.700		1	4									
		2	31.500		1										
		P	4.300		1										
		P	7.400		1										

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtjevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija											
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Cijeljena vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora			
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%	
82	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb	2	1.700		1	3									
		3	12.000		1										
		3	1.500.000		1										
83	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb	3NP	28.000		1	11									
		2	8.400	1					1	100 %			1	9 %	
		2	2.800		1										
		3NP	20.000		1										
		2	9.000		1										
		3NP	12.200		1										
		2	5.000		1										
		2	2.500		1										
		2	3.400		1										
		2	3.000		1										
		2	2.500		1										
84	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić	3	70.000		1	1									
85	VODORAD d.o.o. Đurđenovac	2	8.000		1	1									
86	VODOVOD - VIR d.o.o. Vir	2	26.000		1	2									
		2	62.000		1										
87	VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar	1	18.100		1	5								1	20 %
		P	5.000		1										
		P	5.500		1										
		2	20.000		1										
		P	5.200	1						1	100 %				
88	VODOVOD d.o.o. Blato	P	8.000		1	2									
		P	3.000		1										
89	VODOVOD d.o.o. Makarska	2	20.000		1	8									
		1	14.500		1										
		P	7.500		1										
		2	40.000		1										
		P	9.000		1										
		1	15.000		1										
		P	2.000		1										
		P	7.000		1										

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtjevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija												
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Cijijana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora				
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%		
90	VODOVOD d.o.o. Omiš	2	22.000		1	3										
		1	11.000		1											
		P	6.000		1											
91	VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod	2	3.200		1	9										
		2	3.500		1											
		2	4.500		1											
		2	4.000		1											
		2	2.400		1											
		2	3.000		1											
		3	80.000	1						1	100 %					
		2	5.000		1											
		2	7.500		1											
92	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik	2	100.000		1	3										
		1	8.300		1											
		2	33.300		1											
93	VODOVOD GLINA d.o.o. Glina	2	9.000		1	1										
94	VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar	3	42.000		1	1										
95	VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje	2	5.500	1		1			1	100 %			1	100 %		
96	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac	2	3.000		1	2								1	50 %	
		3	98.500	1					1	100 %						
97	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin	2	2.800		1	2									1	50 %
		3	12.000	1					1	100 %						
98	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split	2	100.000		1	6										
		3	11.500		1											
		2	275.000		1											
		3	5.400		1											
		P	4.600		1											
		2	25.000		1											
99	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj	3	26.000		1	3									1	33 %
		2	6.000	1					1	100 %						
		3	4.600		1											
100	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac	2	7.000	1		1										
101	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić	2	17.000		1	1				1	100 %			1	100 %	

Redni broj	Isporučitelj vodne usluge	Zahtjevani stupanj pročišćavanja	Kapacitet UPOV-a	Broj aglomeracija											
				Početna vrijednost - usklađene aglomeracije	Potrebno uskladiti	Cijijana vrijednost	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora	Vrijednost indikatora prema prethodnom izvješću	Vrijednost indikatora u izvještajnom razdoblju	Ukupno postignuta vrijednost indikatora			
				ES broj	broj	broj	broj	broj	broj	%	broj	broj	broj	%	
102	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj	2	9.900	1		1									
103	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik	2	10.500		1	6								1	17 %
		2	27.000		1										
		2	20.000		1										
		2	67.000		1										
		2	37.500	1				1	100 %						
		2	3.000		1										
104	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža	P	7.900		1	2									
		1	11.000		1										
105	VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski	3	19.100		1	1									
106	VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina	2	4.000		1	1									
107	VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica	3	15.000	1		1			1	100 %			1	100 %	
108	VODOVOD LABIN d.o.o. Labin	2	18.000		1	3									
		2	2.400		1										
		3	15.000		1										
109	VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska	3	11.700		1	1									
110	VODOVOD POVLJANA d.o.o. Poveljana	1	9.000		1	1									
111	VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška	2	4.500		1	5									
		2	2.650		1										
		3	22.100		1										
		2	6.600		1										
		2	4.000		1										
112	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek	2	6.000		1	3								1	33 %
		3	170.000		1										
		2	2.700	1				1	100 %						
113	VRELO d.o.o. Rab	2	22.000		1	2									
		1	9.900		1										
114	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok	2	4.000		1	4									
		3	36.940		1										
		3	14.690		1										
		2	5.000		1										
Ukupno				45	215	260			45	17 %			45	17 %	
Ukupni kapacitet uređaja usklađenih aglomeracija			858.060												

